

Audiencia Pública Regional

de Rendición de Cuentas 2 - 2024



Zósimo
Cárdenas
Gobernador regional

El cambio
lo hacemos
todos



GOBERNACIÓN


**EJE INSTITUCIONAL
(Obj. 3 del PDRC)**

Ejecución Presupuestal 2024



Al 25 de Setiembre de 2024, el Gobierno Regional de Junín ha ejecutado el **71.21%** de su presupuesto.

CATEGORIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
ACTIVIDADES	2,432,192,766	1,749,515,879	71.9
PROYECTOS	900,778,700	623,787,903	69.2
TOTAL	3,332,971,466.00	2,373,303,782.00	71.21

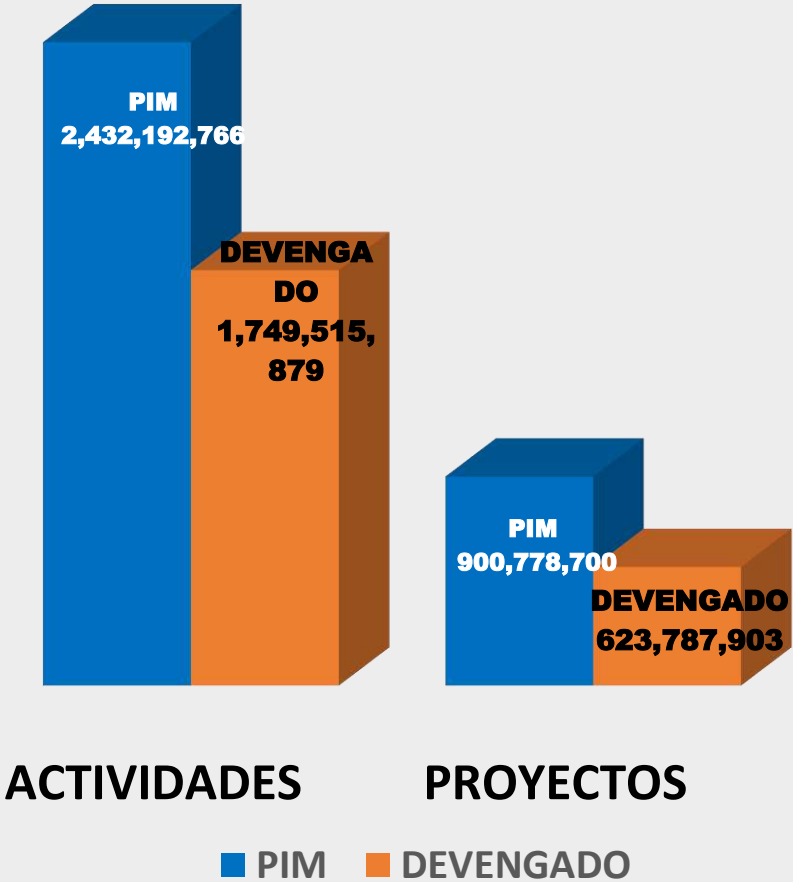

A nivel de Pliego y por toda fuente de financiamiento


Ejecución Presupuestal por Sectores

CATEGORIA	PIM	DEVENGADO	% AVANCE
ACTIVIDADES	2,432,192,766	1,749,515,879	71.9
SEDE CENTRAL	99,741,156	53,465,249	53.6
PRODUCCION	2,808,297	2,146,373	76.4
AGRICULTURA	14,273,060	10,491,212	73.5
TRANSPORTES	34,677,927	8,635,816	24.9
EDUCACIÓN	1,417,872,593	1,052,386,688	74.2
SALUD	862,819,733	622,390,541	72.1
PROYECTOS	900,778,700	623,787,903	69.2
SEDE CENTRAL	877,310,102	611,253,528	69.7
PRODUCCION	335,990	100,200	29.8
AGRICULTURA	20,424,405	11,115,604	54.4
TRANSPORTES	2,683,203	1,318,571	49.1
SALUD	25,000	0	0.0
TOTAL	3,332,971,466.00	2,373,303,782.00	71.21


Al 25 de Setiembre de 2024, el Gobierno Regional de Junín ha ejecutado el **71.21%** de su presupuesto.



RANKING MENSUAL DE EJECUCIÓN DE INVERSIONES 2024

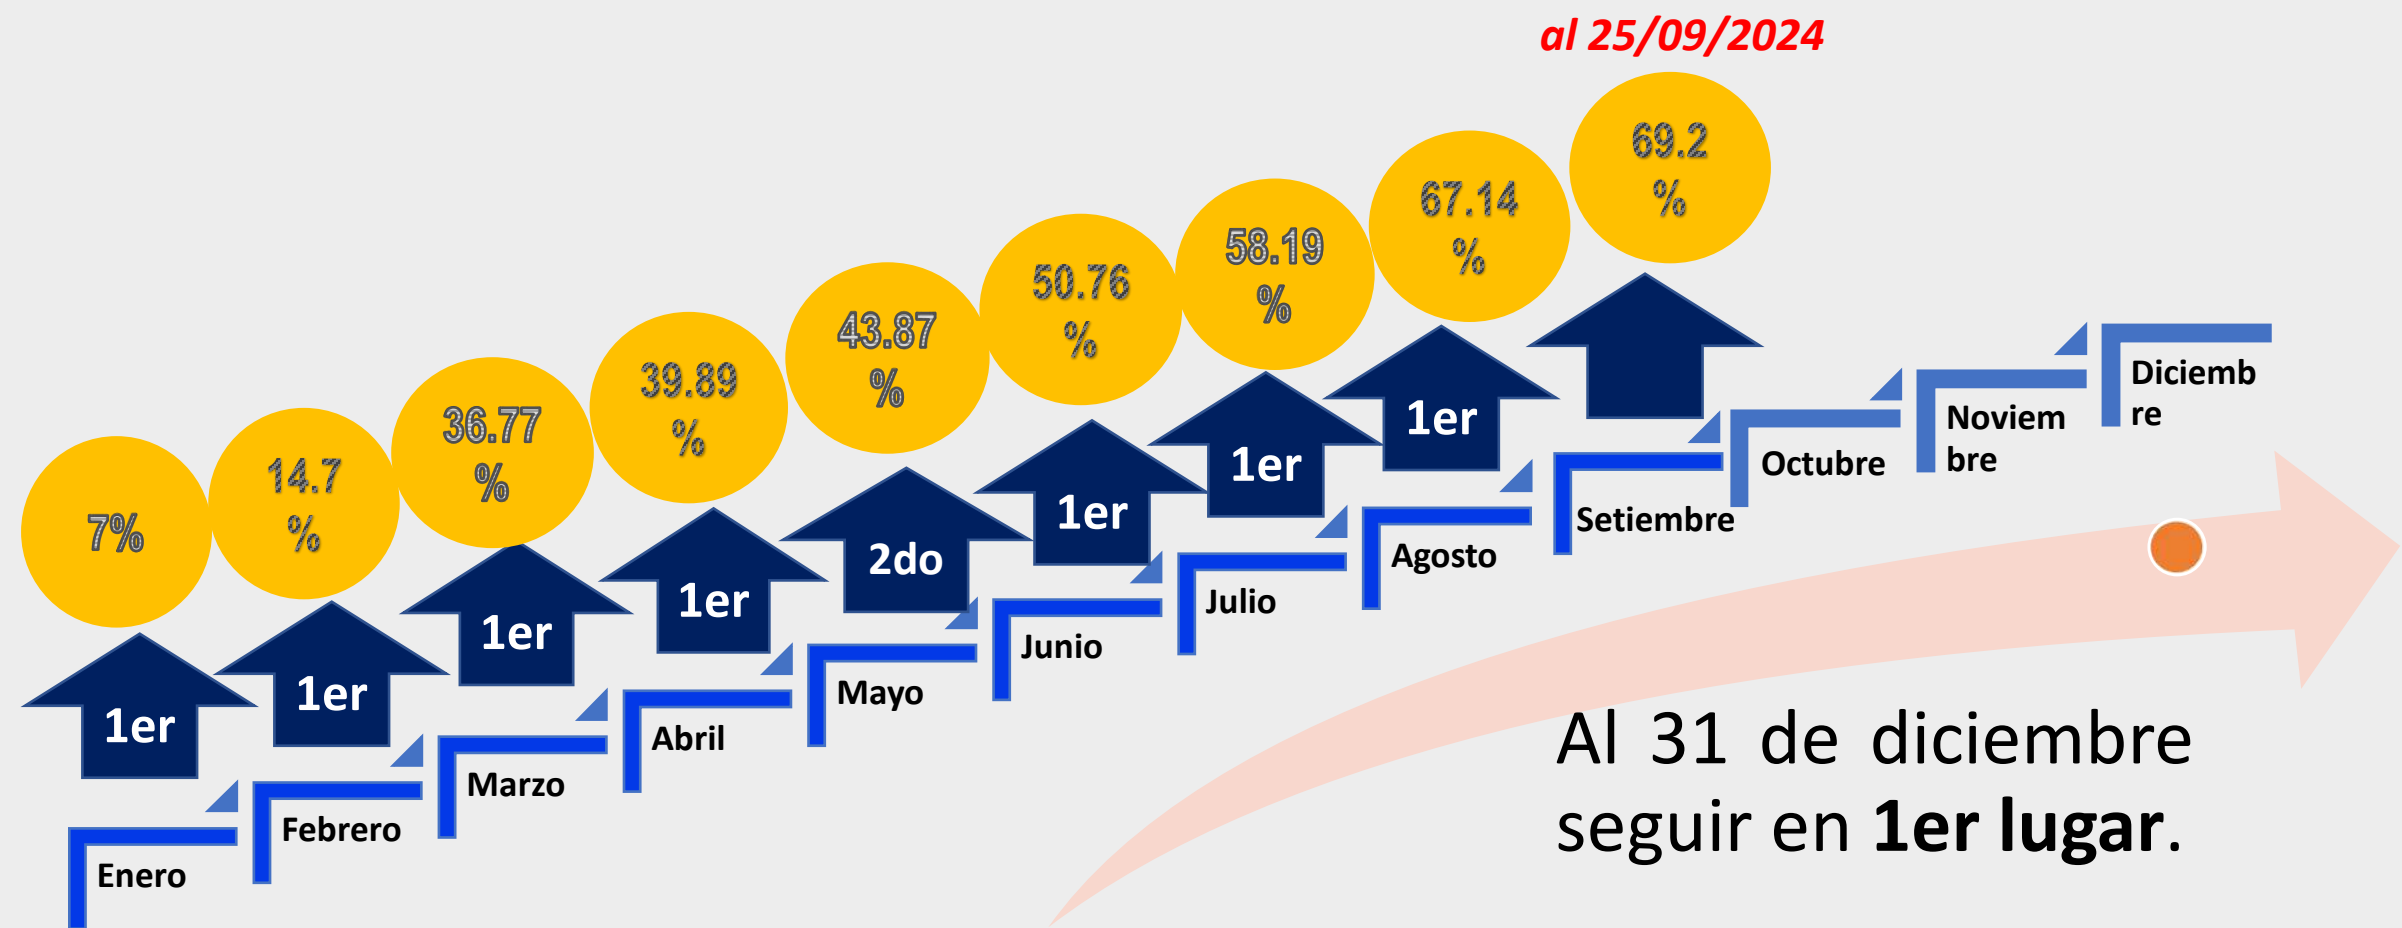

PRINCIPALES INDICADORES



TRANSFERENCIA FINANCIERA

S/ 4,420,967.00

CREACIÓN DE PISTAS Y
VEREDAS DE LA AV.
CIRCUNVALACIÓN TRAMO
CARRETERA **AHUAC** – AV. LOS
HÉROES, DISTRITO DE
CHUPACA
CUI 2313802



S/ 1,188,628.00

SERVICIO DE RECREACIÓN
CÍVICO CULTURAL EN LA
LOCALIDAD DE
ÑAHUINPUQUIO DEL
DISTRITO DE **AHUAC**
CUI 2522648



S/ 280,000.00

MEJORAMIENTO DE LOSA
DEPORTIVA CON GRASS
SINTETICO EN EL CENTRO
POBLADO DE YURACMAYO
DEL DISTRITO DE **TAPO**
CUI 2523850



S/ 5,578,710.00

SERVICIO DE APOYO AL
DESARROLLO PRODUCTIVO
DE LOS CULTIVOS DE PALTO Y
GUANÁBANA EN 15 CP –
PICHANAQUI
CUI 2517347



**CONVENIOS DE
TRANSFERENCIA
FINANCIERA
ENTRE EL GORE Y
GL**

DEUDA SOCIAL

GESTIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES DE LA DEUDA SOCIAL

- MEF transfiere **S/ 38.494,499.00** para el pago de deudas sociales.
Decreto Supremo N° 136-2024-EF
- antes de finalizar el ejercicio, el GORE Junín dispondrá los saldos no ejecutados al 31 de diciembre de 2024 para el pago de la deuda social.



GRJ asegura 38.4 millones para deuda social

MECANISMOS DE TRANSPARENCIA E INTEGRIDAD EN LA GESTIÓN REGIONAL


1

Publicaciones de comunicados en el **portal web del Gobierno Regional Junín**, para que la ciudadanía este informada.



2

Constante actualización del portal de transparencia (Publicación de normas y documentos, noticias, campañas y eventos, etc)



3

Implementación de Portales de Datos Abiertos




TÍTULOS DE PROPIEDAD

NOMBRE DEL PROYECTO Y/O ACTIVIDAD	TÍTULOS ENTREGADOS-2024	TÍTULOS A ENTREGAR-DICIEMBRE 2024	TOTAL DE TÍTULOS
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN. S/ 7,500.000.00	1062	6377	7439
PTR3-CONVENIO ENTRE LA DRAJ-MIDAGRI	449	2500	2949
DIRECCIÓN DE TITULACIÓN Y CATASTRO RURAL -DRAJ	0	896	896
TOTAL DE TÍTULOS	1511	9773	11,284

MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REGIÓN JUNÍN

UN LOGRO MÁS QUE BENEFICIARÁ A LA POBLACIÓN DE LA REGIÓN JUNÍN – (28/09/2023)

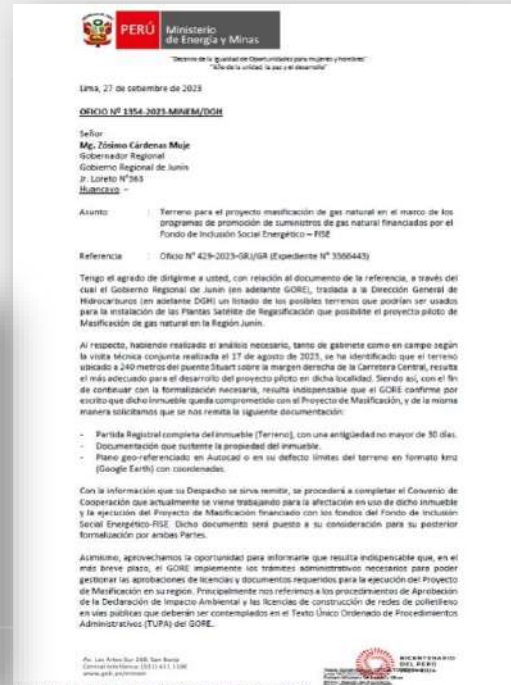

SE FIRMÓ el CONVENIO DE COOPERACIÓN INTERINSTITUCIONAL ENTRE EL MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MINEM) Y EL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN a través de las gestiones de la DIRECCIÓN REGIONAL DE ENERGÍA Y MINAS para la implementación del PROYECTO MASIFICACIÓN DEL GAS NATURAL EN LA REGIÓN JUNÍN.

Construcción de la Planta de Gas Natural en beneficio de todos los hogares y parque automotor de la Región Junín **a un precio menor del mercado actual.**

En el terreno de un total de 3100 m2, ubicado en el Distrito de Sausa, saneado a nivel SUNARP.

Ministerio de Energía y Minas para su evaluación respectiva.

**PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA
PARA RIEGO EN REPRESA RIO CONSAC - ZONA CALINCANTO DISTRITO DE
SAN JOSE DE QUERO DE LA CONCEPCION - JUNÍN,
CDI 31 5943**

**Audiencia
Pública Regional**
de Rendición de Cuentas 2 - 2024



**FIRMA DE
CONVENIO GRJ -
MIDAGRI**

ESTADO: PERFIL



Inversión

S/699, 493,276.86



UBICACIÓN

: SAN JOSE DE QUERO,
MANZANARES,
CONCEPCION Y
HUANCAYO



BENEFICIARIOS

: 64 334 AGRICULTORES Y
25 MIL HA BENEFICIARIAS



**SITUACIÓN
ACTUAL**

: ELABORACION DE PERFIL



**PERSPECTIVAS A
DIC 2024**

: DESARROLLAR
EXPEDIENTE TECNICO Y
ESTUDIOS DEFINITIVOS DE
OBRA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL CORREDOR VIAL DE TRANSPORTE MASIVO NORTE - SUR, AV. FERROCARRIL (TRAMO: AV. CIRCUNVALACION - CRUCE CARRETERA CENTRAL), DISTRITOS DE EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNÍN, CUI 2224222

Inversión

S/ 121' 661,079.76



ESTADO: EN CONVOCATORIA



UBICACIÓN

: DISTRITO: EL TAMBO, SAN AGUSTIN DE CAJAS, HUALHUAS, SAÑO, SAN JERONIMO DE TUNAN PROVINCIA: HUANCAYO



BENEFICIARIOS

: 19,384 PERSONAS



SITUACIÓN ACTUAL

: EN CONVOCATORIA



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO.

CREACION DE LA **CARRETERA CENTRAL** HUAYCAN – CIENEGUILLA
SANTIAGO DE TUNA - SAN ANDRES DE TUPICOCHA - SAN DAMIAN
YURACMAYO - YAULI PACHACHACA - EMP. PE-22 DISTRITO DE SANTA ROSA
DE SACCO - YAULI – JUNÍN, **CUI N° 2436163**

ESTADO: EN GESTIÓN	MONTO TOTAL DE LA OBRA: 11,959 millones	BENEFICIARIOS: 9,018,278 personas
META: 185 KM de autopista, 32 km. de túneles (7 túneles de mas de 1 km, 13 km de viaductos , 13 km de muro de contención, 8 intercambiadores viales, 5 areas de descanso y 3 zonas de servicios)		



CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO TERMINAL PORTUARIO MULTIPROPÓSITO DE CHANCAY

Perú en el primer centro logístico del Pacífico en Latinoamérica

ESTADO: EN EJECUCIÓN	AVANCE DE LA OBRA: 90 %	BENEFICIARIOS: PERÚ - JUNÍN
META: ☐ La posición geográfica, conectividad actual y futura del puerto contribuirán al descongestionamiento de otros centros de manejo portuario al brindar menores tiempos, mejores condiciones competitivas para los usuarios, dinamizando la economía del país, impulsando las exportaciones y generando nuevas oportunidades de negocio.		



GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

**EJE ECONÓMICO
(Obj. 4 del PDRC)**

PROYECTO: **SISTEMA DE RIEGO**

EN EJECUCIÓN

📍 **LOCALIDAD DE PACAPACCHA,
DISTRITO DE PACA – JAUJA - JUNÍN”
CUI 2518646**



AVANCE FÍSICO : 100.00%



BENEFICIARIOS : 45.00 HA

S/2'981,627.08

EN EJECUCIÓN

📍 **CENTRO POBLADO DE CHALHUAS
DEL DISTRITO HUACHAC –
CHUPACA – JUNÍN”, CUI 2520012**



AVANCE FÍSICO : 21.59.00%



BENEFICIARIOS : 75.00 HA



FECHA CULMINACIÓN : 17 DE DICIEMBRE 2024

S/5'676,159.1

PROYECTO: **SISTEMA DE RIEGO**

EN EJECUCIÓN

📍 **COMUNIDAD CAMPESINA DE USIBAMBA –
DISTRITO DE **SAN JOSÉ DE QUERO** –
CONCEPCIÓN - JUNÍN”
CUI 2310937**



AVANCE FÍSICO : 62.05%

BENEFICIARIOS : 110.00 HA

FECHA CULMINACIÓN : 06 DE OCTUBRE 2024

S/ 6'201,753.25

EN EJECUCIÓN

📍 **CASERIO DE SASICUCHO DISTRITO
DE **JUNÍN** - JUNÍN – JUNÍN”
CUI 2176604**



AVANCE FÍSICO : 31.23%



BENEFICIARIOS : 85.00 HA




FECHA CULMINACIÓN : 04 DE DICIEMBRE 2024

S/ 3,093,247.83

CONVENIO CON EL MIDAGRI

- 📍 **PERFIL:** AGUA PARA RIEGO EN LA LAGUNA
TRANCA Y QUEBRADA PADRILLO PAMPA,
DISTRITO DE APATA - JAUJA - JUNÍN,
CDI 326077

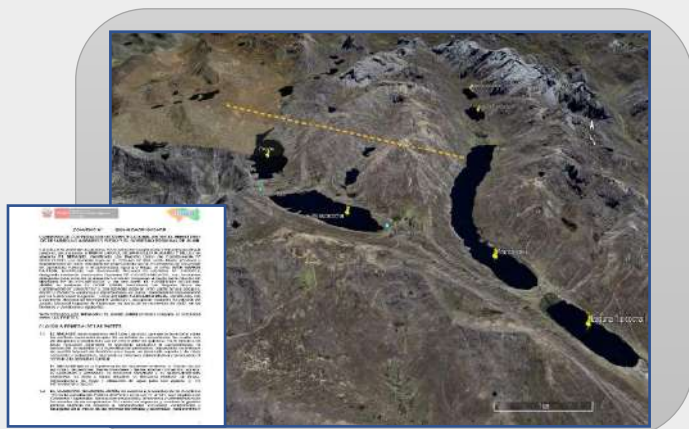

👥 **BENEFICIARIOS** : 5000 PRODUCTORES

S/. 270,463,662.75

- 📍 **PERFIL:** MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA
CADENA DE VALOR DE PAPA NATIVA EN 46
DISTRITOS EN 8 PROVINCIAS, EN EL DISTRITO DE
HUANCAYO -HUANCAYO - JUNÍN,
CUI 2656674



👥 **BENEFICIARIOS** : 18000 PRODUCTORES

S/ 54,997,450.00

PROCOMPITE REGIONAL 2024

Inversión

S/120'000,000.00



ETAPA: IMPLEMENTACION



UBICACIÓN

: 9 Provincias de la Región Junín



AVANCE FÍSICO

: 20.00%



AVANCE FINANCIERO

: 2.08%



BENEFICIARIOS

: 5400 productores aprox.



SITUACIÓN ACTUAL

: 390 planes de negocio están siendo evaluados técnicamente



PERSPECTIVAS A DIC:
2024

Contar con 350 planes de AEOs ganadoras y ejecutando la compra y entrega de maquinarias y equipos

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN 16 UNIDADES PRODUCTORAS 16 DISTRITOS DE 3 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN”

Inversión

S/ 60'000,000.00



ESTADO: POR EJECUTAR

MODALIDAD: ADM. DIRECTA

CUI 2655420

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE VALOR DE CAFÉ EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO; SAN RAMÓN, PERENE, SAN LUIS DE SHUARO, PICHANAQUI Y EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNÍN

S/. 19,234,916.42

CUI 2655424

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE VALOR DE CACAO EN 7 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO Y EL DISTRITO DE PICHANAQUI DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNÍN

S/. 11,940,454.01

CUI 2655422

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE VALOR DE CÍTRICOS EN 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO; PERENE, PICHANAQUI, VITOC Y EL DISTRITO DE CHANCHAMAYO DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, JUNÍN

S/. 7,155,253.67

CUI 2655423

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE VALOR DE PLÁTANO EN 5 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO, JUNÍN

S/. 5,948,572.90

CUI 2655419

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN LA CADENA DE VALOR DE PALTA EN 6 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE SATIPO; 4 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE CHANCHAMAYO Y EL DISTRITO DE MONOBAMBA DE LA PROVINCIA DE JAUJA DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN

S/. 5,748,206.02

PROYECTO: INSTALACIÓN, CONSTRUCCIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFÉ EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGIÓN JUNÍN. CUI/ SNIP: 68201

Inversión

SOCIO ABSCRIPTOR A TRAVÉS DEL CONVENIO MARCO CON EL CATIE



S/ 54,997,450.00



UBICACIÓN

: DISTRITO: Río Negro
PROVINCIA: Satipo



AVANCE FÍSICO

: 90.70%



AVANCE FINANCIERO

: 89.28 %



BENEFICIARIOS

: 38,404 AGRICULTORES
22,005 AGRIC. DE SATIPO
16,399 AGRIC. DE CHANCHAMAYO



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE PROGRAMADO
CULMINAR EN DICIEMBRE
DEL 2024.



PERSPECTIVAS A DIC
2024

: FUNCIONAMIENTO DE LOS
LABORATORIOS DE
INVESTIGACION, EQUIPADOS
CON ESPECIALISTAS QUE
BRINDARÁN SERVICIOS DE
ESTUDIOS Y MEJORAMIENTO
DEL GRANO DEL CAFÉ,
CONTROL DE
ENFERMEDADES DE LAS
PLANTAS, APLICACIÓN DE
TECNOLOGIA, ETC

ESTADO: EN EJECUCION

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANALES, AGROECOLOGICOS, TURISMO Y CULTURAL EN LAS 09 PROVINCIAS REGION JUNÍN, CUI 2608236.

Inversión

S/ 4'857,000.00



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: Administración directa

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: MULTIDISTRITAL
PROVINCIA: 9 PROVINCIAS DE LA REGION
-  **AVANCE FÍSICO** : 52.00%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 38.00%
-  **BENEFICIARIOS** : 34,100 PERSONAS
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : EN EJECUCIÓN, Y PROGRAMADO CULMINAR EN AGOSTO DEL 2025
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : generar el fortalecimiento de las capacidades de los productores locales fomentando la autonomía y la resiliencia de las comunidades.

IOARR: “ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DEMOSTRATIVO; EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE EL TAMBO-HUANCAYO- JUNÍN”, CUI N° 2010692

INVERSIÓN

S/ 1'061,778.00



- UBICACIÓN** : 108 DISTRITOS
7 PROVINCIAS
- AVANCE FÍSICO** : 16.52%
- AVANCE FINANCIERO** : 16.52%
- BENEFICIARIOS** : 7,000 PRODUCTORES
- SITUACIÓN ACTUAL** : .
- ADQUISICIÓN DE EQUIPOS: 7 PISTOLAS DE INSEMINACIÓN ARTIFICIAL CON CÁMARA PORTÁTIL, 7 TERMOS DESCONGELADORES, 7 TANQUES CRIOGENICOS DE 2 KG, 7 TANQUES CRIOGENICOS DE 50 LITROS Y IMPLEMENTOS DE INSEMINACION ARTIFICIAL
- PERSPECTIVAS A DIC 2024:**
- IMPLEMENTAR LA PLANTA DE NITROGENO LIQUIDO CON PRODUCCION DE 60 LITROS POR DIA EN LA AGENCIA AGRARIA DE CONCEPCIÓN PARA MEJORAR LA INSEMINACION ARTIFICIAL CON EQUIPAMIENTO MODERNO EN LAS 7 AGENCIAS AGRARIAS LLEGANDO CUBRIR A LOS 7,000 PRODUCTORES.

ESTADO: EN EJECUCIÓN / MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

ACTIVIDAD: PROMOCIÓN INTERNA PARA DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO



Presupuesto asignado

S/ 76,393.00

UBICACIÓN	: HUANCAYO Y LIMA
AVANCE FÍSICO	: 63%
AVANCE FINANCIERO	: 63%
BENEFICIARIOS	: Visitantes, prestadores de servicios turísticos
SITUACIÓN ACTUAL	: Promoción de eventos de interés turístico: Semana Santa, Semana Turística de la Selva Central y Fiestas Patrias Semana Santa : 77,302 turistas Movimiento Económico Generado S/ 53,261,078.00 Fiestas Patrias: 150,696 turistas Movimiento Económico Generado S/ 91'623,168.00
PERSPECTIVAS A DIC 2024	: Promoción del Día Mundial del Turismo y Semana Turística del Valle del Mantaro

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “PUESTA EN VALOR Y PROMOCION DEL CORREDOR TURISTICO TARMA - SELVA CENTRAL EN LA REGION JUNÍN”, CUI 2031761

Inversión

S/ 976,883.00 Componente Social

S/ 785,416.70 Componente Infraestructura



- 📍 UBICACIÓN : MULTIDISTRITAL
TARMA, CHANCHAMAYO Y SATIPO
- 🏗️ AVANCE FÍSICO : 15.56%
- 📈 AVANCE FINANCIERO : 5.98%
- 👥 BENEFICIARIOS : 77,280 Habitantes
- 📋 SITUACIÓN ACTUAL : Ejecución del componente social:
 - Fortalecimiento de Capacidades
 - Promoción Turística
- 🕒 PERSPECTIVAS A DIC 2024 : Iniciar la ejecución del componente infraestructura

ACTIVIDAD: REPOBLAMIENTO DE RECURSOS HÍDRICOS CON ALEVINOS DE TRUCHA CON FINES SOCIALES



Inversión

S/ 35,500.00



UBICACIÓN

:

DISTRITO VARIOS
PROVINCIAS JAUJA
CHUPACA
SATIPO
HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

:

77.78%



AVANCE FINANCIERO

:

79.32%



BENEFICIARIOS

:

CENTROS POBLADOS DE ANGASMAYO, IZCUHUATIANA, SAN BLAS, HUALLANCAYO, YANAMARCA, MARCO, SAN JOSÉ DE APATA, LLOCLLAPAMPA, SALLAHUACHAC, LURICHINCHA, CARHUAPACCHA, PUNTO, SAURENI, LA FLORIDA, RÍO CRISTAL).



SITUACIÓN ACTUAL

:

14 RECURSOS HÍDRICOS POBLADOS Y REPOBLADOS CON 56,515 ALEVINOS DE TRUCHA, FALTA 4 ACTIVIDADES DE REPOBLAMIENTO PARA CUMPLIR LA META FÍSICA ANUAL.



PERSPECTIVA AL 2024

:

SE HA PROGRAMADO LA SIEMBRA DE 18 RRHH CON 75 MILLARES DE ALEVINOS DE TRUCHA EN EL PRESENTE EJERCICIO.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

**EJE SOCIAL
(Obj. 1 y 2 del PDRC)**

ADQUISICIÓN DE 6 AMBULANCIAS URBANAS TIPO III

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 4,700,000.00



**HOSPITAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL
CARMEN"**

03 AMBULANCIAS

S/ 2,300,000.00

CUI (2588668)

**HOSPITAL REGIONAL DE MEDICINA TROPICAL DR.
JULIO DEMARINI CARO**

01 AMBULANCIAS

S/ 780,000.00

CUI (2588668)

**HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI
02 AMBULANCIAS**

S/ 1'500,000.00

CUI (2608316)

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS

**MONTO DE
INVERSIÓN**

S/ 20,900,000.00

**ENTREGA : 120
DÍAS**




**RESONADOR
MAGNÉTICO**

S/ 11'900,000.00

**H. DANIEL ALCIDES CARRIÓN
CUI N° 2573842**

**ENTREGA : 180
DÍAS**

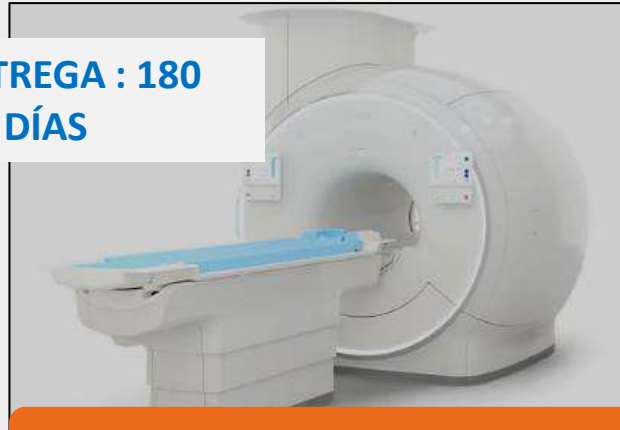

02 TOMÓGRAFOS

**H.REGIONAL. JULIO DEMARINI
CARO**

CUI N° 2594686

**H.DOMINGO OLAVEGOYA
CUI N° 2600588**

ENTREGA : 70 DÍAS



**SISTEMA DE CIRUGIA
LAPAROSCOPICA**

EQUIPO DE RAYOS X

EQUIPO ECÓGRAFO

S/ 2,600,000.00

**H.MANUEL ANGEL HIGARAKAKI
CUI N° 2616092**

IOARR EN PROCESO

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 11'000,0000.00



**REPARACIÓN UCI
NEONATOLOGIA HOSPITAL EL
CARMEN**

CUI N° 2599678

S/ 1'300,000.00



**ADQUISICIÓN DE
ESTERILIZADOR Y
ELECTROBISTURI HOSPITAL EL
CARMEN**

CUI N° 2660176

S/ 1'400,000.00



**ADQUISICIÓN DE 07 EQUIPOS
BIOMÉDICOS HOSPITAL
CARRIÓN**

CUI N° 2566002

S/ 6'000,000.00



**CONSTRUCCIÓN DE
AMBIENTES
COMPLEMENTARIOS
CENTRO DE SALUD CHILCA**

CUI N° 2661133

S/ 2'300,000.00

EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 5'000,000.00



ADQUISICIÓN DE 05 UNIDADES MÓVILES (AMBULANCIAS VETERINARIAS) Y EQUIPAMIENTO CON KITS INSTRUMENTAL QUIRÚGICO VETERINARIO

9 PROVINCIAS

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 15'000,000.00



CONSTRUCCIÓN DE 06 CENTROS INFANTIL DE ATENCIÓN INTEGRAL DE CUNA MÁS.

6 DISTRITOS

PROYECTO: SABERES PARA EL DESARROLLO

MONTO DE INVERSIÓN

S/ 53'900,000.00



UBICACIÓN:



NUEVE (09) PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN




LOGROS ALCANZADOS:

- **6,400** BENEFICIARIOS ILETRADOS.
- CONTAMOS CON LA ENTREGA DE **2,730** OVEJAS, **19,110** CUYES PARA LAS ZONAS DEL VALLE DEL MANTARO Y ALTO ANDINO, **3,990** CERDOS, **15,960** GALLINAS PONEDORAS PARA LAS ZONAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO EN EL COMPONENTE DE DESARROLLO DE CAPACIDADES PRODUCTIVAS.
- CONTAMOS CON **INSTRUMENTOS PEDAGOGICOS** VALIDADOS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERINSTITUCIONAL CON LA UNCP – FACULTAD DE EDUCACION.



PERSPECTIVAS A DICIEMBRE 2024:

- CULMINAR LAS 40 SESIONES DE APRENDIZAJES DEL DESARROLLO DE CAPACIDADES HUMANAS II ETAPA.
- ENTREGAR LOS MODULOS PRODUCTIVOS EN UN 50% II ETAPA.

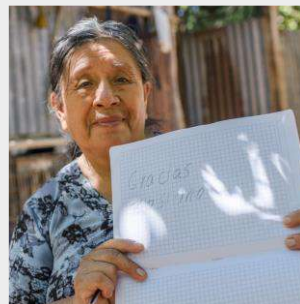

CUI N° 2623727

PROYECTO : YACHAY

CUI N° 2572984

MONTO DE INVERSIÓN **S/ 30'000,0000.00**



UBICACIÓN:

LAS NUEVE (9) PROVINCIAS DE JUNÍN



BENEFICIARIOS:

FAMILIAS DE LA REGIÓN JUNÍN



LOGROS ALCANZADOS:



PERSPECTIVAS A DIC 2024:

COMPONENTES:

- **PSICOLÓGICO** - DESARROLLO DE CAPACIDADES EN PADRES Y MADRES DE FAMILIA.
- **NUTRICIONAL** - DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA LA DIVERSIFICACIÓN DE LA CANASTA FAMILIAR.
- **SOCIAL** - FORTALECIMIENTO DE LA ORGANICIDAD COMUNITARIA (ACTUALIZACIÓN DE SUS INSTRUMENTOS DE GESTIÓN).
- **LEGAL** - FORTALECIMIENTO DE LA RED DE INSTITUCIONES GARANTES DE DERECHOS DE NNA

SALUD

ESTRATEGIA DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN SALUDABLE



FUENTE: HIS MINSA - JULIO AÑO 2024

INVERSIÓN

S/1,651,116

Segundo lugar a nivel nacional 52.9 %. (enero a julio)

SE RECUPERARON DE ANEMIA 1000 Niños
de 12 a 18 meses de edad de 1369
diagnosticados.



Se cuenta con 46 servicios con ambientes
exclusivos para adolescentes y jóvenes

ESTRATEGIA SANITARIA SALUD MENTAL

Funcionamiento de centro
de salud mental Comunitario
Satipo – Nuevo Puerto Prado



AVANCE FÍSICO
100%

INVERSIÓN

S/ 1,453,166.00

ESTRATEGIA ETAPA DE VIDA ADOLESCENTE

Servicios diferenciados
implementados exclusivos para
adolescentes de 12 a 17 años.
prevención del embarazo
adolescente y cuidado integral
de salud psicosocial y sexual”



METAS FÍSICAS 75%

INVERSIÓN

S/ 1,759,667

SALUD




54 MIL BENEFICIARIOS

Obtuvieron vacunación de Sarampión, Paperas y Rubiolas, contando con un avance de 38.08% en toda la Región Junín.




40 MIL BENEFICIARIOS

Niños protegidos contra la Poliomielitis



154 MIL BENEFICIARIOS

Reducción del porcentaje de abandonos al tratamiento de tuberculosis sensible en relación a los años anteriores.

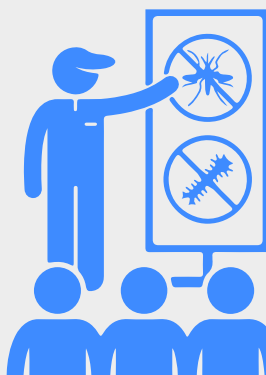

1500 BENEFICIARIOS

Cuentan con estrategias sanitarias de metaxénicas - dengue, logrando disminuir a 483 casos al 2024 (Satipo, Pangoa, Pichanaqui, Chanchamayo).

ESTRATEGIA INTEGRAL PARA MEJORAR LOS SERVICIOS EDUCATIVOS Y LAS COMPETENCIAS DE EDUCACIÓN BÁSICA ESCOLAR



4000 docentes fortalecen sus capacidades.



Se adjudicó el 80% de plazas para nombramientos



PRIMER LUGAR

En número de proyectos ganadores en el FONDEP. Propuestas innovadoras Para mejorar los logros del aprendizaje por MINEDU



9 PROVINCIAS Intervenido Con un 70% de avance ejecutado

INTERVENCIONES EDUCATIVAS



**19 Educunas
Implementadas en las
Provincias de Huancayo
Concepción, Jauja, Yauli,
Junín, Chanchamayo y
Satipo**



TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

18,675

BENEFICIARIOS

PREVENCIÓN Y SOLUCIÓN DE CONFLICTOS LABORALES

6,281

BENEFICIARIOS

INTERMEDIACIONES PARA INSERCIÓN LABORAL.

3,311

ESTUDIANTES

CUENTAN CON ORIENTACIÓN VOCACIONAL E INFORMACIÓN OCUPACIONAL

120

JÓVENES

CON CAPACITACIÓN TÉCNICA ESPECIALIZADA

16.985

BENEFICIARIOS

PROMOCIÓN Y PROTECCIÓN DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES Y DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

5,446

BENEFICIARIOS

FORMALIZACIÓN DE LA FUERZA LABORAL



DIRECCIÓN DE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO – DRVCS -FED/LOGROS



FONDO DE ESTIMULO DE DESEMPEÑO Y LOGROS DE RESULTADOS SOCIALES (FED)

172,500 personas de las 09 provincias del departamento de Junín acceden a agua de calidad, con niveles de cloro residual óptimos mayores a 0.5 mg/l

1

MEJORAMIENTO DE CALIDAD DE AGUA

Se realizó el monitoreo y mejoramiento de sap - los sistemas de agua potable, con cloro residual a favor de la población de los distritos que forman parte del pacto regional.



2

REDUCCION EN LA BRECHA DE SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE LAS IIEE. APORTANDO UN 10%

Articulación con los gobiernos locales en la implementación de kits educativos en los PRONOEIS del II ciclo



3

TRABAJO ARTICULADO EN SALUD CON LOS GOBIERNOS LOCALES

Se realizó un trabajo articulado con los gobiernos locales en la captación temprana, homologación oportuna



PROMOCION, DIFUSION E INSCRIPCION DE LOS PROGRAMAS HABITACIONALES

185 familias con escasos recursos beneficiadas con viviendas dignas y saludables mediante el programa bono familiar habitacional techo propio.

FONDO DE ESTIMULO DE DESEMPEÑO Y LOGROS DE RESULTADOS SOCIALES (FED)

ECONOMÍA Y FINANZAS

Decreto Supremo que autoriza Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024 a favor del Ministerio de Salud y de los gobiernos regionales

DECRETO SUPREMO
N° 141-2024-EF

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA

de Presupuesto del citado Ministerio, con los respectivos sustentos. Asimismo, mediante Oficio N° D000469-2024-MIDIS-OGPPM, la Oficina General de Planeamiento Presupuesto y Modernización del citado ministerio remite información complementaria;

Que, en consecuencia, corresponde autorizar la Transferencia de Partidas en el Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024, hasta por la suma de S/ 41 046 591,00, (CUARENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS NOVENTA Y UN CON 00/100 SOLES) a favor del Ministerio de Salud y de los veinticinco (25) gobiernos regionales, para los fines señalados en los considerandos precedentes;

De conformidad con lo establecido en los numerales 39.1 y 39.7 del artículo 39 de la Ley N.º 31953, Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024;



LOGRO 1

INVERSIÓN

S/1,740,000.00

Incrementamos más de medio millón a diciembre I etapa por el cumplimiento de indicadores propuesto por FED (salud, educación, agua y saneamiento e IAR)

LOGRO 2

PACTO REGIONAL

Logramos generar lazos de articulación con los gobiernos locales en cumplimiento de los indicadores, para el desarrollo social (salud, educación, agua y saneamiento)

Siendo ganadores :

- Municipalidad Distrital de Huertas
- Municipalidad Distrital de Tres de Diciembre
- Municipalidad Distrital de Aco
- Municipalidad Distrital de Quilcas
- Municipalidad Distrital de Chacapalpa



Sub Gerencia Desarrollo social e igualdad de Oportunidades

PROGRAMA REGIONAL: JUVENTUDES

01

SEGUNDA REGION A NIVEL NACIONAL QUE IMPULSA LA CREACION DE LA POLITICA DE JUVENTUDES

Culminó la ruta de participación juvenil descentralizado en las 9 provincias (participación de más de 2000 jóvenes) para la formulación del diagnóstico de la política regional de juventudes.



PROGRAMA COREPAM:

02

Emisión: Ordenanza regional n° 400-2024-grj/cr, trabajo articulado multisectorialmente a favor de las personas adultas mayores y en el marco de la ley n°30490, ley de la persona adulta mayor.



OBSERVATORIO REGIONAL JUNÍN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA MUJER Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR

03

CUMPLIMIENTO AL 100% DE LAS 3 FASES DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL OBSERVATORIO

Emisión: Ordenanza regional n° 400-2024-grj/cr, trabajo articulado multisectorialmente a favor de las personas adultas mayores y en el marco de la ley n°30490, ley de la persona adulta mayor.



PROGRAMA DE POBLACIONES

04

IMPULSAMOS, INTEGRAMOS CARAVANAS MULTISECTORIALES DEL PROGRAMA PAIS

Brindando servicios esenciales. Este es un puente de oportunidades para más de 6723 personas, además unimos esfuerzos y abrimos caminos hacia un futuro más inclusivo y equitativo.



Audiencia Pública Regional
de Rendición de Cuentas 2 - 2024

Sub Gerencia de Población Y Pueblos Originarios

Junín ya cuenta
con ordenanza que reconoce y valora la diversidad cultural, y previene actos de discriminación y racismo



¡Saludamos la decisión del Gobierno Regional de Junín que apuesta por un Perú sin Racismo!

 **PERÚ** Ministerio de Cultura  **BICENTENARIO PERÚ 2024**

Ordenanza Regional N° 399-2024 – GRJ

Junín ya cuenta
Con ordenanza para la protección de las personas Defensoras de los Derechos Humanos.



 **PERÚ** Ministerio de Cultura  **BICENTENARIO PERÚ 2024**

Ordenanza Regional N° 401-2024

Sub Gerencia de Población Y Pueblos Originarios

**Audiencia
Pública Regional**
de Rendición de Cuentas 2 - 2024

ENTREGA DE LIBROS EN BRAILLE

Orientado a niños con discapacidad visual de los centros de educación básica especial



Primera Etapa

Asistencias técnicas

Uso del presupuesto en discapacidad a gobiernos locales a nivel regional



124 gobiernos locales capacitados en las nueve provincias

INSTALAR LA OFICINA DE REGISTRO REGIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD PARA LA EMISIÓN DE CARNETS

ALDEA INFANTIL – EL ROSARIO



CAR ACREDITADO POR EL MIMP

Implementación de estándares de calidad para el servicio de protección de niños, niñas y adolescentes sin cuidados parentales o en riesgo de perderlos.

Inicio de la construcción de la nueva infraestructura del car “Aldea Infantil el Rosario”, después de más de 30 años de olvido .



PRIMERA PIEDRA

GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE

**EJE AMBIENTAL
(Obj. 6)**

ACTIVIDAD: CREACIÓN DE UN ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL “PROPUESTA DE ACR OTORONGO - PAMPA LAZO” EN LOS DISTRITOS DE PARIAHUANCA Y SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA - HUANCAYO



UBICACIÓN

: DISTRITO: PARIAHUANCA – SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE

: APROBACIÓN DE LA PRIMERA ETAPA

ÁREA

: 25,303. 23 Ha



SITUACIÓN ACTUAL

: INICIO DE LA SEGUNDA ETAPA CON LA IDENTIFICACIÓN DE PUEBLOS INDÍGENAS Y ORIGINARIOS



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: ELABORACIÓN DEL ANÁLISIS COSTO BENEFICIO DEL ESTABLECIMIENTO DE LA PROPUESTA DE ACR

ACTIVIDAD: CERTIFICACIÓN AMBIENTAL EN LOS SECTORES DE TRANSPORTE Y SANEAMIENTO



SECTOR SANEAMIENTO (DIAs)	SECTOR TRANSPORTE (DIAs + FTSAs)
03	10 FITSAs + 07 DIAs
TOTAL	20 IGAs



UBICACIÓN

: PROVINCIAS Y DISTRITOS DE LA REGION JUNÍN.



SITUACIÓN ACTUAL

: APROBACIÓN DE (17) IGA's DE PROYECTOS DE INVERSION EN SECTOR TRANSPORTES MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL.

APROBACIÓN DE (03) DECLARACIONES DE IMPACTO AMBIENTAL (DIA) DE PROYECTOS DE SECTOR SANEAMIENTO MEDIANTE RESOLUCION GERENCIAL.



PERSPECTIVAS A DIC 2024 : EJECUTAR OBRAS PARA EL BENEFICIO DE LA POBLACIÓN DANDO OPORTUNIDADES DE TRABAJO EN SECTOR TRANSPORTES Y SECTOR SANEAMIENTO.

ORDENANZA REGIONAL - DE INTERÉS PÚBLICO

ACR
HUAYTAPALLANA


: ORDENANZA QUE DECLARA EL
CIERRE DEL ACR
HUAYTAPALLANA Y
ELABORACIÓN DE CUADRO DE
SANCIONES.

PROPUESTA DE ACR
OTORONGO PAMPA
LAZO

: DECLARATORIA DE INTERÉS
PÚBLICO Y PRIORIDAD REGIONAL LA
CONSERVACIÓN DE LA
DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y LOS
SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DE
LA PROPUESTA DE ÁREA DE
CONSERVACIÓN REGIONAL (ACR)
“**OTORONGO – PAMPA LAZO**”

PROPUESTA DE ACR
SAN CRISTÓBAL DE
PUCUTA – MENKORI

: DECLARATORIA DE INTERÉS Y
NECESIDAD PÚBLICA LA
CONSERVACIÓN DEL MONO
CHORO DE COLA AMARILLA
(LAGOTHRIX FLAVICAUDA)



PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GESTIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA EN 9 PROVINCIAS EN LA REGION JUNÍN, CUI 2543345

S/ 9'340,043.60



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

 **UBICACIÓN**

: 9 PROVINCIAS DE LA REGIÓN JUNÍN

 **BENEFICIARIOS**

: 1 161 581 POBLADORES DE 9 PROVINCIAS DE LA REGIÓN JUNÍN

 **SITUACIÓN ACTUAL**

- ENTREGA DE INDUMENTARIAS Y EQUIPAMIENTO A LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS.
- SE ESTÁ ELABORANDO 09 PLANES DE VIGILANCIA Y CONTROL COMUNAL EN LAS ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS EN LA REGIÓN JUNÍN.

 **PERSPECTIVAS A DIC 2024**

- MANTENIMIENTO E INAUGURACIÓN DE 10 QOCHAS.
- IMPLEMENTACIÓN DE ACR DE HUAYTAPALLANA.
- IMPLEMENTACIÓN DE RESERVA NACIONAL DE JUNÍN.
- ENTREGA DE EQUIPOS DE MONITOREO A LA PROVINCIA DE OROYA, TARMA Y CHANCHAMAYO.

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS DE 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CUI 2618939

S/ 70'495,217.89



La parte de imagen que se describe en el ítem no se encuentra en el archivo.

La parte de imagen que se describe en el ítem no se encuentra en el archivo.

La parte de imagen que se describe en el ítem no se encuentra en el archivo.

UBICACIÓN

**: 57 DISTRITOS
PROVINCIAS: HUANCAYO,
CONCEPCIÓN, JAUJA, TARMA,
JUNÍN Y YAULI.**

BENEFICIARIOS

**: 14,981 COMUNEROS DE 113
COMUNICADES CAMPESINAS**

SITUACIÓN ACTUAL

**: EJECUCIÓN DEL PRIMER
COMPONENTE, ABARCANDO
LA REFORESTACIÓN /
FORESTACIÓN DE 3 HA DE
PLANTACIONES.**



PERSPECTIVAS A DIC 2024

**: MEJORAR EL SERVICIO DE
REGULACIÓN HÍDRICA
MEDIANTE ACCIONES DE
FORESTACIÓN Y
REFORESTACIÓN EN EL
DISTRITO DE CHUPURO.**

ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROYECTO: RECUPERACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN, CUI 2612969



S/ 37'717,452.47



UBICACIÓN

: 30 DISTRITOS
PROVINCIAS: CHUPACA,
CONCEPCIÓN, HUANCAYO,
JAUIJA.



BENEFICIARIOS

: 97 COMUNICADAS CAMPESINAS



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, CON
PLAZO DE 36 MESES



PERSPECTIVAS A DIC 2024 : MEJORAR EL SERVICIO DE
REGULACIÓN HÍDRICA MEDIANTE
ACCIONES DE FORESTACIÓN Y
REFORESTACIÓN

ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

CAPACIDAD INSTALADA PARA LA PREPARACION Y RESPUESTA FRENTE A EMERGENCIAS, Y DESASTRES

S/ 2,114,271.23



La parte de imagen que se encuentra en el archivo.

UBICACIÓN

: DISTRITO : MULTIDISTRITAL
PROVINCIA : MULTIPROVINCIAL

La parte de imagen que se encuentra en el archivo.

BENEFICIARIOS

: 32,000 HABITANTES

La parte de imagen que se encuentra en el archivo.

SITUACIÓN ACTUAL

- ATENCION OPORTUNA AL AFECTADO Y/O DAMNIFICADO CON BIENES DE AYUDA HUMANITARIA DE FORMA TEMPORAL,
- CORRECTA IMPLEMETACION DE ALMACEN CENTRAL Y 2 ALMACENES DE AVANZADA EN EL CENTRO DE OPERACIONES DE EMERGENCIA REGIONAL.

La parte de imagen que se encuentra en el archivo.

PERSPECTIVAS A DIC 2024

- DOTACION DE BIENES DE AYUDA HUMANITARIA A POBLACION AFECTADA Y DAMNIFICADA PARA UN APROXIMADO DE 50 MIL HABITANTES AFECTADOS POR EMERGENCIAS Y DESASTRES.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA

**EJE INFRAESTRUCTURA
(Obj. 5)**

EXPEDIENTES TÉCNICOS

SALUD



**SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS EN DAVID
GUERRERO DUARTE – CONCEPCIÓN, CUI 2483043**

S/ 196' 679,377.31



**SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNÍN,
CUI 2564829**

S/ 276' 353,430.67



**SERVICIOS DE SALUD DE LA MICRORED LAS PALMAS
EN EL DISTRITO DE PICHANAKI, CUI 2084954**

S/ 19' 350,494.84



**SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO
OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA NIVEL II-2, CUI 2409967**

S/ 308' 906,365.92

INVERSIONES EN EL PLAN MIL

Inversión

S/ 358' 525,244.23

NIVEL DE INTERVENCIÓN	TOTAL DE INVERSIÓN
I-2	116,901,557.35
CHANCHAMAYO	49,055,572.20
CHUPACA	4,281,566.47
JAUIJA	33,846,541.21
SATIPO	20,860,660.30
TARMA	8,857,217.17
I-3	241,623,686.88
CHANCHAMAYO	30,179,289.34
CONCEPCION	5,909,191.61
HUANCAYO	58,829,364.32
JAUIJA	36,477,194.18
JUNIN	29,099,680.24
SATIPO	81,128,967.19
TOTAL	358,525,244.23

PERSPECTIVAS A DIC 2024:



- EXPEDIENTES TÉCNICOS APROBADOS Y CON PRESUPUESTO PARA LA EJECUCIÓN POR PARTE DEL MINISTERIO DE SALUD.



SITUACIÓN ACTUAL:

- INVERSIONES ACTIVAS Y VIABLES
- APROBACIÓN DEL PROGRAMA MÉDICO FUNCIONAL DE DIRESA.
- EN EVALUACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO.

EXPEDIENTES TÉCNICOS

TRANSPORTE



CAMINO VECINAL TRAMO I: CHONGOS - CHAMBARA, TRAMO II: ANTAPAMPA CHICO - ANTAPAMPA GRANDE Y TRAMO III: ANTAPAMPA - HUAYAO, DE LAS PROVINCIAS DE CHUPACA Y CONCEPCION, CUI 2489813

S/ 57' 345,937.47



SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN EL RIO PERENE CUENCA ZOTANI DISTRITO DE PERENE, CUI 2606687

S/ 74' 214,222.28



PUENTE JATUN MALCA SOBRE EL RIO MANTARO Y ACCESOS A LOS DISTRITOS DE SINCOS Y MATAHUAS DISTRITO DE SINCOS, CUI 2552538

S/ 5' 597,033.21



PISTAS Y VEREDAS DEL CENTRO POBLADO DE QUILCATACTA DEL DISTRITO DE ULCUMAYO, CUI 2507606

S/ 4' 897,782.00


EXPEDIENTES TÉCNICOS

EDUCACIÓN



SERVICIO EDUCATIVO DEL **COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - JUNÍN)**, DISTRITO DE AHUAC, **CUI 2493150**

S/ 128' 890,005.95



SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA EN **I.E. 30001 SANTA ROSA DE LIMA - HUANCAYO**, **CUI 2626506**

S/ 23' 266,393.73



SERVICIOS EDUCATIVOS EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA N° **30024 VIRGEN DE FATIMA - SAPALLANGA**, **CUI 2453214**

S/ 20' 901,947.33




SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA **I.E. MANUEL GONZALES PRADA DEL CENTRO POBLADO DE PUCACocha**, - ANDAMARCA, **CUI 2303452**

S/ 15' 795,169.85

EXPEDIENTES TÉCNICOS

EDUCACIÓN



SERVICIO DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. SANTIAGO ANTUNEZ DE MAYOLO EN LA CIUDAD DE PICHANAQUI, CUI 2245085

S/ 82' 798,694.83



SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA I.E. INTEGRADA JOSÉ GÁLVEZ CON MODELO JEC DEL CC. PP. RÍO NEGRO, CUI 2300334

S/ 70' 321,562.24



SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. NUESTRA SRA DE FATIMA - EL TAMBO, CUI 2377329

S/ 37' 934,189.12



SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. POLITECNICO SELVA CENTRAL, DISTRITO DE CHANCHAMAYO, CUI 2499579

S/ 154' 752,246.02

EXPEDIENTES TÉCNICOS

EDUCACIÓN INSTITUTOS



SERVICIO EDUCATIVO DEL **INSTITUTO** DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "**ADOLFO VIENRICH**", EN EL DISTRITO DE **TARMA**,
CUI 2530747

S/ 64' 145,082.86



SERVICIO EDUCATIVO DEL **INSTITUTO** DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "**MARCO**", EN EL DISTRITO DE **MARCO**,
CUI 2561597

S/ 154' 752,246.02



SERVICIO EDUCATIVO DEL **INSTITUTO** DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO **PICHANAQUI** DISTRITO DE PICHANAQUI,
CUI 2433050

S/ 27,431,157.37



SERVICIO EDUCATIVO DEL **INSTITUTO** DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "**SAUSA**" EN EL DISTRITO DE SAUSA, **CUI 2520622**

S/ 70' 884,300.46

EXPEDIENTES TÉCNICOS

EDUCACIÓN INSTITUTOS




INSTITUTO SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO SAN MARTIN DE PANGOA - PANGOA, CUI 2134703

S/ 16' 251,169.45



INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICO PÚBLICO "DE CONCEPCIÓN" DISTRITO DE NUEVE DE JULIO, CUI 2658380

S/ 11' 198,892.00

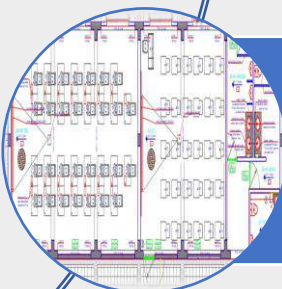

SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL I.E.S.T.P MARIO GUTIERREZ LÓPEZ DISTRITO DE ORCOTUNA, CUI 2523094

S/ 2' 209,487.08

EXPEDIENTES TÉCNICOS

OTROS



SERVICIO DE PROVISIÓN DE AGUA PARA **RIEGO EN EL CIMIRM** DE LOS 24 DISTRITOS DE LA PROVINCIA DE **JAUA**, CONCEPCIÓN, HUANCAYO, **CUI 2604106**

S/ 131' 852,685.69



SERVICIO DE AGUA PARA **RIEGO** EN LOS CANALES LATERALES DEL **CANAL PRINCIPAL PLAN MERY**S EN ORCOTUNA, SICAYA Y PILCOMAYO, **CUI 2314714**

S/ 33' 154,092.51



SERVICIO DE HABITABILIDAD INSTITUCIONAL EN SEDE CENTRAL, DIRECCIÓN DE TRABAJO Y DIRECCIÓN DE AGRICULTURA DEL GRJ, **CUI 2618258**

S/ 310' 929,931.71

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARISCAL CASTILLA, DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN”
CUI N° 2200807



Inversión:

S/ 104'247,487.07

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: EL TAMBO
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 100%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 87.9%
-  **BENEFICIARIOS** : 28,480 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA CULMINÓ EL13 JUNIO DEL 2024, EN PROCESO RECEPCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A FEB 2025** : LOGRAR SATISFACTORIAMENTE LA RECEPCION, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y TRANSFERENCIA AL SECTOR.

ESTADO: CULMINADA **MODALIDAD: CONTRATA**

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL EN LA I.E. 30001-244 DEL DISTRITO DE PICHANAQUI, CHANCHAMAYO - JUNÍN"

CUI N° 2592016



Inversión:

S/. 1,181,458.24

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: PICHANAQUI
PROVINCIA: CHANCHAMAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 97.75%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 99.10%
-  **BENEFICIARIOS** : COMUNIDAD NATIVA DE SHIMASHIRO
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : CULMINADA
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : BRINDAR ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD NATIVA DE SHIMASHIRO.

ESTADO: CULMINADO MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

PROYECTO: SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO, AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENÉ EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENÉ, DISTRITO DE PERENÉ - CHANCHAMAYO - JUNÍN, CUI N° 2247344

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 28,145,737.48

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: PERENÉ
PROVINCIA: CHANCHAMAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 84.07%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 88.65%
-  **BENEFICIARIOS** : 1,407 ESTUDIANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, FECHA PROGRAMADA PARA LA CULMINACIÓN ES EL 28 DE OCTUBRE
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR EL PROYECTO AL 100%

ESTADO: EJECUCION MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY DISTRITO DE SAN JUAN DE PARPA – CHUPACA - JUNÍN, CUI N° 2134888

Inversión:

S/ 13'015,892.66

ANTES



AHORA



 **UBICACIÓN** : DISTRITO: SAN JUAN DE JARPA
PROVINCIA: CHUPACA

 **AVANCE FÍSICO** : 100%

 **AVANCE FINANCIERO** : 93.9%

 **BENEFICIARIOS** : 2,658 HABITANTES

 **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA CULMINÓ EL 31 DE MAYO 2024.

 **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : LOGRAR SATISFACTORIAMENTE LA RECEPCION, LIQUIDACIÓN DE LA OBRA Y TRANSFERENCIA AL SECTOR.

ESTADO: EN RECEPCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “INSTALACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N 31968 EN EL CENTRO POBLADO BAJO CHAVINI, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNÍN”
CUI N° 2250213

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 2'145,917.01

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: PANGOA
PROVINCIA: SATIPO
-  **AVANCE FÍSICO** : 100%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 95.1%
-  **BENEFICIARIOS** : 2,711 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA CULMINÓ EL 18 DE JULIO DEL 2024, EN PROCESO DE RECEPCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : LOGRAR SATISFACTORIAMENTE LA LIQUIDACIÓN DE LA OBRA

ESTADO: EN RECEPCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E. N° 319 ANA AMANCIA RAMOS SANCHEZ DEL DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO - JUNÍN, CUI N° 2484107

AHORA



Inversión:

S/ 2'599,849.35

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: CHUPURO
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 99.40%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 95.00%
-  **BENEFICIARIOS** : 62.00 ESTUDIANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA CULMINÓ EL 07 DE SETIEMBRE DEL 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CONTAR CON LA RECEPCIÓN DE OBRA

ESTADO: CULMINADO

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACIÓN PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA -DISTRITO DE PICHANAQUI – CHANCHAMAYO – JUNÍN”

CUI N° 2494144

Inversión:

S/ 202,730,710.32



UBICACIÓN : DISTRITO: PICHANAQUI
PROVINCIA: CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO : 51.52%



AVANCE FINANCIERO : 49.4%



BENEFICIARIOS : 1656 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL : EN EJECUCIÓN



- PERSPECTIVAS A DIC 2024** :
- SE PROYECTA UN 70% DE AVANCE FÍSICO
 - AVANCE A UN 40% DE LA MEDIA TENSIÓN
 - LIBERACIÓN DE PARTIDAS DE CORTE PARA CONSTRUCCIÓN COMPLETA DE MÓDULOS DE LA RESIDENCIA UNIVERSITARIA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN **MODALIDAD: CONTRATA**

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA - HUANCAYO - JUNÍN, CUI N° 2499920



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA

Inversión:

S/. 149,736,072.40

📍	UBICACIÓN	: DISTRITO : CHILCA PROVINCIA : HUANCAYO
🏗️	AVANCE FÍSICO	: 5.99 %
📈	AVANCE FINANCIERO	: 15.392 %
👥	BENEFICIARIOS	: 2,030 Habitantes
👤📊	SITUACIÓN ACTUAL	: OBRA EN EJECUCIÓN
🕒	PERSPECTIVAS A DIC: 2024	CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DEL PLAN DE CONTINGENCIA Y EMPEZAR CON LA EJECUCIÓN DEL COLEGIO, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 17 DE JULIO DEL 2026

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE LA OROYA - YAULI - JUNÍN.”
CUI N° 2273073



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

Inversión

S/ 30,638,612.30

- 

UBICACIÓN

: DISTRITO:LA OROYA
PROVINCIA:YAULI
- 

AVANCE FÍSICO

: 78.05%
- 

AVANCE FINANCIERO

: 75.01%
- 

BENEFICIARIOS

: 8,808 HABITANTES
- 

SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 10 DE OCTUBRE DEL 2024
- 

PERSPECTIVAS A DIC 2024

: CULMINAR Y CONTAR CON LA RECEPCIÓN DE OBRA.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA I.E. SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI. DISTRITO DE PERENÉ, CHANCHAMAYO, JUNÍN, CUI N° 2330254.

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 30'589,467.37



UBICACIÓN

: DISTRITO: PERENE
PROVINCIA: CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO

: 56.69%



AVANCE FINANCIERO

: 40.80%



BENEFICIARIOS

: 4,714 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 24 DE NOVIEMBRE DEL 2024

PERSPECTIVAS A DIC 2024: CULMINAR Y CONTAR CON LA RECEPCIÓN DE OBRA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

**PROYECTO: AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO
EN EL INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA PÚBLICA ACOLLA, DISTRITO
DE ACOLLA – JAUJA – JUNÍN,
CUI N° 2246585**

Inversión:

S/ 23,569,039.27



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: ACOLLA
PROVINCIA: JAUJA
-  **AVANCE FÍSICO** : 19%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 45%
-  **BENEFICIARIOS** : 1,529 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA SE ENCUENTRA ADELANTADA EN UN 8.23% CON RESPECTO A SU CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : LLEGAR A UN AVANCE DEL 72% DE AVANCE FÍSICO

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCIÓN DE PALIAN, DISTRITO DE HUANCAYO, HUANCAYO-JUNÍN, CUI N° 2242276.

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 22'887,713.36



UBICACIÓN

**: DISTRITO: HUANCAYO
PROVINCIA: HUANCAYO**



AVANCE FÍSICO

: 62.00%



AVANCE FINANCIERO : 60.60%



BENEFICIARIOS

: 3,752 HA



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN



**PERSPECTIVAS A DIC :
2024**

CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100%, PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL NIVEL SECUNDARIO.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN TÉCNICO PRODUCTIVO CETPRO – HUANCAYO, JUNÍN”

CUI N° 2112355

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 14'647,448.69

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO EL TAMBO:
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 96.6%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 95.5%
-  **BENEFICIARIOS** : 1,318 ESTUDIANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, EN LA ETAPA FINAL TIENE PROGRAMADO TERMINAR EL 28 DE DICIEMBRE DEL 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100% Y HACER LA ENTREGA DE OBRA

ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVAS I.E. PUEBLO LIBRE Y LA I.E. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI – SATIPO - JUNÍN, CUI N° 2323267

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 13,995,413.13

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: MAZAMARI
PROVINCIA: SATIPO
-  **AVANCE FÍSICO** : 98.00%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 84.00%
-  **BENEFICIARIOS** : 25,074 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON 98% DE AVANCE FÍSICO.
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : TRANSFERENCIA DE LA OBRA AL MINISTERIO DE EDUCACION.

ESTADO: EN EJECUCION

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA INTEGRADA N 30008 - PAMPA MANDARINA, DISTRITO PAMPA HERMOSA - SATIPO - JUNÍN”
CUI N° 2249786

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 11'128,221.10



UBICACIÓN

**: DISTRITO: PAMPA HERMOSA
PROVINCIA: SATIPO**



AVANCE FÍSICO

: 93.98%



AVANCE FINANCIERO : 80.70%



BENEFICIARIOS

: 1,679 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

**: LA OBRA SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN.**



**PERSPECTIVAS A DIC: RECEPCIONAR Y REALIZAR
2024 ENTREGA DE LA OBRA**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30068 VIRGEN DE FATIMA – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - CHUPACA - JUNÍN”
CUI N° 2458276

Inversión:

S/ 10'761,852.90

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

 **UBICACIÓN** : DISTRITO: CHUPACA
PROVINCIA: CHUPACA

 **AVANCE FÍSICO** : 77.48%

 **AVANCE FINANCIERO** : 74.90%

 **BENEFICIARIOS** : 572 HABITANTES

 **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA EL 17 DE OCTUBRE DEL 2024

 **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CULMINAR LA EJECUCION DE LA OBRA AL 100% Y HACER LA ENTREGA DE OBRA

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. DANIEL ALCIDES CARRIÓN DEL DISTRITO DE HUANCAYO, HUANCAYO - JUNÍN,
CUI N° 2498817**

Inversión:

S/ 9'962,350.43

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: HUANCAYO
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 64.50%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 63.50%
-  **BENEFICIARIOS** : 2,404 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 21 DE NOVIEMBRE DEL 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CULMINAR TODOS LOS COMPONENTES DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100%

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIO EN LA I.E. CAMPAÑA DE LA BREÑA, DISTRITO DE CHACAPALPA – YAULI-JUNÍN”
CUI N° 2278668

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 8,165,613.77

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: CHACAPALPA
PROVINCIA: YAULI
-  **AVANCE FÍSICO** : 23.85%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 40.40%
-  **BENEFICIARIOS** : 1,600 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 25 DE FEBRERO DEL 2025
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : LLEGAR AL PORCENTAJE DEL 70%, DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA OFERTA DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN PRIMARIA DE LA I.E. N 30514, EN LA LOCALIDAD DE MUQUIYAUYO, DISTRITO DE MUQUIYAUYO - JAUJA - JUNÍN”

CUI N° 2243942



Inversión:

S/ 7'669,549.36



- UBICACIÓN** : DISTRITO: MUQUIYAUYO
PROVINCIA: JAUJA
- AVANCE FÍSICO** : 0.0 %
- AVANCE FINANCIERO** : 22.7 %
- BENEFICIARIOS** : 235 HABITANTES
- SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR EL 16 DE ABRIL DE 2025
- PERSPECTIVAS A DIC 2024** : LOGRARÁ UN AVANCE DEL 80.71 %

ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE ATENCIÓN TEMPORAL; EN CUARENTA Y CUATRO I.E. INICIAL, I.E. PRIMARIA A NIVEL DEPARTAMENTAL”

CUI N° 2618175

Inversión:

S/ 6,267,256.83

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

**: DISTRITO: LLAYLLA
PROVINCIA: SATIPO**



AVANCE FÍSICO

: 99.55%



AVANCE FINANCIERO

: 86.5%



BENEFICIARIOS

: 324 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

**: LA OBRA SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN CON 99.55% DE
AVANCE FÍSICO.**



**PERSPECTIVAS A DIC:
2024**

**CULMINACIÓN DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA DE LA
OBRA AL 100 %.**

ESTADO: EN EJECUCION

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN INICIAL DE LA I.E N° 971 – CENTRO POBLADO DE ALTO KIATARI DEL DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN”

CUI N° 2487440

Inversión:

S/ 3,568,199.71



-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: SAN MARTIN DE PANGOA
PROVINCIA: SATIPO
-  **AVANCE FÍSICO** : 82.37%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 82.40%
-  **BENEFICIARIOS** : 430 ESTUDIANTES - NIÑOS DE 3,4 Y 5 AÑOS
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR EN EL MES DE SETIEMBRE 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100% Y HACER LA ENTREGA DE OBRA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN **MODALIDAD: CONTRATA**

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL EN I.E. 434 DISTRITO DE VIQUES – HUANCAYO - JUNÍN”
CUI N° 2594216

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 3'350,749.41



UBICACIÓN

**: DISTRITO: VIQUES
PROVINCIA: HUANCAYO**



AVANCE FÍSICO

: 84.72%



AVANCE FINANCIERO : 86.30%



BENEFICIARIOS

**: 1,266 ESTUDIANTES - NIÑOS
DE 3,4 Y 5 AÑOS**



SITUACIÓN ACTUAL

**: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE PROGRAMADO
CULMINAR EN EL MES DE
SETIEMBRE 2024**



**PERSPECTIVAS A DIC :
2024**

**CULMINAR LA EJECUCIÓN DE
LA OBRA AL 100% Y HACER LA
ENTREGA DE OBRA**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIA DE LA I.E. 31501 SEBASTIÁN LORENTE EN EL DISTRITO DE HUANCAYO - HUANCAYO - JUNÍN”
CUI N° 2565565

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 2'632,616.59

- UBICACIÓN** : DISTRITO : HUANCAYO
PROVINCIA : HUANCAYO
- AVANCE FÍSICO** : 88.77%
- AVANCE FINANCIERO** : 74.60%
- BENEFICIARIOS** : 1,587 ESTUDIANTES
- SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 14 DE OCTUBRE DEL 2024
- PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100% Y HACER LA ENTREGA DE OBRA

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JIRÓN LIMA CUADRAS 7-8 Y EL JIRÓN ANCASH CUADRA 7 DISTRITO DE HUALHUAS – HUANCAYO – JUNÍN
CUI N° 2588848

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 1,161,927.80

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: HUALHUAS
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 0.00%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 0.00%
-  **BENEFICIARIOS** : 2,033 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA INICIÓ SU EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 05 DE DICIEMBRE DEL 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : REALIZAR LA RECEPCIÓN DE OBRA Y CULMINAR CON LA LIQUIDACIÓN


ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN”

CUI: 2499912

ANTES

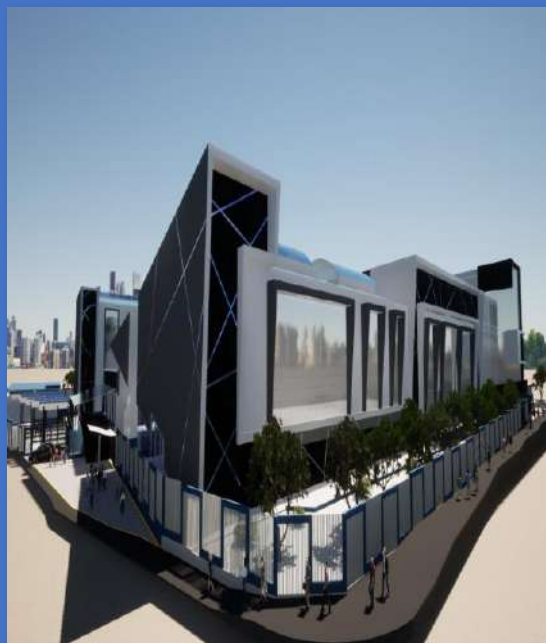

AHORA



Inversión:

S/ 157 '847,290.94

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO EL TAMBO:
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 0 %
-  **AVANCE FINANCIERO** : 1.9%
-  **BENEFICIARIOS** : 2,344 ESTUDIANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : EN EJECUCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR AL 100% EL PLAN DE CONTINGENCIA E INICIAR LA EJECUCION DE LA OBRA

ESTADO: EJECUCION

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL RIO TAMBO, UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN N 312, DISTRITO DE RÍO TAMBO – SATIPO - JUNÍN”
CUI N° 2488764

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 6'574,052.77

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: RIO TAMBO
PROVINCIA: SATIPO
-  **AVANCE FÍSICO** : 85.18%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 76.50%
-  **BENEFICIARIOS** : 10,794 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR EN EL MES DE SETIEMBRE 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CULMINAR LA EJECUCIÓN AL 100%

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACIÓN INTEGRAL DE LA I.E.S.T.P. LA MERCED – CHANCHAMAYO – JUNÍN
CUI N° 2232225

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 8'674,383.77

 **UBICACIÓN** : DISTRITO: LA MERCED
PROVINCIA: CHANCHAMAYO

 **AVANCE FÍSICO** : 51.41%

 **AVANCE FINANCIERO** : 44.50%

 **BENEFICIARIOS** : 259 HABITANTES

 **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 02 DE DICIEMBRE DEL 2024.

 **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100% Y BRINDAR UNA ADECUADA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN ESTUDIANTIL DEL NIVEL SUPERIOR NO UNIVERSITARIA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN RAMÓN DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA DEL DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNÍN",
CUI N° 2430718

Inversión:

S/ 101,708,701.11

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

**: DISTRITO: TARMA
PROVINCIA: TARMA**



AVANCE FÍSICO

: 6.10 %



AVANCE FINANCIERO: 23.80 %



BENEFICIARIOS

: 90,000 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

**: LA OBRA SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN.**



**PERSPECTIVAS A DIC:
2024**

**SE REALICE LA RECEPCIÓN
PARCIAL DE LOS MÓDULOS
DEL PLAN DE CONTINGENCIA,
ASÍ MISMO; SE REALICE LA
ENTREGA DE LA MISMA.**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LA I.E.I. N 30637 ANDRÉS AVELINO CÁCERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO – JUNÍN
CUI N° 2215545

Inversión:

S/ 48,326,125.20

ANTES



AHORA



UBICACIÓN : DISTRITO: PANGOA
PROVINCIA: SATIPO

AVANCE FÍSICO : 24 %

AVANCE FINANCIERO : 44.30 %

BENEFICIARIOS : 13,397 HABITANTES

SITUACIÓN ACTUAL : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR EL 07 DE ABRIL DE 2025

PERSPECTIVAS A DIC 2024 : LOGRAR UN AVANCE DEL 68.19 %

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL PUESTO DE SALUD SAN LORENZO CATEGORÍA I-1, DISTRITO DE SAN LORENZO – JAUJA – JUNÍN”
CUI N° 2452593

Inversión:

S/ 2'184,325.86

ANTES



AHORA



- UBICACIÓN** : DISTRITO: San Lorenzo
PROVINCIA: Jauja
- AVANCE FÍSICO** : 100%
- AVANCE FINANCIERO** : 97%
- BENEFICIARIOS** : 2,200 HABITANTES
- SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
- PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR LA LIQUIDACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA, ADEMÁS DE LA TRANSFERENCIA AL SECTOR.

ESTADO: EN LIQUIDACIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO Y/O ARCHIVO GENERAL; EN EL HOSPITAL REGIONAL DOCENTE MATERNO INFANTIL "EL CARMEN" DISTRITO DE HUANCAYO – HUANCAYO – JUNÍN
CUI N° 2606976

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 3'315,266.15



UBICACIÓN

: DISTRITO: HUANCAYO
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: 100.00%



AVANCE FINANCIERO

: 96.40%



BENEFICIARIOS

: PERSONAL ADMINISTRATIVO
Y ASISTENCIAL DEL
HOSPITAL EL CARMEN



SITUACIÓN ACTUAL

: EN PROCESO DE RECEPCIÓN
DE OBRA



PERSPECTIVAS A DIC :
2024

LOGRAR
SATISFACTORIAMENTE LA
RECEPCIÓN, LIQUIDACIÓN
DE LA OBRA Y
TRANSFERENCIA AL
SECTOR.

ESTADO: EN RECEPCIÓN DE OBRA

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “SALDO DE OBRA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGIÓN JUNÍN”
CUI N° 2164051

ANTES



AHORA



Inversión:

S/204'388,931.23

 **UBICACIÓN** : DISTRITO: HUANCAYO
PROVINCIA: HUANCAYO

 **AVANCE FÍSICO** : 30.02%

 **AVANCE FINANCIERO** : 67.20%

 **BENEFICIARIOS** : 1,311,584 HABITANTES

 **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN

 **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CUMPLIR CON EL CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN PARA CULMINAR LA OBRA EN EL MES DE FEBRERO DEL 2025

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD CENTRO POBLADO DE HUANCAYO – DISTRITO DE HUANCAYO - HUANCAYO – JUNÍN”
CUI N° 2346287

ANTES



AHORA



Inversión

S/ 166'944,895.60

 **UBICACIÓN** : DISTRITO: HUANCAYO
PROVINCIA: HUANCAYO

 **AVANCE FÍSICO** : 82.90%

 **AVANCE FINANCIERO** : 84.40%

 **BENEFICIARIOS** : 87,891 HABITANTES

 **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN
PERSPECTIVAS A DIC: 2024 : TIENE PROGRAMADO CULMINACIÓN EN DICIEMBRE 2024, PARA ASI DOTAR A LA POBLACIÓN DE UN EQUIPAMIENTO MÉDICO



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SÁNCHEZ MEZA, DISTRITO DE CHUPACA – CHUPACA – JUNÍN
CUI N° 2337618

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 145'974,159.49

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: CHUPACA
PROVINCIA: CHUPACA
-  **AVANCE FÍSICO** : 46.03%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 50.20%
-  **BENEFICIARIOS** : 63,429 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 22 DE DICIEMBRE DEL 2024
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR EL PROYECTO PARA BENEFICIO DE LA POBLACIÓN EN EL SECTOR SALUD Y BRINDAR UNA ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL
SAN MARTIN DE PANGOA – DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN**
CUI N° 2281445

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 127,056,460.25



UBICACIÓN

**: DISTRITO: PANGOA
PROVINCIA: SATIPO**



AVANCE FÍSICO

: 75.20%



**AVANCE
FINANCIERO**

: 84.80%



BENEFICIARIOS

: 52,551 HABITANTES



**SITUACIÓN
ACTUAL**

**: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE UN PLAZO VIGENTE
DE CULMINACIÓN PARA EL
06 DE NOVIEMBRE DEL 2024**



**PERSPECTIVAS A
DIC 2024**

**: CULMINACIÓN DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA DE LA
OBRA AL 100 %.**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI – CHANCHAMAYO - JUNÍN”
CUI N° 2279396

Inversión:

S/121,760,714.19



ESTADO: EN EJECUCIÓN	MODALIDAD: CONTRATA
-----------------------------	----------------------------

- | | | |
|---|--------------------------------|--|
|  | UBICACIÓN | : DISTRITO: PICHANAKI
PROVINCIA: CHANCHAMAYO |
|  | AVANCE FÍSICO | : 66.40% |
|  | AVANCE FINANCIERO | : 84.70% |
|  | BENEFICIARIOS | : 69,456.00 HABITANTES |
|  | SITUACIÓN ACTUAL | : OBRA EN EJECUCIÓN, SE VIENE EJECUTANDO: <ul style="list-style-type: none">▪ BLOQUE A: MEDICINA FÍSICA Y REHABILITACIÓN.▪ BLOQUE B: CONSULTAS EXTERNAS, CONSULTORIO DIFERENCIADO Y ADMISIÓN + VIH.▪ BLOQUE C: EMERGENCIA, CENTRO OBSTÉTRICO.▪ BLOQUE D: NUTRICIÓN Y DIETAS. |
|  | PERSPECTIVAS A DIC 2024 | : CULMINACIÓN DE OBRA Y PROCESO DE RECEPCIÓN |

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 1-3 DE LA CC.NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA – DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO –JUNÍN”
CUI N° 2359534

ANTES



AHORA



Inversión:

S/ 39,103,158.30

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: RIO TAMBO
PROVINCIA: SATIPO
-  **AVANCE FÍSICO** : 29.95%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 52.48%
-  **BENEFICIARIOS** : 3,800 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 12 DE FEBRERO DEL 2025
-  **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CUMPLIR CON LOS CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DE OBRA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA – HUANCAYO - JUNÍN”
CUI N° 2336443

ANTES



AHORA



Inversión

S/ 58,829,364.32



UBICACIÓN

**: DISTRITO: SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA
PROVINCIA: HUANCAYO**



AVANCE FÍSICO

: 1.73%



AVANCE FINANCIERO

: 3.3%



BENEFICIARIOS

: 4500 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN



PERSPECTIVAS A DIC: 2024

LOGRAR UN CUMPLIR EL AVANCE FISICO DE EJECUCION DE ACUERDO A CRONOGRAMA

ESTADO: EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-108
TRAMO: PALIAN – VILCACOTO – ACOPALCA – ABRA HUAYTAPALLANA –
PARIAHUANCA – HUANCAYO - JUNÍN” (TRAMO PALIAN – PARIAHUANCA)
CUI N° 2251269



Inversión

S/ 348,109,840.22

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO PARIAHUANCA:
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 20%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 21.3%
-  **BENEFICIARIOS** : 12,719 HABITANTES.
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : EN EJECUCIÓN CON UN
AVANCE FÍSICO DE 20 % (SE
INICIÓ LOS TRABAJOS DE
CORTE EN ROCA SUELTA Y
ROCA FIJA EN EL TRAMO II)
-  **PERSPECTIVAS A DIC:** CULMINAR LA
2024 PAVIMENTACIÓN DEL TRAMO I
(2+300KM AL 3+100 KM).


ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA – TAPO ANTACUCHO – RICRAN – ABRA CAYAN – YAULI. PANCAN – EMP. PE-3S A JAUJA – JUNÍN – II ETAPA”
CUI N° 2329618

Inversión:

S/ 115,620,399.68

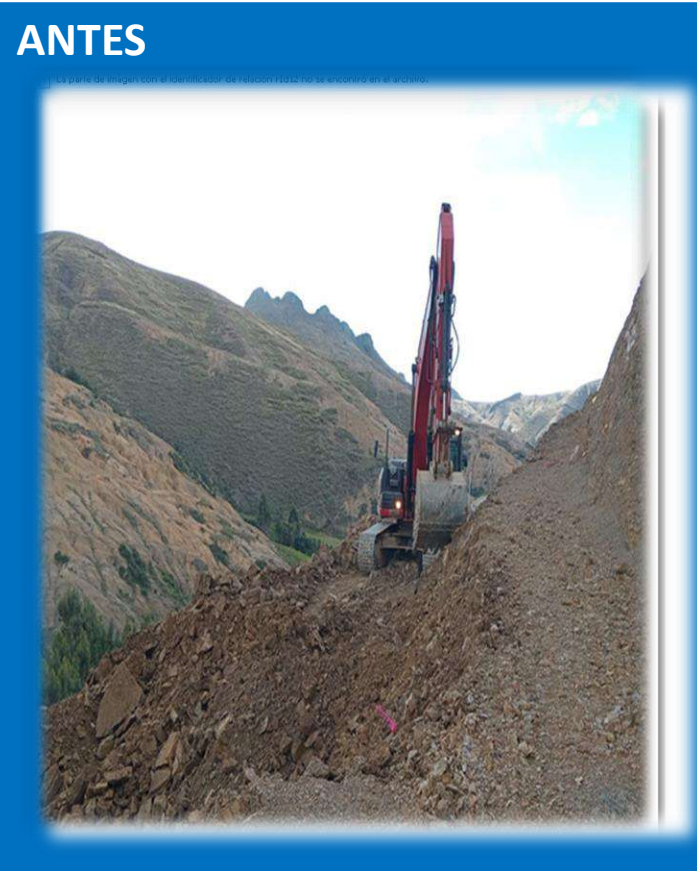

UBICACIÓN

: DISTRITO: PANCAN – YAULI Y
RICRAN
PROVINCIA: JAUJA



AVANCE FÍSICO

: 51.37%



AVANCE FINANCIERO

: 53.76%



BENEFICIARIOS

: 21,157 HABITANTES.



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE PROGRAMADO
CULMINAR LA OBRA EL 27 DE
FEBRERO DEL 2025.



PERSPECTIVAS A DIC:
2024

CORTES DE TALUDES 100%
KM 9 – 24, PLATAFORMA A
NIVEL DE SUBRASANTE 10KM,
CONSTRUCCIÓN DE 20
ALCANTARILLAS TIPO TMC,
RECONFORMACIÓN.

ESTADO: EN EJECUCIÓN **MODALIDAD: CONTRATA**

PROYECTO: CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA – JUNÍN
CUI N° 2300078

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

Inversión

S/ 184,519,258.67

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO
PROVINCIA: HUANCAYO – CHUPACA
-  **AVANCE FÍSICO** : 86.40%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 93.50%
-  **BENEFICIARIOS** : 500,000 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : SE TIENE FECHA APROXIMADA DE CULMINACION EN EL MES DE DICIEMBRE 2024.

**PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100-
JUNÍN-SASICUCHO-INGAYA-ONDORES-SAN PEDRO DE PARI - L.D.PASCO,
PROVINCIA DE JUNÍN – JUNÍN
CUI N° 2342631**

Inversión

S/ 121,908,452.21

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

: DISTRITO: JUNÍN
PROVINCIA: JUNÍN
LOCALIDADES: SASICUCHO
INGAYA - ONDORES - SAN
PEDRO DE PARI



AVANCE FÍSICO

: 22.42%



AVANCE FINANCIERO

: 42.6%



BENEFICIARIOS

: 14,659 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE PROGRAMADO
CULMINAR LA OBRA EL 26
DE MAYO DEL 2025.



PERSPECTIVAS A DIC:
2024

INSTALACIÓN DE
ALCANTARILLAS AL 100%.
COLOCACION DE BASE Y
SUB BASE Y LA CARPETA
ASFÁLTICA.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO – HUANCAYO – JUNÍN”
CUI N° 2277818

Inversión

S/ 133,089,819.00

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN


MODALIDAD: CONTRATA

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: PILCOMAYO - TAMBO
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 66.46%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 77.60%
-  **BENEFICIARIOS** : 209,068.00 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN, SE VIENE EJECUTANDO LOS SIGUIENTES COMPONENTES: MONTAJE DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, TIRANTES, ACCESOS Y DEFENSAS RIBEREÑAS.
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINACIÓN DE OBRA Y PROCESO DE RECEPCIÓN.

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA
VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B - UNATT HUANCUCRO,
DISTRITO DE ACOBAMBA - TARMA - JUNÍN.
CUI 2484002**

Inversión

S/ 4,551,193.00

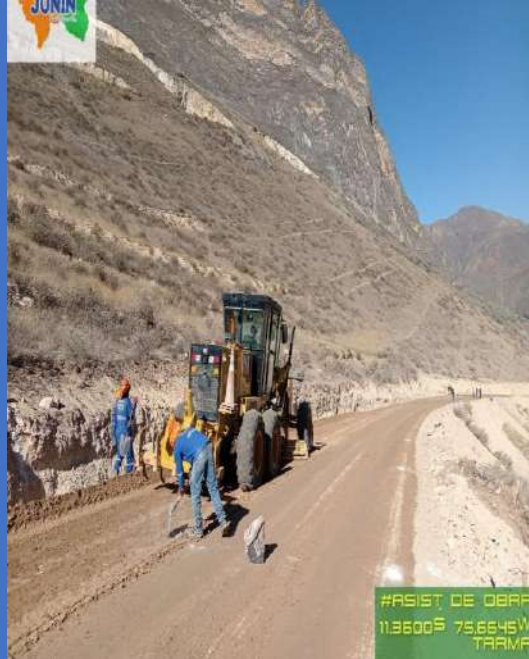

UBICACIÓN

**: DISTRITO: ACOBAMBA
PROVINCIA: TARMA**



AVANCE FÍSICO

: 15.12%



AVANCE FINANCIERO : 34.03%



BENEFICIARIOS

: 3500 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN



**PERSPECTIVAS A DIC :
2024**

**CULMINAR EL PROYECTO AL
100%.**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

PROYECTO: "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO TURISTICO HUAYTAPALLANA TRAMO: EMPJU1047 - EMPJU1072, EN LOS DISTRITOS DE EL TAMBO Y SAN AGUSTIN - HUANCAYO – JUNÍN" – SEGUNDA ETAPA.

CUI 2476726

Inversión

S/ 14'408,576.57



ESTADO: EJECUCIÓN

**MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN
DIRECTA**

-  **UBICACIÓN** : EL TAMBO Y SAN AGUSTIN
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 54.9%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 56.9%
-  **BENEFICIARIOS** : 292546 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA DE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
-  **PERSPECTIVAS A DIC: 2024** : CULMINACION DE LA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA AL 100 %

**PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE CALZADA, VEREDA, CUNETA Y DRENAJE
TRANVERSAL; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) AV. MAX HONGLER
DISTRITO DE HUAMANCACA CHICO - CHUPACA - JUNÍN”**
CUI N° 2597370

Inversión

S/ 3,300,247.58

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

: HUAMANCACA CHICO
CHUPACA



AVANCE FÍSICO

: 95.26%



AVANCE
FINANCIERO

: 90.08%



BENEFICIARIOS

: 8766 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: RECEPCIÓN DE OBRA



PERSPECTIVAS A
DIC 2024

: ENTREGA Y RECEPCIÓN DE
OBRA

ESTADO: RECEPCIÓN DE OBRA

MODALIDAD:
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROYECTO: “AMPLIACION DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN LOCALIDAD SANGANI DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNÍN”
CUI N° 2606589

Inversión

S/ 90,911,461.40



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: PERENE
PROVINCIA: CHANCHAMAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 7.94%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 0.69%
-  **BENEFICIARIOS** : 11,190 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : MEJORAR EL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA DE LA LOCALIDAD DE SANGANI INICIANDO CON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE VEREDAS, SARDINELES Y PAVIMENTOS RIGIDOS CON UN 20% DE AVANCE

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: “CREACION DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN 7 UNIDADES PRODUCTORAS 7 CENTROS POBLADOS DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN”, CUI N° 2597982

Inversión

S/ 21,879,899.70

ANTES



- UBICACIÓN** : DISTRITO: EL TAMBO
PROVINCIA: HUANCAYO
- AVANCE FÍSICO** : 1.68%
- AVANCE FINANCIERO** : 2.78%
- BENEFICIARIOS** : 18,204 POBLADORES CON PORCENTAJE DE LA RED VIAL VECINAL EN CONDICIONES INADECUADAS
- SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN
- PERSPECTIVAS A DIC 2024** : COLOCACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN LA AV.. PROGRESO, COLOCACION DE PAVIMENTO FLEXIBLE EN VIA HACIA EL PARQUE 7 LEYENDAS-COCHAS CHICO. LOGRANDO UN AVANCE DE EJECUCIÓN FISICA DE 40.00%.

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

**PROYECTO: "REPARACION DE CALZADA; RENOVACION DE SEÑALIZACION
HORIZONTAL Y SEÑALIZACION VERTICAL; EN EL (LA) VIAS LOCALES
DISTRITO DE TARMA - TARMA - JUNÍN"
CUI 2606832**

Inversión

S/ 6' 344,753.01



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO:VIAS LOCALES (18 JIRONES - 40,576.77 M2)
PROVINCIA: TARMA
-  **AVANCE FÍSICO CONTRACTUAL** : 37.32%
-  **AVANCE FISICO ADICIONAL N° 01** : 62.80%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 30.00%
-  **BENEFICIARIOS** : 109,333 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : OBRA EN EJECUCIÓN
-  **PERSPECTIVAS A OCT: 2024** : CULMINACION DE LA COLOCACION DE LA CARPETA ASFALTICA AL 100 %

SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO” TRAMO: ACOBAMBA – PALCAMAYO – SAN PEDRO DE CAJAS – CONDORIN – TARMA – JUNÍN”.

CUI N° 2111279

Inversión

S/ 3,486,444.75



UBICACIÓN

**: DISTRITO: PALCAMAYO
PROVINCIA: TARMA**



AVANCE FÍSICO

: 31.34%



AVANCE FINANCIERO : 41.52%



BENEFICIARIOS

: 23,000 BENEFICIARIOS



SITUACIÓN ACTUAL

**: LA OBRA SE ENCUENTRA EN
EJECUCIÓN.**



**PERSPECTIVAS A DIC :
2024**

**CULMINAR LA OBRA AL 100%.
Y ENTREGA DE OBRA**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: ADMINISTRACIÓN DIRECTA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL AA HH JULIO LA ROSA DEL SECTOR DEL PAMPA DEL CARMEN DEL DISTRITO DE CHANCHAMAYO - CHANCHAMAYO - JUNÍN.

CUI: 2412331

Inversión

S/. 1,997,149.96



- 

UBICACIÓN

: DISTRITO : CHANCHAMAYO
PROVINCIA : CHANCHAMAYO
- 

AVANCE FÍSICO

: 100 %
- 

AVANCE FINANCIERO

: 100 %
- 

BENEFICIARIOS

: 2,730 HABITANTES
- 

SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN PROCESO DE LIQUIDACION
- 

PERSPECTIVAS A DIC 2024

: QUE EL PROYECTO SE LIQUIDE Y SE TRANSFIERA A LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHANCHAMAYO

ESTADO: EN LIQUIDACIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE PISTAS Y VEREDAS DE LA AV. RAMON CASTILLA LADO DERECHO DEL BARRIO DE SANTA MARIA DE CARHUAMAYO - JUNÍN – JUNÍN”
CUI 2288100

S/ 2'631,716.84



-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: CARHUAMAYO
PROVINCIA: HUANCAYO
-  **AVANCE FÍSICO** : 100.00%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 94.59%
-  **BENEFICIARIOS** : 8.836 HA.
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA CUENTA CON ACTA DE RECEPCIÓN DE OBRA DE FECHA 29/08/24
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : LOGRAR SATISFACTORIAMENTE LIQUIDACION DE LA OBRA Y TRANSFERENCIA AL SECTOR

ESTADO: LIQUIDACIÓN MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE VICTORIA
DISTRITO DE SAN RAMON - CHANCHAMAYO - JUNÍN” ,
CUI 2277710.

Inversión

S/ 24,196,309.31

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

: DISTRITO: SAN RAMON
PROVINCIA: CHANCHAMAYO



AVANCE FÍSICO

: 13.80 %



AVANCE FINANCIERO : 23.70 %



BENEFICIARIOS

: 21,628 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE PROGRAMADO
CULMINAR EL 01 DE MAYO DEL
2025



PERSPECTIVAS A DIC:
2024

LOGRARA UN AVANCE DEL
58.28 %

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL PUENTE QUEMPIRI EN EL ANEXO VALLE QUEMPIRI, DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN, CUI 2522155

Inversión

S/ 22,069,323.55

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

: DISTRITO: RIO TAMBO
PROVINCIA: SATIPO



AVANCE FÍSICO

: 47.20%



AVANCE FINANCIERO

: 60.00%



BENEFICIARIOS

: 533,461 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 30 DE DICIEMBRE DEL 2024

PERSPECTIVAS A DIC 2024



: CULMINACIÓN DE OBRA SEGÚN LOS ESTÁNDARES DE CALIDAD, RECEPCIÓN DE OBRA E INICIO DE LA LIQUIDACIÓN

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL, DEL JR. IQUITOS, TRAMO: JR. GRAU HASTA PIEDRA PARADA, DISTRITO DE CONCEPCIÓN – CONCEPCIÓN – JUNÍN, CUI 2492992.

Inversión

S/8'385,248.42

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

: DISTRITO: CONCEPCIÓN
PROVINCIA: CONCEPCIÓN



AVANCE FÍSICO

: 23.73%



AVANCE FINANCIERO

: 20.90%



BENEFICIARIOS

: 616 HA



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: CULMINAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100%, PARA BENEFICIO DE LA POBLACION PARA BRINDAR UN ADECUADO SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL Y VEHICULAR.



PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN LA CALLE PRINCIPAL ALFONSO UGARTE, 13 DE JULIO Y 28 DE JULIO EN EL ANEXO DE PACCHA DEL DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNÍN

CUI N° 2507874

S/ 5,376,596.73

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

: DISTRITO: EL TAMBO
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: 49.40%



AVANCE FINANCIERO

: 52.6%



BENEFICIARIOS

: 1647 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: LA OBRA ESTA EN
EJECUCIÓN



PERSPECTIVAS A DIC
2024

: CULMINACIÓN DE LA
EJECUCIÓN FISICA DE
LA OBRA AL 100%.

ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN CARRETERA CHALHUMAYO-HUAYAO, DISTRITO DE LLAYLLA - SATIPO - JUNÍN”.
CUI: 2601529

Inversión

S/ 4,420,622.31

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

**: DISTRITO: LLAYLLA
PROVINCIA: SATIPO**



AVANCE FÍSICO

: 72.85%



AVANCE FINANCIERO: 63.8%



BENEFICIARIOS

: 324 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL : LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN CON 72.85% DE AVANCE FÍSICO.



PERSPECTIVAS A DIC: 2024 CULMINACION DE LA EJECUCIÓN FÍSICA DE LA OBRA AL 100 %.

PROYECTO: CREACION DE PISTAS Y VEREDAS EN LAS CALLES DEL CASCO URBANO DEL ANEXO MALAYO SAN ROQUE, DISTRITO DE SAÑO - HUANCAYO - JUNÍN - 1RA ETAPA.

CUI 2450885

Inversión

S/ 4'349,889.03

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

: ANEXO: MALAYO SAN ROQUE
DISTRITO: SAÑO
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: 50.70%



AVANCE FINANCIERO : 65.40%



BENEFICIARIOS

: 1500 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN



PERSPECTIVAS A DIC: ENTREGAR LA OBRA AL ENTE
2024 COMPETENTE PARA SU
MANTENIMIENTO
CORRESPONDIENTE

ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA

**PROYECTO: CREACION DEL PUENTE CARROZABLE Y ACCESO EN EL
C.P. BELEN DE ANAPIARI, DISTRITO DE PICHANAKI -
CHANCHAMAYO - JUNÍN,
CUI: 2295900**

Inversión

S/. 3,992,162.18

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

**: DISTRITO : PICHANAKI
PROVINCIA : CHANCHAMAYO**



AVANCE FÍSICO

: 16.63%



AVANCE FINANCIERO

: 44.97%



BENEFICIARIOS

: 450,984 HA



SITUACIÓN ACTUAL

**: OBRA EN EJECUCIÓN, SE
TIENE PROGRAMADO
CULMINAR LA OBRA EL 30 DE
OCTUBRE DEL 2024**



**PERSPECTIVAS A DIC:
2024**

**CULMINAR AL 100% LA
EJECUCIÓN DEL PUENTE
CARROZABLE**

PROYECTO: CREACIÓN DEL SERVICIO DE MOVILIDAD URBANA EN EL JR. CAJAMARCA TRAMO: CRUCE CARRETERA CENTRAL – CRUCE CANAL DE RIEGO DISTRITO DE APATA - JAUJA - JUNÍN,
CUI N° 2599649

Inversión

S/ 3,908,295.25

ANTES



AHORA



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

: DISTRITO: APATA
PROVINCIA: JAUJA



AVANCE FÍSICO

: 71.95%



AVANCE FINANCIERO

: 25.00%



BENEFICIARIOS

: 45.00 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 06 DE OCTUBRE DEL 2024



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: CULMINAR LA EJECUCIÓN DE LA OBRA AL 100% Y HACER LA ENTREGA DE OBRA.

PROYECTO: CREACIÓN DE PISTAS Y VEREDAS DEL SECTOR SAN FRANCISCO DEL DISTRITO DE SATIPO – SATIPO – JUNÍN, CUI 2413856

ANTES



AHORA



Inversión

S/ 4,131,631.27



UBICACIÓN

: DISTRITO: SATIPO
PROVINCIA: SATIPO



AVANCE FÍSICO

: 32.40%



AVANCE
FINANCIERO

: 52.30%



BENEFICIARIOS

: 755 HABITANTES



SITUACIÓN
ACTUAL

: LA OBRA EN EJECUCIÓN



PERSPECTIVAS A
DIC 2024

: CULMINACION DE LA
EJECUCIÓN FÍSICA DE LA
OBRA AL 100 %.

ESTADO: EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TRAMO: PTAP – HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO: HOSPITAL-PUTCAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA MARIA DEL DISTRITO DE PANGOA – SATIPO – JUNÍN”.

CUI N° 2497157

Inversión

S/ 8,360,844.88



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: ADM. DIRECTA



UBICACIÓN

**: DISTRITO: PANGOA
PROVINCIA: SATIPO**



AVANCE FÍSICO

: 91.13%



AVANCE FINANCIERO : 47.71%



BENEFICIARIOS

: 57,240 POBLADORES



SITUACIÓN ACTUAL

: OBRA EN EJECUCIÓN



**PERSPECTIVAS A DIC :
2024**

**CULMINAR CON LA RED DE
DISTRIBUCION DEL SERVICIO
DE AGUA POTABLE TRAMO:
HOSPITAL - PUTCAMAYO**

IOARR: “RENOVACION DE RED DE DISTRIBUCION Y RED DE ALCANTARILLADO; CONSTRUCCIÓN DE BUZON; EN EL(LA) C.P. DE PANCAN, HUALÁ, YAULI DISTRITO DE PANCAN – JAUJA - JUNÍN”

CUI N° 2629304

Inversión

S/ 1,739,046.93



ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD:
ADMINISTRACION DIRECTA

-  **UBICACIÓN** : DISTRITO: PANCAN, YAULI Y HUALA
PROVINCIA: JAUJA
-  **AVANCE FÍSICO** : 31.13%
-  **AVANCE FINANCIERO** : 25.30%
-  **BENEFICIARIOS** : 2,000 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : LA OBRA DE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : CULMINAR LA OBRA AL 100%.

IOARR: “REMODELACION DE ALCANTARILLA; REPARACION DE PTAR; CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRICO; EN EL(LA) CENTRO POBLADO HUAYRE DISTRITO DE JUNÍN – JUNÍN -JUNÍN”.
CUI N° 2586658

Inversión

S/ 1,739,046.93



ESTADO: EN EJECUCIÓN **MODALIDAD:**
ADMINISTRACION DIRECTA



UBICACIÓN

: DISTRITO: JUNÍN
PROVINCIA: JUNÍN



AVANCE FÍSICO

: 10.09%



AVANCE FINANCIERO

: 20.60%



BENEFICIARIOS

: 300 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: LA OBRA DE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN.



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: CULMINACIÓN DE EJECUCIÓN AL 100%.
CONTAR CON UNA INFRAESTRUCTURA DE DESAGÜE Y REMODELACIÓN DE PTAR. MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV LOS ANGELES, CALLE DANIEL ALCIDES CARRION TRAMO (CARRETERA CENTRAL- CALLE SUCRE), CALLE 13 DE JULIO TRAMO (CALLE DANIEL ALCIDES CARRION - AV LOS ANGELES), JR TEMBLADERA, PJE LAS GARDEMIAS, PJE TEMBLADERA, PJE SARITA COLONIA, ANEXO DE BELLAVISTA, DISTRITO DE SAN AGUSTIN - HUANCAYO - JUNÍN,

CUI: 2479433

Inversión

S/. 3,810,785.29



ESTADO: EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

-  UBICACIÓN : DISTRITO : SAN AGUSTIN
PROVINCIA : HUANCAYO
-  AVANCE FÍSICO : 16.58%
-  AVANCE FINANCIERO : 16.58%
-  BENEFICIARIOS : 1,252 HA
-  SITUACIÓN ACTUAL : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO CULMINAR LA OBRA EL 11 DE ENERO DEL 2025
-  PERSPECTIVAS A DIC : CULMINACION DE PAVIMENTO RIGIDO Y CUNETAS EN LA AV. LOS ANGELES Y AV. DANIEL A. CARRION.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DRENAJE PLUVIAL EN EL JR. INDEPENDENCIA, PASAJE S/N, JR. TAHUANTINSUYO TRAMO JR. INDEPENDENCIA – JR. INCA PACHACUTEC, PASAJE TAHUANTINSUYO Y JR. 03 DE OCTUBRE TRAMO JR. MILLER – PROLG. PIURA ANTIGUA DEL SUB SECTOR CB 17 Y 18, DISTRITO DE HUANCAYO - DE HUANCAYO - JUNÍN,
CUI 2235482

Inversión

S/ 1'379,730.50

ANTES



AHORA



ESTADO: EN LIQUIDACION **MODALIDAD:** CONTRATA



UBICACIÓN

: DISTRITO: SICAYA
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: 100.00%



AVANCE FINANCIERO : 95.70%



BENEFICIARIOS

: 377 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL

: EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN
DE OBRA



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: LOGRAR
SATISFACTORIAMENTE LA
LIQUIDACION DE LA OBRA.

**IOARR: “REPARACIÓN DE CAPTACIÓN DE AGUA, PTAP Y RESERVORIO;
CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE CONDUCCIÓN; ADEMAS DE OTROS ACTIVOS EN
EL(LA) SISTEMA DE AGUA POTABLE URBANO DISTRITO DE SAN RAMÓN -
CHANCHAMAYO - JUNÍN”**
CUI N° 2586071

ANTES



AHORA



ESTADO: EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

Inversión

S/ 8,127,258.46

 **UBICACIÓN** : SAN RAMON
CHANCHAMAYO

 **AVANCE FÍSICO** : 75.93%

 **AVANCE FINANCIERO** : 80.74%

 **BENEFICIARIOS** : 21,150 HAB

 **SITUACIÓN ACTUAL** : EN EJECUCIÓN.

 **PERSPECTIVAS A DIC:** CULMINACION DEL IOARR AL
2024 100%

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO”

CUI N° 2017383 – 2DO SALDO

Inversión

S/ 49,940,957.71



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: CONTRATA

-  UBICACIÓN : SATIPO SATIPO
-  AVANCE FÍSICO : 81.88%
-  AVANCE FINANCIERO : 87.15%
-  BENEFICIARIOS : 22,544 HABITANTES
-  SITUACIÓN ACTUAL : EL MEJORAMIENTO Y/O CONTRUCCIÓN DE LA CAPTACIÓN , DESARENADOR, PTAP, RESERVORIOS, POZOS TUBULARES, PTAR, LÍNEAS DE CONDUCCIÓN, REDES DE DISTRIBUCIÓN Y CONEXIONES DOMICILIARIAS.
-  PERSPECTIVAS A DIC : CULMINACION AL 100% 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE PROTECCIÓN CONTRA INUNDACIONES EN LA LOCALIDAD DE SATIPO MARGEN IZQUIERDA DEL RIO SATIPO – PROGRESIVA KM 0+000 – 4+000, DISTRITO DE SATIPO - SATIPO – JUNÍN,
CUI 2345383

Inversión

S/ 45,200,609.22

ANTES



AHORA



UBICACIÓN : PROVINCIA: SATIPO



AVANCE FÍSICO : 9.30%



AVANCE FINANCIERO : 30.6%



BENEFICIARIOS : 176,958 HABITANTES



SITUACIÓN ACTUAL : OBRA EN EJECUCIÓN



PERSPECTIVAS A DIC 2024 : LLEGAR A UN AVANCE DEL 40% DE AVANCE FÍSICO

ESTADO: EN EJECUCIÓN

**PROYECTO: “CREACION DE LOS SERVICIOS TURISTICOS DEL MIRADOR
CRUZ LOMA EN EL CENTRO POBLADO DE HUAYHUAY DEL DISTRITO DE
HUAY-HUAY - YAULI - JUNÍN”,
CUI 2533181**



ESTADO: EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

Inversión

S/ 3'192,536.98

 UBICACIÓN

: DISTRITO: HUAY-HUAY
PROVINCIA: YAULI

 AVANCE FÍSICO

: 0%

 AVANCE FINANCIERO

: 0%

 BENEFICIARIOS

: 846 HABITANTES

 SITUACIÓN ACTUAL

: EN EJECUCIÓN
OBRA INICIÓ EL 25/09/2024

 PERSPECTIVAS A DIC 2024

: LLEGAR A UN 50 % DE AVANCE FISICO.

PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURISTICOS PUBLICOS
EL SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA EN EL BICENTENARIO DE
LA BATALLA DE JUNÍN DISTRITO DE JUNÍN - JUNÍN - JUNÍN – I ETAPA,
CUI 2624138

Inversión

S/5,686,801.92



ESTADO: EN EJECUCIÓN MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA

- UBICACIÓN : DISTRITO: JUNÍN
PROVINCIA: JUNÍN
- AVANCE FÍSICO : 15.30%
- AVANCE FINANCIERO : 7.96%
- BENEFICIARIOS : 22,208 AGENTES ECONOMICOS
- SITUACIÓN ACTUAL : OBRA EN EJECUCIÓN, SE TIENE PROGRAMADO LA CULMINACION PARA EL MES DE OCTUBRE
- PERSPECTIVAS A DIC : CULMINAR EL PROYECTO AL 100%
2024

**IOARR: “CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO Y INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA;
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN EL(LA) CUARTEL 9 DE DICIEMBRE
DE LA 31A BRIGADA DE INFANTERÍA DISTRITO DE CHILCA – HUANCAYO - JUNÍN”,
CUI N°2610647**



Inversión

S/1'269,907.02



UBICACIÓN : DISTRITO: CHILCA
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE FÍSICO : 100%



AVANCE FINANCIERO : 100%



BENEFICIARIOS : 600 SOLDADOS



SITUACIÓN ACTUAL : OBRA CULMINADA



PERSPECTIVAS A DIC 2024 : ENTREGA DE OBRA E INICIO DE LIQUIDACIÓN

ESTADO: OBRA CULMINADA **MODALIDAD: ADMINISTRACION DIRECTA**

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RECREACIÓN EN LA PLAZA MONUMENTAL JUAN BOLIVAR CRESPO - 20 DE ENERO, LOCALIDAD DE YAUYOS, DISTRITO DE YAUYOS - JAUJA - JUNÍN”
CUI 2355137

Inversión

S/ 4'749,583.14

ANTES



AHORA



UBICACIÓN

**: DISTRITO: YAUYOS
PROVINCIA: JAUJA**



AVANCE FÍSICO

: 0%



AVANCE FINANCIERO : 0.59%



BENEFICIARIOS

: 45.00 HA



SITUACIÓN ACTUAL

**: OBRA EN EJECUCIÓN
INICÓ EL 24/08/2024**



PERSPECTIVAS A DIC 2024

**: LOGRAR UN AVANCE FISICO
DE EJECUCIÓN AL 70 %**

ESTADO: EN EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL EN CINCO COMUNIDADES DE LA ZONA FRONTERA DE LA CUENCA DEL ENE, DISTRITO DE RIO TAMBO – SATIPO – JUNÍN”,
CUI N° 2516531



AHORA

S/ 11,257,308.04



UBICACIÓN

: EL TAMBO
HUANCAYO



BENEFICIARIOS

: ESTUDIANTES DE 5
COMUNIDADES.



SITUACIÓN ACTUAL

: POR INICIAR



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: TENER UN AVANCE
DE OBRA SIN
RETRASO
EN EL AÑO 2024

ESTADO:A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN UNIDAD EDUCATIVA RIO ENE MANTARO DISTRITO DE RIO TAMBO - SATIPO - JUNÍN”
CUI N° 2605274

ANTES



AHORA



ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA

Inversión

S/ 8'919,205.30



UBICACIÓN

**: DISTRITO: RIO TAMBO
PROVINCIA: SATIPO**



BENEFICIARIOS

: MAS 77 PERSONALES ADMINISTRATIVOS Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL DE LA CUENCA DEL RIO ENE MANTARO.



SITUACIÓN ACTUAL

: CON CONTRATO SUSCRITO E INICIO DE ACTOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA



PERSPECTIVAS A DIC 2024

: CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN PROGRAMADA AL 2024.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA DE LA I.E ALBERTH EINSTEIN EN LA LOCALIDAD DE BOCAMATARO, DISTRITO DE VIZCATAN DEL ENE – SATIPO – JUNÍN”

CUI N° 2567617

Inversión

S/ 5'687,279.60

ANTES



AHORA



-  UBICACIÓN

: DISTRITO: VIZCATAN DEL ENE
PROVINCIA: SATIPO
-  BENEFICIARIOS

: 1,014 ESTUDIANTES DE NIVEL SECUNDARIA
-  SITUACIÓN ACTUAL

: CON CONTRATO SUSCRITO E INICIO DE ACTOS PREPARATORIOS PARA LA EJECUCIÓN DE OBRA
-  PERSPECTIVAS A DIC 2024

: CUMPLIR CON LA EJECUCIÓN PROGRAMADA AL 2024.

ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. MIGUEL GRAU SEMINARIO, DISTRITO DE MARISCAL CASTILLA – CONCEPCIÓN – JUNÍN
CUI N° 2240272



ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA

Inversión

S/ 7,794,650.87

- 

UBICACIÓN

: DISTRITO:MARISCAL CASTILLA
PROVINCIA:CONCEPCIÓN
- 

AVANCE FÍSICO

: 0%
- 

AVANCE FINANCIERO

: 1.4%
- 

BENEFICIARIOS

: 1,333 HABITANTES
- 

SITUACIÓN ACTUAL

: ACTOS PREPARATORIOS PARA INICIO DE OBRA
- 

PERSPECTIVAS A DIC: 2024

INICIAR LA OBRA Y LLEGAR AL VACEADO DE CIMIENTO E INSTALACION DE CASTILLONES.


PROYECTO: SALDO DE OBRA DEL PROYECTO DENOMINADO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL CENTRO POBLADO MENOR JORGE CHAVEZ DARTNELL”

CUI: 2030733

Inversión

S/ 7'906,866.62

ANTES

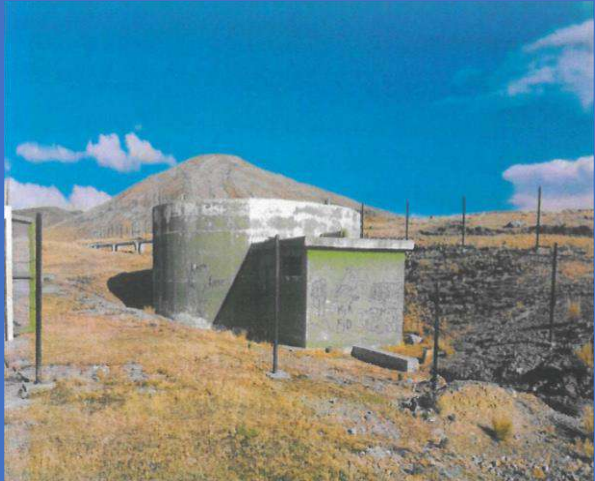

AHORA



-  UBICACIÓN : DISTRITO: CARHUAMAYO
PROVINCIA: JUNÍN
-  BENEFICIARIOS : 728 HABITANTES
-  SITUACIÓN ACTUAL : SE OTORGO LA BUENA PRO EL 20/08/2024 (EJECUCIÓN), Y LA SUPERVISION SE ENCUENTRA EN PROCESO DE CONVOCATORIA.
-  PERSPECTIVAS A DIC 2024 : LLEGAR AL PORCENTAJE DEL 35%, DE AVANCE EN LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.

ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE URBANO Y MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO EN LOS SECTORES DE CHURAMPI, CENTRO Y SAN ISIDRO DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - CHUPACA - JUNÍN” .
CUI N° 2595430

Inversión

S/ 3'216,521.26



-  **UBICACIÓN** : TRES DE DICIEMBRE CHUPACA
-  **BENEFICIARIOS** : 1,127 HABITANTES
-  **SITUACIÓN ACTUAL** : ACTOS PREPARATORIOS PARA INICIO DE OBRA.
-  **PERSPECTIVAS A DIC 2024** : DISMINUIR LA CARGA DE CONTAMINANTES POR ACTIVIDADES DOMESTICAS

ESTADO: A INICIAR **MODALIDAD: CONTRATA**

**PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR
TECNOLÓGICA EN I.E.S.T.P "SAN IGNACIO DE LOYOLA" DISTRITO DE
JUNÍN - JUNÍN - JUNÍN,
CUI 2474277**



Inversión

S/ 154' 752,246.02



UBICACIÓN

**: DISTRITO: JUNÍN
PROVINCIA: JUNÍN**



BENEFICIARIOS

: 499 ESTUDIANTES



SITUACIÓN ACTUAL

**: ACTOS PREPARATORIOS
PARA INICIO DE OBRA**



**PERSPECTIVAS A DIC:
2024**

**EJECUCIÓN FÍSICA DE LA
OBRA DE ACUERDO A LO
PROGRAMADO.**

ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA

PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN EL JR. 3 DE MAYO Y JR. FLORIDA DEL DISTRITO DE SICAYA - HUANCAYO - JUNÍN, CUI 2507672

Inversión

S/ 4,059,048.56



ESTADO: A INICIAR MODALIDAD: CONTRATA

- UBICACIÓN

: DISTRITO: SICAYA
PROVINCIA: HUANCAYO
- AVANCE FÍSICO

: 0.00%
- AVANCE FINANCIERO

: 0.90%
- BENEFICIARIOS

: 1,088 HABITANTES
- SITUACIÓN ACTUAL

: EN PROCESO DE PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO DE EJECUCIÓN
- PERSPECTIVAS A DIC 2024

: AVANCE DE EJECUCIÓN DE OBRA DE ACUERDO A LO PROGRAMADO

**PROYECTO: “CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA Y AREA DE MAESTRANZA;
EN EL(LA) ALMACEN DE HUAYUCACHI DEL GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN
DISTRITO DE HUAYUCACHI – HUANCAYO - JUNÍN”
CUI N.º 2619951**

Inversión

S/ 2’742,591.74

ANTES



AHORA



ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONTRATA



UBICACIÓN

: DISTRITO: HUAYUCACHI
PROVINCIA: HUANCAYO



AVANCE FÍSICO

: 0%



AVANCE FINANCIERO : 9.1%



BENEFICIARIOS

: 700 HA



SITUACIÓN ACTUAL

: SE SUSCRIBIO EL CONTRATO
CON EL CONSORCIO
HUAYUCACHI ENCARGADOS
DE LA EJECUCIÓN DE OBRA Y
CONTINUA EN PROCESO DE
SELECCIÓN LA SUPERVISION
DE OBRA.



PERSPECTIVAS A DIC :
2024

INICIAR LA EJECUCIÓN DE
OBRA Y LLEGAR A UN 80 % DE
AVANCE FISICO.

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD A TRAVÉS DEL PUENTE EN LA AV. PERÚ SOBRE EL RÍO MAZAMARI- DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNÍN”
CUI 2489868.



Inversión

S/ 34'016,957.00

- UBICACIÓN

: DISTRITO: MAZAMARI
PROVINCIA: SATIPO
- AVANCE FÍSICO

: 0.0 %
- AVANCE FINANCIERO

: 5.30 %
- BENEFICIARIOS

: 20,595 Habitantes
- SITUACIÓN ACTUAL

: SE ENCUENTRA EN PROCESO DE FIRMA DE ADENDA CONVENIO INSTITUCIONAL CON SIMA PERÚ, PARA INICIO DE OBRA
- PERSPECTIVAS A DIC 2024

: INICIAR CON LA EJECUCIÓN DE LA OBRA EN EL PRESENTE AÑO FISCAL

ESTADO: A INICIAR

MODALIDAD: CONVENIO

PROYECTO: “MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANO EN LA CARRETERA TRAMO: EMP. PE-24 A (PARATUSHALI), CAPIRO, RIO VENADO, HUAHUARI, HIPOKI, EMP. PE-SS (BOCA CHENI), DISTRITO RÍO NEGRO - SATIPO - JUNÍN”,
CUI 2619944

AHORA

Convocatoria

Información General

Nomenclatura:

LP-SM-21-2023-GRJ-CS-1

N° Convocatoria:

1

Tipo Compra o Selección:

Por la Entidad

Normativa Aplicable:

Ley N° 30223 - Ley de Contrataciones del Estado

Versión SEACE

3

Información general de la Entidad

Entidad Convocante:

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Dirección Legal:

JR.LORETO363-3ER PISO CENTRO CIVICO (JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO)

Página Web:

WWW.REGIONJUNIN.GOB.PE

Teléfono de la Entidad:

064-232230

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:

Obras

Descripción del Objeto:

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAM...
CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO: EMP. PE-24 A (PARATUSHALI), CAPIRO, RIO VENADO, HUAHUARI, HIPOKI, EMP. PE-SS (BOCA CHENI), DISTRITOS DE SATIPO, RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Valor Estimado / Valor Referencial

190,193,996.27 Soles

Monto del Derecho de Participación:

GRATUITO

Monto del costo de Reproducción de las Bases:

9.00

Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases

Estado

Cuenta

Caja de la Entidad

Fecha y Hora Publicación:

17/06/2024 20:29

Cronograma

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	17/06/2024	17/06/2024
Registro de participantes(Electronica)	18/06/2024 00:01	28/08/2024 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronica)	18/06/2024 00:01	01/07/2024 23:59
Abstención de consultas y observaciones(Electronica)	20/06/2024	20/08/2024
Integración de las Bases SEACE	20/08/2024	20/08/2024
Presentación de ofertas(Electronica)	29/08/2024 00:01	29/08/2024 23:59
Evaluación y calificación de ofertas OASA	02/09/2024	02/09/2024
Organismo de la Buena Pro SEACE	02/09/2024 08:30	02/09/2024

Entidad Contratante

N° RUC

Entidad Contratante

20496021692

GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Acuerdos

El procedimiento

Descripción del Objeto:

CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO: EMP. PE-24 A (PARATUSHALI), CAPIRO, RIO VENADO, HUAHUARI, HIPOKI, EMP. PE-SS (BOCA CHENI), DISTRITOS DE SATIPO, RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Acuerdo de Libre Comercio Perú-EFTA

Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón

Acuerdo de Libre Comercio Perú-Panamá

Acuerdo de Libre Comercio Perú - Unión Europea

Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica

Acuerdo de Alianza del Pacifico Perú -Colombia y Chile

S/ 199,240,436.48

UBICACIÓN

:

RIO NEGRO SATIPO

BENEFICIARIOS SITUACIÓN ACTUAL

:

762 HA CONVOCADO

PERSPECTIVAS A DIC 2024

:

EMPEZAR CON LA EJECUCIÓN DE OBRA

ESTADO: EN CONVOCATORIA

MODALIDAD: CONTRATA

CONSEJO REGIONAL DE JUNÍN

CONSEJO REGIONAL

- ❖ **RAFAEL ANDERSON GONZALES URETA**
- ❖ **KELY FLORES MAS**
- ❖ **LUCERO BEATRIZ HUAMANCAJA CASTILLO**
- ❖ **NORMA LIDIA VALDIVIA GUTIERREZ**
- ❖ **MARIA MARTINA MALDONADO DORIA**
- ❖ **HERNAN ROBERT ROJAS DE LA CRUZ**
- ❖ **LUIS FERNANDO MORALES NIEVA**
- ❖ **LUIS DEMETRIO BASALDUA RODRIGUEZ**
- ❖ **MARITZA LOPEZ CRISTINA**
- ❖ **MARIBEL EDITH VALENCIA MEJIA**
- ❖ **ISMAEL NICODEMUS ROBLES CORTEZ**
- ❖ **YONER AMBICHO AQUINO**
- ❖ **YONI ANGEL BALBIN PEÑA**



ORDENANZAS REGIONALES APROBADAS

A SEPTIEMBRE 2024



1. **OR** que conforma el “Grupo Técnico Regional de Cambio Climático”,
Ordenanza Regional N°394-2024-GRJ/CR.
2. **OR** que aprueba el Inicio del Proceso de Formulación del Plan de
Desarrollo Regional Concertado-PDRC del Departamento de Junín,
con un Horizonte al 2035“
Ordenanza Regional N°395-2024-GRJ/CR.
3. **OR** que Promueve la Incorporación del Enfoque Intercultural; el Uso,
Preservación, Desarrollo, Recuperación, Fomento y Difusión de las
Lenguas Indígenas u Originarias, así como la Promoción de la Diversidad
Cultural para la Prevención y Sanción del Racismo, la Discriminación
Étnico-Racial y la Promoción de Derechos del Pueblo Afroperuano en
la Región Junín“ - **Ordenanza Regional N°399-2024-GRJ/CR**

ACUERDOS REGIONALES APROBADAS

A SEPTIEMBRE 2024



1. Acuerdo Regional N°008.1-2024-GRJ/CR - ACUERDA:

ARTÍCULO UNICO: Conformar la Comisión Especial, para proponer un anteproyecto de Ordenanza para que aprueben y reconozcan oficialmente la Estructura Orgánica del “Comité Multisectorial de la Nueva Carretera Central Daniel Alcides Carrión”

2. Acuerdo Regional N°017-2024-GRJ/CR - ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO: CONFORMAR una Comisión Mixta, para pronunciarse sobre el Informe N°01-2024-GRJ/GR que propone la asignación del presupuestal para la ejecución de Fondo Concursable PROCOMPITE REGIONAL 2024.

3. Acuerdo Regional N°225-2024-GRJ/CR - ACUERDA:

ARTÍCULO PRIMERO. – AUTORIZAR la TRANSFERENCIA FINANCIERA en la modalidad de FINANCIAMIENTO a la municipalidad de Tarma por el monto de S/. 1,845,392.01 soles para el proyecto de pistas y veredas

FUNCIÓN FISCALIZADORA

18 Informes finales de fiscalización.

1

En vías de comunicación, hospitales, instituciones educativas, puentes, etc.

2

En atribución de la Ley N°31812, la Directiva N°015-2022-CG/ PREVI, y otros

El Consejo Regional cuenta con un equipo multidisciplinario para brindar asesoría a los consejeros, conformado por los siguientes profesionales:

01. Coordinador.

02. Ingenieros civiles.

01. Asesor legal.

01. Especialista en contrataciones con el estado.

01. Comunicador social.

01. Asistente.



GRACIAS

