

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO
TERRITORIAL

SUB GERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y
PLANEAMIENTO



MEMORIA ANUAL

2023

Huancayo, febrero 2024

INDICE

RESUMEN.....	8
PRESENTACIÓN	9
I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA	10
II. BASE LEGAL	11
III. ESTRUCTURA ORGÁNICA.....	13
IV. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL	14
V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	14
EJE SOCIAL – OER 1: DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD.....	18
1.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL.....	18
a. Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades	18
b. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo.....	21
c. Lugar de la Memoria Yalpana Wasi – Wiñay Yalpananpa	24
EJE SOCIAL - OER 2: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES	25
d. Dirección Regional de Salud (DIRESA)	25
e. Dirección Regional de Educación Junín (DREJ).....	56
f. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento	79
g. Dirección Regional de Archivo	84
EJE INSTITUCIONAL – OER 3: ESTADO MODERNO Y GOBERNABILIDAD.....	89
1.2 CONSEJO REGIONAL.....	89
a. Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional	89
1.3 GOBERNACIÓN / VICE GOBERNACIÓN.....	92
a. Secretaría General	92
1.4 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO	94
1.5 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL	101
1.6 GERENCIA GENERAL REGIONAL	102
a. Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres	102
1.7 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.....	104

a.	Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento (SGCTP)	104
b.	Sub Gerencia de Inversión Pública (OPMI)	112
c.	Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial (SGAT)	115
1.8	OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (ORDITI)	117
1.9	OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	120
a.	Dirección Regional de Administración y Finanzas	120
b.	Oficina de Administración Financiera (OAF)	121
c.	Oficina de Recursos Humanos	127
d.	Oficina de Gestión Patrimonial	128
EJE ECONÓMICO – OER 4: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON ALTO EMPLEO		
		132
1.10	GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO	132
a.	Sub Gerencia de Promoción de Inversiones	132
b.	Dirección Regional de Agricultura (DRAJ)	134
c.	Dirección Regional de Comercio exterior y Turismo (DIRCETUR)	146
d.	Dirección Regional de Energía y Minas	156
e.	Dirección Regional de Producción (DIREPRO)	157
EJE INFRAESTRUCTURA – OER 5: DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA		
		160
1.11	GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI)	160
a.	Sub Gerencia de Estudios	160
Proyectos en ejecución – convocatoria		171
a.	Sub Gerencia de Obras	178
b.	Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones	187
c.	Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones	214
1.12	SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO	217
1.13	SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO	221
1.14	SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI	228
1.15	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN	229
1.16	SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA	233
EJE AMBIENTAL - OER 6: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE		237
1.17	GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL	237

a.	Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental	237
I.	PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS CON EJECUCIÓN MULTIANUAL.....	249
II.	EVALUACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS	259
	Anexo N° 03 – A: Método de análisis horizontal y análisis vertical.....	259
	Anexo N° 03 – B: Ef-2 Estado de gestión	260
	Anexo N° 03 – B: Ef-2 Estado de gestión	261
	Anexo N° 03 – B: Ef-2 Estado de gestión	262
III.	ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	263
	Anexo N° 04 – A: Presupuesto público del pliego por genérica de gasto por toda fuente de financiamiento	263
	Anexo N° 04 – B: Ingresos y gastos por fuente de financiamiento	264
	ANEXO N° 04 – C: Presupuesto público del pliego por unidad ejecutora por toda fuente de financiamiento	265
	ANEXO N° 04 – D: Presupuesto público del pliego por función por toda fuente de financiamiento	266
	REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA.....	268

GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

CONSEJO REGIONAL

Nombres y Apellidos	Cargo
KELY FLORES MAS	Consejera Regional de Huancayo
LUCERO BEATRIZ HUAMANCAJA CASTILLO	Consejera Regional de Huancayo
NORMA LIDIA VALDIVIA GUTIÉRREZ	Consejera Regional de Huancayo
MARÍA MARTINA MALDONADO DORIA	Consejera Regional de Concepción
ISMAEL NICODEM ROBLES CORTEZ	Consejero Regional de Chanchamayo
YONER AMBICHO AQUINO	Consejero Regional de Chanchamayo
ALEJANDRO BARRERA ARIAS	Consejero Regional de Jauja
RAFAEL ANDERSON GONZALES URETA	Pdte. del Consejo Regional y Consejero Regional de Junín
MARITZA LÓPEZ CRISTINA	Consejera Regional de Satipo
MARIBEL EDITH VALENCIA MEJIA	Consejera Regional de Satipo
LUIS FERNANDO MORALES NIEVA	Consejero Regional de Tarma
LUIS DEMETRIO BASALDUA RODRIGUEZ	Consejero Regional de Yauli
YONI ÁNGEL BALBIN PEÑA	Consejero Regional de Chupaca
ABG. ROGELIO ANÍBAL ESPINOZA ESPÍRITU	Secretario Técnico

AUTORIDADES

GOBERNACIÓN REGIONAL	
Mg. ZÓSIMO CÁRDENAS MUJE	Gobernador Regional Junín
Sra. MILAGROS MARISEL INCHE ARIAS	Vice Gobernadora Regional Junín

FUNCIONARIOS

GERENTES Y DIRECTORES REGIONALES	
ECON. ROY TOMAS GONZALES MAYTA	Gerente General Regional
GUILLERMO TOMÁS URIBE CÓRDOBA	Jefe del Órgano de Control Institucional
ABOG. EDGARD VIDAL HINOSTROZA	Procurador Público Regional
ABOG. LUIS CÓRDOVA MORALES	Director Regional de Asesoría Jurídica
ABG. ENA MILAGROS BONILLA PÉREZ	Secretaria General
BACH. ARTURO ZAPATA MEJICO	Director Regional de Comunicaciones (e)
LIC. PERCY DAVID TIZA FÉLIX	Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial
ING. EDWIN ERNESTO RAMÓN QUISPE	Director Regional de Desarrollo Institucional y Tecnología de la Información.
ING. MIGUEL ANGEL RIVERA PORRAS	Gerente Regional de Desarrollo Económico
LIC. LISETT RUIZ RIVERA	Gerente Regional de Desarrollo Social
ING. RONY PAOLO VEJARANO PÉREZ	Gerente Regional de Infraestructura
ECON. WALTER LÓPEZ ROSALES	Gerente Regional de Recursos Naturales y Gestión del Medio Ambiente
CPC MARIALENA LIZ, QUISPE SALAS	Directora Regional de Administración y Finanzas
ECON. ANTONIA BRÍGIDA VEGA TERREL	Sub Gerente de Cooperación Técnica y Planeamiento
DIRECTORES REGIONALES SECTORIALES	
MAG. OMAR LUIS TOVALINO CORDOVA	Director Regional de Educación
MC. CHRISTIAN DANY MATOMOROS VERA	Director Regional de Salud
ING. EDUARDO ANTONIO TINTAYA FLORES	Director Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento
ABOG. DIANA ROXANA CONDE MONTOYA	Director Regional de Trabajo y Promoción del Empleo
ING. RONALD G. MARIÑO OBREGON	Director Regional de Agricultura
ANTROP. JOSÉ LUIS ALVAREZ RAMOS	Director Regional de Comercio Exterior y Turismo
ING. RODOLFO ROLANDO CANO ANDRADE	Director Regional de Energía y Minas
ING. ADOLFO JAIME ORTIZ ZUASNABAR	Director Regional de Producción

ABOG. VICTOR ASECIO VALDEZ GONZALES

**Director Regional de Transportes y
Comunicaciones**

LIC. ELVIRO LUIS CALDERÓN YACHACHI

Directora de Archivo Regional

EQUIPO TÉCNICO DE TRABAJO – SEDE CENTRAL

MAG. PERCY DAVID TIZA FELIX

**Gerente Regional de Planeamiento, Presupuesto
y Acondicionamiento Territorial**

ECON. ANTONIA BRIGIDA VEGA TERREL

**Sub Gerente de Cooperación Técnica y
Planeamiento**

ING. ROSA CAMBORDA MARAVI

Profesional 5

ECON. HÉCTOR PARIONA ARAUCO

Especialista en Planeamiento

RESUMEN

La Memoria Anual 2023 del Gobierno Regional de Junín, pone a disposición información sobre las principales actividades y proyectos ejecutados, así como, los principales logros y dificultades de la entidad durante un año fiscal; así mismo, considera la evaluación de los estados financieros y el correspondiente análisis de la programación y ejecución presupuestal, acorde a su estructura orgánica. En consecuencia, permitirá una mejor rendición de cuentas ante la ciudadanía, así como permitirá una mejor planificación de las actividades futuras de la entidad.

PRESENTACIÓN

En el marco de la Ley N° 27867 - Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias, donde establece en el artículo 21°, inciso “n” que, el Gobernador Regional tiene la atribución siguiente: “Presentar la Memoria y el Informe de los Estados Presupuestarios y Financieros del Gobierno Regional al Consejo Regional”; en ese contexto considerando dicha responsabilidad, el Gobierno Regional de Junín, presenta la **MEMORIA ANUAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2023**, con el objetivo de informar y destacar los principales bienes y servicios públicos entregados a la ciudadanía en el ámbito del departamento de Junín.

La Memoria Anual de Gestión 2023 del Gobierno Regional de Junín, es un documento elaborado bajo un esquema ordenando y sintetizado, que presenta de forma precisa y detallada, las líneas de acción dentro de las cuales se han enmarcado los proyectos, acciones y programas presupuestales ejecutados, considerando los Objetivos y Acciones Estratégicas del Plan Estratégico Institucional (PEI) para el periodo 2021 – 2026 entre otros aspectos relevantes a nivel de la Entidad, como las principales actividades y proyectos ejecutados; así como, los principales logros y dificultades, la evaluación de los estados financieros y el correspondiente análisis de la programación y ejecución presupuestal.

Así mismo, es importante resaltar el trabajo y resultados que se detallan en el presente documento, los cuales están sustentados en los informes técnicos de los Centros de Costo, Unidades Orgánicas, Unidades Ejecutoras, Direcciones Regionales Sectoriales, Gerencias y Oficinas Regionales, quienes de manera encadenada han sistematizado y organizado la información solicitada conforme al Instructivo oportunamente comunicado y difundido.

Bajo dichos términos, ponemos a consideración de las autoridades, funcionarios y ciudadanía en general, la Memoria Anual 2023 del Gobierno Regional Junín para que pueda merecer su valoración y comentarios pertinentes.

Mag. Zósimo Cárdenas Muje
Gobernador Región Junín
2023 - 2026

I. BREVE RESEÑA HISTÓRICA

Con la modificación del Capítulo XIV del Título IV de la Constitución Política del Perú, se dispone la creación de los Gobiernos Regionales, iniciando así la política de descentralización de la estructura del estado. Esta política que tiene como objetivo fundamental, el desarrollo integral del país, se da con la Ley N° 27680 del 07 de marzo del 2002, luego con la Ley de bases de la Descentralización Ley N° 27783 del 20 de julio de 2002, se regula la estructura de organización del estado en forma democrática, descentralizada y desconcentrada, correspondiente al Gobierno Nacional, Gobierno Regional y Gobierno Local, y con la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales Ley N° 27867 del 18 de noviembre de 2002, se establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales, siendo así que el Gobierno Regional de Junín se instala desde el 1° de enero del 2003.

Sin embargo, hasta el año 2002 el Gobierno Regional de Junín, como institución del estado ha pasado por diferentes etapas o momentos en función de las coyunturas políticas por las que atravesó el país; es así que desde la década de los 70 se crean los Organismos de Desarrollo Departamental, Corporaciones de Desarrollo Departamental, Concejos Transitorios de Administración Regional.

A fines de la década de los años 80, hubo un nuevo intento de descentralizar nuestro País, dicho proceso pocos años después de haberse iniciado fue desactivado, posteriormente por Decreto Ley N° 25432, se disuelven las Asambleas Regionales y Consejos Regionales, constituyéndose los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR). Con la Ley N° 26922 del 03 de febrero de 1998, que deroga la Ley N° 25432, se crean los Consejos Transitorios de Administración Regional en cada uno de los departamentos del país., naciendo así el Consejo Transitorio de Administración Regional Junín (CTAR Junín), sobre el cual se crea el Gobierno Regional de Junín.

II. BASE LEGAL


a. BASE LEGAL

- Constitución Política del Perú y sus modificatorias. Artículos 43°, 192° y 195°
- Ley N° 27783, Ley de Bases de la Descentralización y sus modificatorias. Artículos 17°, 18°, 20° y 35°
- Ley N° 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales y sus modificatorias. Artículos 11°, 13°, 15° y 21°.
- Ley N° 27658, Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado.
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado y sus modificatorias.
- Decreto Legislativo N° 1088, Ley del Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico y del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico. Artículo 10°
- Decreto Supremo N° 103-2022-PCM que aprueba la Política Nacional de Modernización de la Gestión Pública al 2030, 21 agosto 2022.
- Ordenanza Regional N° 193 – 2014 – GRJ / CR, aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050 (con metas al 2021 y 2030)
- Decreto Supremo N° 044-2018-PCM, que aprueba el Plan Nacional de Integridad y Lucha contra la Corrupción 2018-2021.
- Decreto Legislativo N° 1412, que aprueba la Ley de Gobierno Digital.
- Decreto Supremo N° 095-2022-PCM, aprueba el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050, presentado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN).
- Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, y su Reglamento D.S 008-2005 PCM.
- Ley N° 29338, Ley de Recursos Hídricos y su Reglamento aprobado mediante Decreto Supremo N° 001-2010-AG.
- Ley N° 2861 Ley General del Ambiente
- Política Nacional del Ambiente al 2030
- Ley N° 26834, Ley de Áreas Naturales Protegidas, artículo 11°.
- Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales, Ley N° 26821
- Ordenanza Regional N° 194-2014-GRJ/CR, que aprueba los Instrumentos de Gestión Ambiental Política, Plan de Acción y Agenda Ambiental Regional.

DOMICILIO FISCAL

- **Gobierno Regional del Departamento de Junín**
- **Domicilio Fiscal:** Jr. Loreto N° 363
- **Departamento:** Junín
- **Provincia:** Huancayo
- **Distrito:** Huancayo

III. ESTRUCTURA ORGÁNICA

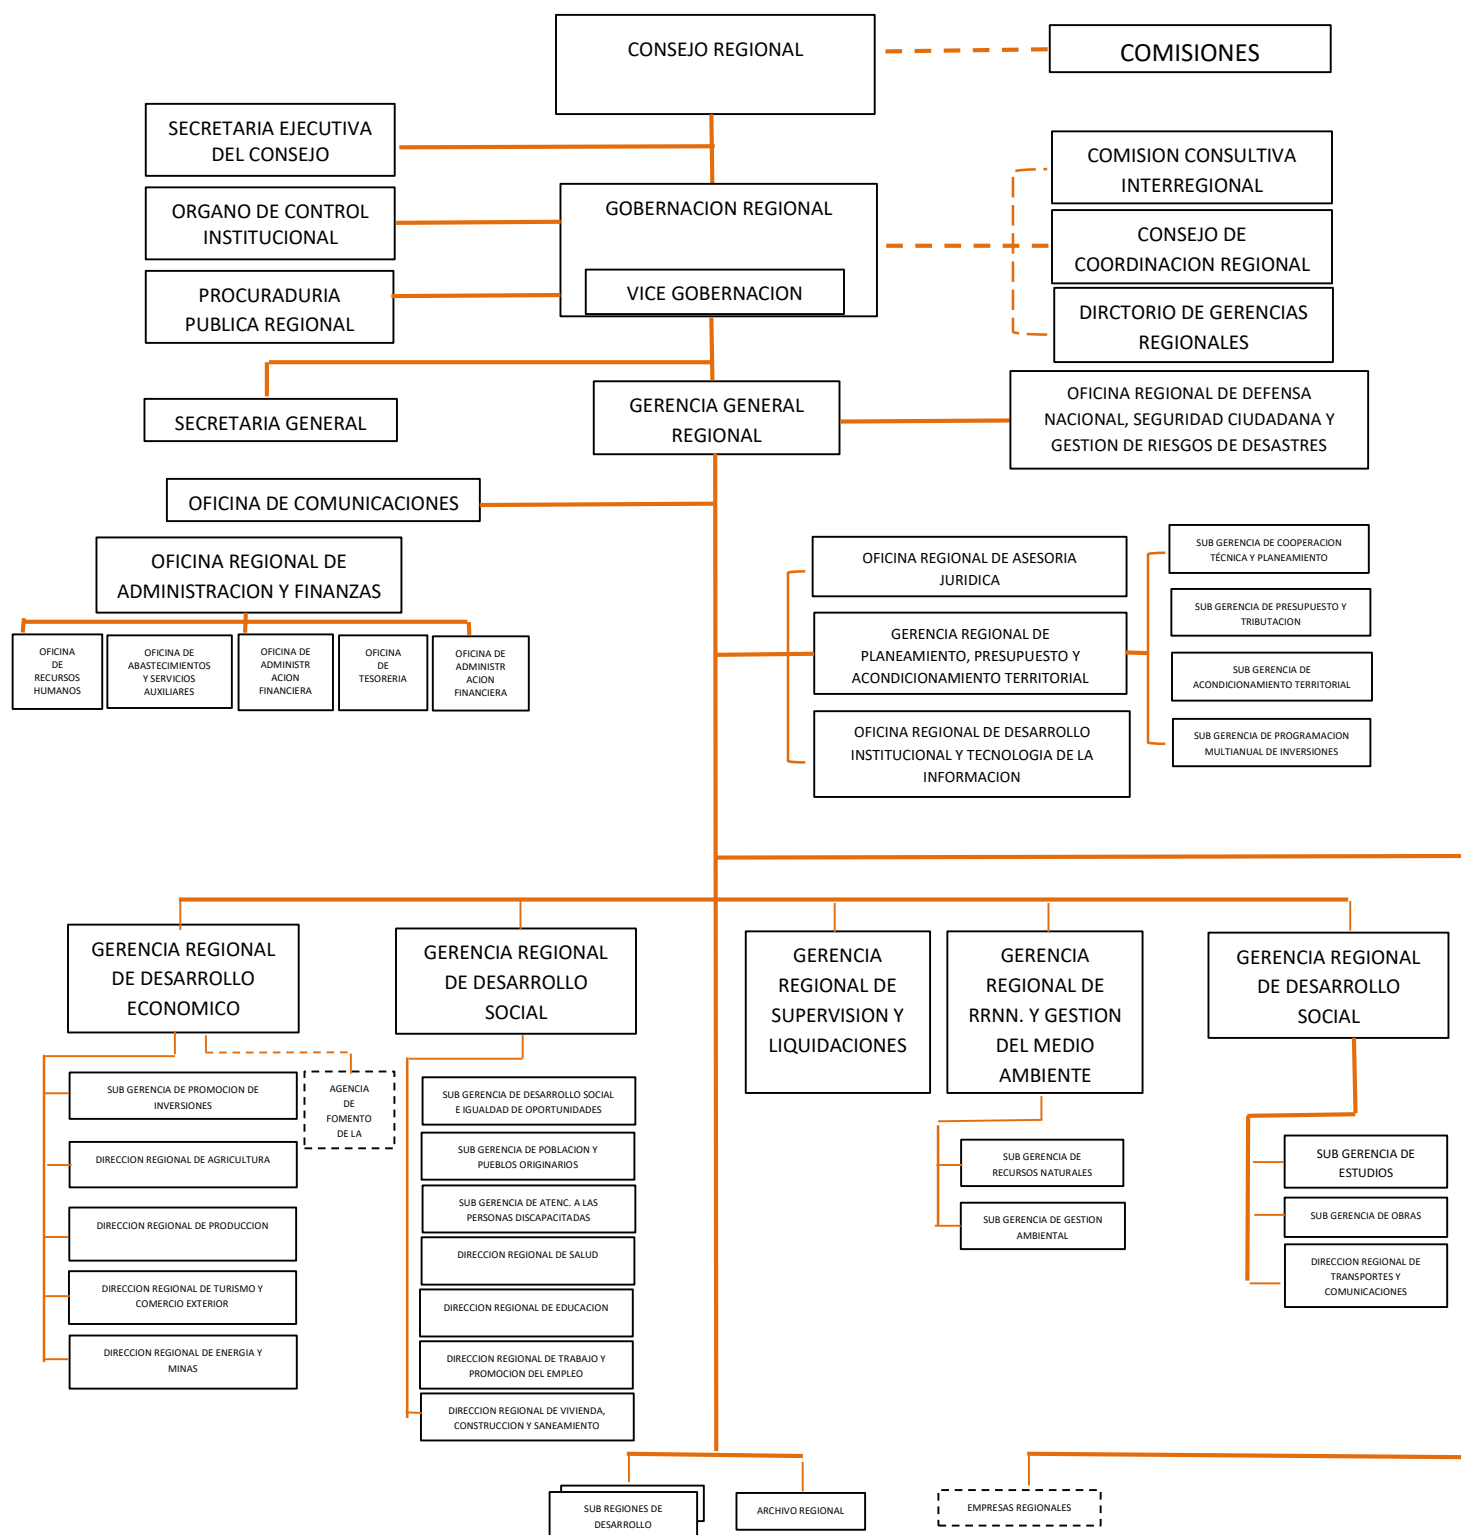

Fuente: Portal de Transparencia - Gobierno Regional de Junín, 2024.

Elaborado: GRPPAT/SGCTP y Equipo Técnico.

IV. MISIÓN Y VISIÓN INSTITUCIONAL

a. MISIÓN INSTITUCIONAL¹

“Promover y Conducir el Desarrollo Integral y Sostenible de la Región Junín; con una Gestión Transparente, con competitividad, con Enfoque de Cambio Climático y Gestión de Riesgos, Derechos e Igualdad de Oportunidad en el Marco de la Modernización del Estado.”

b. VISIÓN INSTITUCIONAL²

“Junín al 2030 integrado, moderno, transparente y ordenado, tiene alto nivel de desarrollo humano, ciudadanos emprendedores y exitosos, con acceso pleno a servicios básicos y especializados de calidad, crecimiento económico, industrializado y aprovechamiento sostenible de la biodiversidad y ecosistemas; vigoriza el proceso de grandes cambios y lidera la región centro”

V. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

a. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	
OEI.01 INCREMENTAR LOS NIVELES DE CALIDAD EDUCATIVA Y EQUITAD EN LOS ESTUDIANTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:3)	
AEI.01.01	DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE DE CALIDAD CON ENFASIS EN LOS ESTUDIANTES CON BAJOS LOGROS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR (Prioridad:3)
AEI.01.02	ACCESO AL SERVICIO DE LA EDUCACION BASICA PERTINENTE DE CALIDAD DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES, JOVENES Y ADULTOS (Prioridad:3)
AEI.01.03	ACCESO A LOS SERVICIOS EDUCATIVOS PUBLICOS PERTINENTES DE CALIDAD A LA POBLACION DE EDUCACIÓN BASICA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:3)
AEI.01.04	SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA Y TÉCNICO PRODUCTIVA IMPLEMENTADA EN BENEFICIO DE LOS NIÑOS, NIÑAS, ADOLESCENTES Y JÓVENES CON DISCAPACIDAD DE 0 A 29 AÑOS (Prioridad:3)
AEI.01.05	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA EN CONDICIONES ADECUADAS EN BENEFICIO DE LOS ESTUDIANTES (Prioridad:3)
AEI.01.06	OFERTA EDUCATIVA PERTINENTE DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN SUPERIOR NO UNIVERSITARIA TECNOLÓGICA Y ACORDE AL SECTOR PRODUCTIVO (Prioridad:3)

¹ Resolución Ejecutiva Regional N° 227 – 2023 – GR – JUNÍN / GR, aprueba el Plan Estratégico Institucional - Ampliado al 2026 del Gobierno Regional Junín.

² Ordenanza Regional N° 193-2014-GRI/CR, aprueba el Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050 (con metas al 2021 y 2030) - Pág. 75.

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	
OEI.02 MEJORAR LA CALIDAD DE ATENCION DE SALUD EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:1)	
AEI.02.01	ATENCION INTEGRAL EN SALUD MATERNO NEONATA (Prioridad:1)
AEI.02.02	ATENCION INTEGRAL PARA REDUCIR LA ANEMIA INFANTIL EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:1)
AEI.02.03	ATENCION INTEGRAL EN TBC, VIH/SIDA, HEPATITIS Y LA SÍFILIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:1)
AEI.02.04	ATENCION INTEGRAL EN LAS ENFERMEDADES METAXÉNICAS Y ZOONOSIS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:1)
AEI.02.05	ATENCION PREVENTIVA EN ENFERMEDADES NO TRANSMISIBLES EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:1)
AEI.02.06	ATENCION PREVENTIVA Y PROMOCIONAL PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORBIMORTALIDAD POR CÁNCER EN LA POBLACION FEMENINA (Prioridad:1)
AEI.02.07	ATENCION OPORTUNA PARA LA DISMINUCIÓN DE LA MORTALIDAD POR EMERGENCIAS Y URGENCIAS MÉDICAS EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:1)
AEI.02.08	ATENCION INTEGRAL PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (Prioridad:1)
AEI.02.09	ATENCION PREVENTIVA Y CONTROL EN ENFERMEDADES DE SALUD MENTAL EN BENEFICIO DE LA POBLACION (Prioridad:1)
AEI.02.10	ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD EN BENEFICIO DE LA POBLACION EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:1)
OEI.03 MEJORAR LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS BÁSICOS Y HABITACIONALES DE LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:8)	
AEI.03.01	SISTEMAS DE AGUA Y SANEAMIENTO, MANTENIDOS E INTERVENIDOS OPORTUNAMENTE PARA LA PRESTACION DE SERVICIOS EN LOS GOBIERNOS LOCALES Y OPERADORES EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:8)
AEI.03.02	PROGRAMAS HABITACIONALES PROMOVIDAS CON INFORMACION DE LOS DIFERENTES BENEFICIARIOS PARA LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:8)
AEI.03.03	SERVICIO DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA PARA AMPLIAR LA COBERTURA DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN LAS VIVIENDAS DE LA ZONA RURAL DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:8)
OEI.04 PROMOVER EL DESARROLLO SOCIAL E IGUALDAD DE OPORTUNIDADES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:5)	
AEI.04.01	SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA LA PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE SUS DERECHOS EN NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:5)
AEI.04.02	SERVICIO DE PREVENCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR, SEXUAL Y DE GÉNERO, INTEGRAL OPORTUNA Y PERTINENTE PARA LAS MUJERES (Prioridad:5)
AEI.04.03	SERVICIOS DE PARTICIPACIÓN Y FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE SUS CAPACIDADES EN LA POBLACIÓN ADULTA MAYOR DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:5)
AEI.04.04	SERVICIOS DE FORTALECIMIENTO, RECONOCIMIENTO, EXPOSICION HISTORICA Y ATENCIÓN INTEGRAL, DE LAS AFECTACIONES QUE PADECIERON POR LA VIOLENCIA POLITICA EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNIN (Prioridad:5)
AEI.04.05	SERVICIO DE FORTALECIMIENTO Y ATENCIÓN INTEGRAL A LAS CAPACIDADES DE LAS PCD Y A LOS RESPONSABLES MUNICIPALES CON ATENCIÓN A PCD (Prioridad:5)
OEI.05 IMPULSAR EL TRABAJO DECENTE CON ACCESO A LOS DERECHOS LABORALES; PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE CADA CIUDADANO EN EDAD DE TRABAJAR EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:2)	
AEI.05.01	INCORPORACIÓN EN EL MERCADO LABORAL SUPERVISANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS DERECHOS LABORALES DE LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:2)
AEI.05.02	INSERCIÓN LABORAL ADECUADA Y MONITOREADA PARA LOS JÓVENES EN EDAD DE TRABAJAR DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:2)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	
AEI.05.03	CERTIFICACIÓN OFICIAL DE COMPETENCIAS LABORALES PARA MEJORAR LA EMPLEABILIDAD OPORTUNAMENTE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:2)
OEI.06 MEJORAR LAS CONDICIONES DE ACCESO Y PUESTA EN USO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA CIUDADANÍA DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:13)	
AEI.06.01	INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS ACTUALIZADOS PARA EL CONTROL, ACCESO Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:13)
AEI.06.02	INNOVACIÓN TECNOLÓGICA PARA LA PRESENTACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE LOS FONDOS DOCUMENTALES PARA LA POBLACIÓN (Prioridad:13)
OEI.07 MEJORAR LA COMPETITIVIDAD DE LAS UNIDADES ECONÓMICAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:4)	
AEI.07.01	SERVICIOS DE PROMOCIÓN DE EVENTOS EMPRESARIALES DE NIVEL REGIONAL; NACIONAL E INTERNACIONAL; DE MANERA FOCALIZADA PARA LAS UNIDADES ECONÓMICAS (Prioridad:4)
AEI.07.02	SERVICIOS DE INTERNACIONALIZACIÓN DE LA EMPRESA Y DIVERSIFICACIÓN DE MERCADOS PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR (Prioridad:4)
AEI.07.03	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE DIVERSIFICADA COMPETITIVA Y SOSTENIBLE PARA UNIDADES ECONÓMICAS DEL SECTOR EXPORTADOR (Prioridad:4)
AEI.07.04	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA TURÍSTICA COMPETITIVA PARA AGENTES DE DESTINO TURÍSTICO (Prioridad:4)
AEI.07.05	SERVICIOS DE PROMOCIÓN INTERNA PARA DESTINOS TURÍSTICOS PRIORIZADOS EN EL DEPARTAMENTO (Prioridad:4)
AEI.07.06	SERVICIOS DE DESARROLLO DE LA OFERTA ARTESANAL COMPETITIVA PARA PRODUCTORES ARTESANALES (Prioridad:4)
AEI.07.07	SERVICIOS DE PROMOCIÓN COMERCIAL DE LA OFERTA ARTESANAL PRIORIZADA PARA PRODUCTORES ARTESANALES (Prioridad:4)
AEI.07.08	FORMACION DE ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES CON FINES COMERCIALES; INTEGRAL DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES. (Prioridad:4)
AEI.07.09	SERVICIOS DE INFORMACION AGRARIA ADECUADOS PARA PRODUCTORES AGROPECUARIOS (Prioridad:4)
AEI.07.10	PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA OPORTUNA EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES AGRARIOS (Prioridad:4)
AEI.07.11	SANEAMIENTO FISICO LEGAL DE PREDIOS RURALES A FAVOR DE LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES (Prioridad:4)
AEI.07.12	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA DE MANERA INTEGRAL PARA CONDUCTORES Y TRABAJADORES DE EMPRESAS (Prioridad:4)
AEI.07.13	SERVICIOS DE ARTICULACIÓN EMPRESARIAL Y ACCESO A MERCADOS DE MANERA FOCALIZADA PARA EMPRESAS (Prioridad:4)
AEI.07.14	SERVICIOS DE FOMENTO DE LAS INVERSIONES Y EL ORDENAMIENTO DE LA ACUICULTURA DE MANERA INTEGRAL PARA ACUICULTORES (Prioridad:4)
AEI.07.15	SERVICIO DE INNOVACIÓN Y DESARROLLO ACUÍCOLA DE MANERA INTEGRAL PARA LOS ACUICULTORES (Prioridad:4)
AEI.07.16	SERVICIO DE FORMALIZACIÓN MINERA INTEGRAL A PEQUEÑOS MINEROS Y MINEROS ARTESANALES DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:4)
OEI.08 REDUCIR EL TIEMPO E INSEGURIDAD VIAL EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:6)	
AEI.08.01	RED VIAL DEPARTAMENTAL EN BUEN ESTADO EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:6)
AEI.08.02	SERVICIO DE SENSIBILIZACIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD VIAL A USUARIOS DE VÍAS (Prioridad:6)
OEI.09 MEJORAR LA GESTIÓN SOSTENIBLE DEL APROVECHAMIENTO DE LOS ECOSISTEMAS; SERVICIOS ECOSISTÉMICOS Y BIODIVERSIDAD EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:12)	
AEI.09.01	ECOSISTEMAS CONSERVADOS; RECUPERADOS EN COMUNIDADES CAMPESINAS Y NATIVAS (ERDB) (Prioridad:12)

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES (OEI) Y ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES (AEI)	
AEI.09.02	CONSERVACIÓN DEL ECOSISTEMA HÍDRICO; DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y PAISAJE EFICIENTE EN EL ÁREA DE CONSERVACIÓN REGIONAL DE HUAYTAPALLANA (Prioridad:12)
AEI.09.03	ACOMPANIAMIENTO TÉCNICO INTEGRADO EN LA ADAPTACIÓN; MITIGACION Y RESPUESTA ANTE EFECTOS DE CAMBIO CLIMATICO DE LA POBLACION VULNERABLE (Prioridad:12)
OEI.10 MEJORAR LA GESTIÓN DE LA CALIDAD AMBIENTAL EN LA POBLACION DEL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:11)	
AEI.10.01	SISTEMA REGIONAL DE GESTIÓN AMBIENTAL FORTALECIDO E IMPLEMENTADO PARA EL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:11)
OEI.11 FORTALECER LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:10)	
AEI.11.01	SERVICIOS ANTICIPADOS PARA LA REDUCCION DE RIEGOS DE DESASTRES EN LA POBLACION VULNERABLE (Prioridad:10)
AEI.11.02	ASISTENCIA OPORTUNA A LA POBLACIÓN DAMNIFICADA POR DESASTRES Y SERVICIOS PÚBLICOS AFECTADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:10)
AEI.11.03	MONITOREO ACTUALIZADO DE EMERGENCIAS OCURRIDAS Y PELIGROS IDENTIFICADOS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:10)
AEI.11.04	ASISTENCIA ADECUADA A LA POBLACIÓN AFECTADA Y VULNERABLE POR BAJAS TEMPERATURAS EN EL DEPARTAMENTO JUNÍN (Prioridad:10)
AEI.11.05	FORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE BRIGADAS DE PRIMERA RESPUESTA DE MANERA OPORTUNA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:10)
AEI.11.06	PREPARAR A LA POBLACIÓN VULNERABLE A PELIGROS POR FENÓMENOS NATURALES PARA SU EVACUACIÓN POR EMERGENCIA EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN (Prioridad:10)
AEI.11.07	ASISTENCIA Y ADMINISTRACION FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON KITS A PEQUEÑOS AGRICULTORES (Prioridad:10)
OEI.12 FORTALECER LA GESTIÓN PÚBLICA INSTITUCIONAL EN EL DEPARTAMENTO JUNIN (Prioridad:7)	
AEI.12.01	SERVICIOS DIGITALES IMPLEMENTADOS PARA LOS SERVIDORES Y CIUDADANOS DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (Prioridad:7)
AEI.12.02	INSTRUMENTOS DE GESTIÓN Y NORMAS INTERNAS ACTUALIZADOS EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (Prioridad:7)
AEI.12.03	GESTIÓN DE LAS INVERSIONES QUE GARANTICEN LA MEJORA DE LOS SERVICIOS DE MANERA EFICIENTE DEL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (Prioridad:7)
AEI.12.04	CAPACIDADES FORTALECIDAS DEL PERSONAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN (Prioridad:7)
AEI.12.05	ACCIONES DE CONTROL IMPLEMENTADAS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNIN (Prioridad:7)
AEI.12.06	DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS GESTIONADOS OPORTUNAMENTE EN EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN (Prioridad:7)
OEI.13 MEJORAR LA COBERTURA DE INFRAESTRUCTURA BÁSICA (EDUCACIÓN; SALUD; TRANSPORTE) PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN (Prioridad:9)	
AEI.13.01	INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA ADECUADA PARA LOS HABITANTES DEL DEPARTAMENTO JUNIN (Prioridad:9)
AEI.13.02	INFRAESTRUCTURA DE SALUD QUE BRINDE ADECUADOS SERVICIOS DE ATENCIÓN BÁSICA Y ESPECIALIZADA A LA POBLACIÓN DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN (Prioridad:9)
AEI.13.03	INFRAESTRUCTURA VIAL ADECUADA PARA LOS HABITANTES DE LA REGION JUNIN (Prioridad:9)

Fuente: Plan Estratégico Institucional - Ampliado al 2026 del Gobierno Regional Junín.

Elaborado: GRPPAT / SGCTP – 2024.

VI. PRINCIPALES ACTIVIDADES/PROYECTOS EJECUTADOS; LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS DURANTE EL AÑO FISCAL 2023 (*Unidades Ejecutoras, Oficinas Regionales, Direcciones Regionales y Oficinas de Desarrollo Regionales*)

EJE SOCIAL – OER 1: DERECHOS HUMANOS Y DIGNIDAD

1.1 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

a. Sub Gerencia de Desarrollo Social e Igualdad de Oportunidades

Cuadro N° 01: *Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023*

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Otros: Social	AOI00081800227	CONSEJO CONSULTIVO DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES		Consiste en brindar información a la ciudadanía, en torno a la problemática de los jóvenes, a través, de lo anterior, lograr la participación activa de los jóvenes; así mismo, propiciar el compromiso de las autoridades competentes.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo		Niños y Niñas	S/ 7,765.00	S/ 5,065.00	65.0%	66.0%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró, por gestión de la Gerencia y Sub Gerencia, la articulación con instituciones superiores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Educación entre otros.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

- Presupuesto limitado que para dar continuidad a las actividades que se planifican en el año para cada uno de los Ejes (Niños, Adultos mayores, Juventud, Plan integral de reparaciones, Sensibilización y erradicación del trabajo Infantil, Trata de personas, Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Insuficiente presupuesto para la movilidad, Breaks, asistencia técnica y supervisión de las actividades que realizamos. Ya que es un trabajo articulado con los Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación entre otros. Como también con los Municipios Distritales, Provinciales de nuestra Región Junín.

Fuente: GRDS, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRDS y Equipo Técnico.

Cuadro N° 02: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	CAPACITACION DE ORGANIZACIONES JUVENILES	AOI00081800278	EJE JOVENES Y VOLUNTARIADO III TERCER ENCUESTRO REGIONAL DE JUVENTUDES JUNÍN , ELECCIONES DEL COREJU		Informar a la ciudadanía y facilitar la participación activa de los jóvenes para generar conocimiento además de propiciar el compromiso de las autoridades para establecer acciones conjuntas y mejorar las oportunidades de los jóvenes que representan a los diversos estamentos poblacionales. se dieron las elecciones del secretario regional y miembros del pleno del COREJU Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		Jóvenes	S/ 11,065.00	S/ 10,865.00	98 %	80 %
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						

• Para todas las actividades que realizamos nos apoyamos en los proveedores nos dan crédito y podemos hacer las actividades que nuestros Jefes inmediatos nos solicitan realizar. • Esto se da en casos, materiales de oficina, papelería, Breaks, Alquiler de carpas, alquiler de sillas, alquiler de escenarios, Alquiler de equipos de sonido, compra de recordatorios, entre otros. • Otra de las oportunidades que podemos encontrar es que por gestión de nuestros Gerenta y Sub Gerenta nos articulamos con instituciones superiores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, EL Ministerio de Educación entre otros.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)
• Presupuesto limitado que para dar continuidad a las actividades que se planifican en el año para cada uno de los Ejes (Niños, Adultos mayores, Juventud, Plan integral de reparaciones, sensibilización y erradicación del trabajo Infantil, Trata de personas, Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar. • Insuficiente presupuesto para la movilidad, Breaks, asistencia técnica y supervisión de las actividades que realizamos. Ya que es un trabajo articulado con los Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación entre otros. Como también con los Municipios Distritales , Provinciales de nuestra Región Junín

Fuente: GRDS, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRDS y Equipo Técnico.

Cuadro N° 03: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
4	SEGUIMIENTO Y MONITOREO A LA INSTANCIA REGIONAL PARA LA PREVENCIÓN, SANCION, ERRADICACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR	AOI00081800866	EJE CONSEJO REGIONAL LEY 30364 PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y LOS INTEGRANTES DEL GRUPO FAMILIAR		Informar a la ciudadanía, en torno la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar para difundir a través de los medios de comunicación, para facilitar la participación activa de los actores sociales involucrados. Esta actividad de trascendencia sirve para generar acciones concretas para que la población se sienta más segura en su ámbito territorial.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		Mujeres	S/ 14,000.00	S/ 10,823.00	77 %	100 %



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Para todas las actividades que realizamos nos apoyamos en los proveedores nos dan crédito y podemos hacer las actividades que nuestros Jefes inmediatos nos solicitan realizar.
- Esto se da en casos, materiales de oficina, papelería, Breaks, Alquiler de carpas, alquiler de sillas, alquiler de escenarios, Alquiler de equipos de sonido, compra de recordatorios, entre otros.
- Otra de las oportunidades que podemos encontrar es que por gestión de nuestros Gerenta y Sub Gerenta nos articulamos con instituciones superiores como el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, EL Ministerio de Educación entre otros.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Presupuesto limitado que para dar continuidad a las actividades que se planifican en el año para cada uno de los Ejes (Niños, Adultos mayores, Juventud, Plan integral de reparaciones, Sensibilización y erradicación del trabajo Infantil, Trata de personas, Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
- Insuficiente presupuesto para la movilidad, Breaks, asistencia técnica y supervisión de las actividades que realizamos. Ya que es un trabajo articulado con los Ministerios de Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, Ministerio de Educación entre otros. Como también con los Municipios Distritales, Provinciales de nuestra Región Junín

Fuente: GRDS, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRDS y Equipo Técnico.

b. Dirección Regional de Trabajo y Promoción del Empleo

Cuadro N° 04: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Trabajo	----	Actividades en materia de laboral y promoción del empleo	Prevención y solución de conflictos laborales a nivel individual y colectivo en el marco de la normativa laboral y patrocinio judicial gratuito a trabajadores y extrabajadores; y promoción del empleo y capacitación laboral, priorizando a la población vulnerable

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincias de la Región Junín	15,789 personas	2,827,727.00	2,600,307.00	91.96%	87.97%



25AGO2023 provincia de Tarma – Feria de Orientación Vocacional en la



12OCT2023 provincia de Huancayo – Feria de Empleo donde se ofertó vacantes de trabajo



Absolución de una consulta laboral y cálculo de liquidación de beneficios sociales



Capacitación técnica ocupacional en los Talleres de Formación Profesional Huancayo – Inició: abril de 2023 – culminó:

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- 5,715 Personas atendidas en la absolución de consultas laborales, liquidación de beneficios sociales, conciliación administrativa y patrocinio jurídico gratuito; el impacto de estas actividades se refleja en que los trabajadores y empleadores con mejor conocimiento de la normatividad laboral y mejor asesorados propiciaran la disminución de los conflictos laborales y solución de los mismos a través de la conciliación sin los costos elevados de los procesos judiciales y resguardar la indefensión de la parte trabajadora que siempre es la más débil de la relación laboral.

- 322 jóvenes con capacitación técnica en las especialidades de electricidad industrial, carpintería, computación e informática, industrias alimentarias y mecánica automotriz; éstos jóvenes capacitados tendrán la oportunidad de insertarse laboralmente, ya sea con el autoempleo o en una empresa que requiera técnicos en las especialidades citadas.
- 5,479 personas intermediadas para su inserción laboral con los servicios de Bolsa de Trabajo, Acercamiento Empresarial, Asesoramiento para la Búsqueda del Empleo – ABE y Certificado Único Laboral – CUL.
- 4,263 estudiantes atendidos con el Servicio de Orientación Vocacional e Información Ocupacional – SOVIO, se les dio a conocer las ofertas educativas; éstos estudiantes del 4to y 5to año de secundaria de diversos colegios de nuestra región, conocieron las carreras técnicas y universitarias que ofrecen las instituciones educativas, consecuentemente, podrán elegir la que mejor crean conveniente para su futuro profesional.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Presupuesto asignado exiguo para atender los requerimientos de bienes y servicios necesarios para el normal funcionamiento institucional, los recursos fuente de la fuente de financiamiento Recursos Ordinarios sólo alcanza para el pago de planilla del personal y pago de los principales servicios básicos. Los recursos de la fuente de financiamiento Recursos Directamente Recaudados están sujetos a la recaudación de ingresos por concepto de tasas laborales y multas por infracciones laborales, éstos recursos permitieron en parte afrontar algunas necesidades.
- De acuerdo a la estructura orgánica para atender en la Sede Regional Huancayo, Zonas de Trabajo de La Oroya, Tarma, San Ramón y Satipo, la DRTPE necesita 80 servidores, sin embargo, sólo se tiene 56 servidores (entre nombrados, CAS y reincorporados).

Ambos problemas fueron resueltos con recursos transferidos con Resolución de Superintendencia N° 17-2023-SUNAFIL en el mes de abril del 2023 por la Superintendencia de Fiscalización Laboral en el marco del Artículo 7° del Decreto Supremo N° 002-2017-TR, en la fuente de financiamiento Donaciones y Transferencias, éstos recursos permitieron atender los requerimientos de bienes y servicios, así como resolver el déficit de personal, con la contratación de locadores de servicios para labores específicas.

Fuente: GRDS, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRDS y Equipo Técnico.

c. Lugar de la Memoria Yalpana Wasi – Wiñay Yalpananpa

Cuadro N° 05: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	LUGAR DE LA MEMORIA "YALPANA WASI"		FORTALECER LAS VISITAS GUIADAS Y TALLERES DINAMICOS CON LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, UNIVERSIDADES, CAMPAÑAS DE DIFUSIÓN Y SENCIBILIZACIÓN.	Esta actividad corresponde a de las actividades del lugar de la memoria "YALPANA WASI", con el fin de la población en general: como instituciones públicas, privadas y desplazados de al ARDDCP. Comprende los procesos requeridos para disponer de recursos humanos, bienes y servicios y otros necesarios para la realización de las actividades. La actividad también considera el desarrollo de diversas acciones orientadas a de la coordinación con las instituciones públicas, privadas y la ARDCP para promover la cultura.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo Departamento de Junín		5903 visitantes	133,775.00	126,837.79	94.81	100.00
 ACTIVIDAD: Taller de lectura "LEYENDO ENTRE AMIGOS" en la biblioteca lugar de la memoria "YALPANA WASI" LUGAR Y FECHA: Museo Lugar del distrito de Chilca- Huancayo – Junín. 05 de diciembre del año 2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró 5903 visitas del público en general para el cumplimiento de la ejecución física del lugar de la memoria "YALPANA WASI", en el tema administrativo se logró gestionar, informar, decepcionar y remitir los documentos de gestión en los tiempos oportunos para su optimo avance financiero de ello se obtuvo un 94.81 %.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
La principal dificultad fue en el área de Abastecimiento se demoran en generar las ordenes de servicios y de compras lo cual retrasa lo programado.						

Fuente: GRDS, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRDS y Equipo Técnico.

EJE SOCIAL - OER 2: ACCESO A SERVICIOS BÁSICOS Y ESPECIALIZACIÓN PARA EL DESARROLLO DE CAPACIDADES

d. Dirección Regional de Salud (DIRESA)

i. Dirección Regional de Salud Junín

Cuadro N° 06: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		Suplementación de hierro en Niños que inician los 4 meses de edad		Consiste en suplementar con sulfato ferroso (gotas) y/o polimaltosado. (gotas) a los niños de	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincias de Huancayo, Concepción, Junín, Chanchamayo, Satipo, Jauja, Junín, Tarma, Yauli, Chupaca del departamento de Junín		19 458 niños de 4 meses de edad de la región Junín	S/4 429 662	S/4 189 885	94.5%	88.3%
  Actividad de suplementación preventiva a niño de 4 meses realizada en el establecimiento de salud de Chilca, se realiza de manera diaria en la atención de CRED o Nutrición.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Quinto lugar a nivel nacional en el cumplimiento del indicador Porcentaje de niños de 4 meses de edad que inician suplementación de hierro.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Débil compromiso de los gobiernos locales en la implementación de obras en saneamiento básico (agua potable, desagüe) para disminuir los casos de parasitosis y por ende la anemia infantil. - Problemas en el padrón nominal, niños que son asignados por Ubigeo a pesar que nunca residieron dentro de la región Junín. - Errores en el registro HIS para el término de la suplementación de los niños de 4 meses. - Falta de Registro HIS de termino de administración debido a que los niños suplementados se encuentran en otra región, y el personal de salud de otras regiones no quieren realizar la atención de suplementación.						

Cuadro N° 07: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		Cobertura de tratamiento antirretroviral -estrategia de prevención y control de ITS, VIH/SIDA Y HEPATITS		La estrategia de prevención y control de ITS, VIH/SIDA, tiene como objetivo reducir la incidencia de casos de VIH	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Junín ,9 provincias y 125 distritos		Se trabajó con la población adolescente joven	16,339,721	16,300,421	99.7%	99%
 PANEL FOTOGRAFICO: Ubicación: Región Junín Provincia: Huancayo, Jauja, Tarma, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo, San Martín de Pangoa Distrito: la Merced Implementado: En todos los hospitales de las 9 provincias de la región Junín						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se implementó un módulo de atención para centro TAR en el C.S. Mazamari y así garantizar la atención de calidad y calidez de PVVS. - Descentralización de tratamiento antirretroviral en el primer nivel de atención –Red de salud Valle del Mantaro (C.S. Chilca, C.S. Justicia Paz y Vida), red de salud Chanchamayo (C.S. Perene) - Para el 2023 se implementó las brigadas móviles urbanas las cuales realizan tamizaje en VIH, SIFILIS, HEPATITIS, consejería a población clave - Se realizó la descentralización de centros TAR en hospitales en las provincias de Pichanaki, San Martín de Pangoa y Mazamari para evitar abandono del tratamiento. - Se disminuyó la transmisión de VIH, mediante los tamizajes con pruebas rápidas ofertadas por el personal de salud a la población clave. - A la fecha se cuenta con 05 unidades médicas de atención periódica (UAMP)Y 01 Centro de referencia de ITS (CERITS) los que brindan atención en infecciones de transmisión sexual y tratamiento antirretroviral.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Consultorio de ITS, VIH/SIDA y hepatitis son compartidos con otras estrategias - Cambio constante de coordinadora de las redes de salud - Brecha de recurso humano. - Profesionales de la salud capacitados (facilitadores) fueron rotados a otras áreas.						

Cuadro N° 08: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad (D)		
1	SALUD		Mujer tamizada en prevención de cáncer de cuello uterino	La estrategia de prevención y control de Cáncer, tiene como objetivo reducir la morbimortalidad por todo tipo de Cáncer a través del fortalecimiento de acciones prevención secundaria, para ello implementa 31 productos a nivel de todas las ejecutoras. Como DIRESA JUNIN desarrollamos el producto de acciones comunes que nos permite abordar el desarrollo de capacidades, competencias del recurso humano a través de las capacitaciones de acuerdo a la norma vigente.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Junín ,9 provincias y 125 distritos		mujeres de 25 a 64 años teniendo un avance de 44,091	19,169,642	18,362,309	96%	85%



Fecha. Ubicación: Región Junín
Provincia: Huancayo
Distrito: El Tambo
Implementado: Brigadas móviles urbanas para los tamizajes con Papanicolaou(PAP), Inspección visual de ácido acético(IVAA), pruebas moleculares (VPH), tamizajes de colon y recto
Beneficiarios: Población de la provincia de Huancayo, Distrito El Tambo

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
✓	Se logró implementar el laboratorio referencial de pruebas moleculares de VPH en el H.R.M.T. Dr. Cesar Demarini Caro
✓	Capacitación de personal de salud del I nivel de atención como Tomadores de VPH
✓	Implementación con insumos y equipos (antígeno prostático específico total método automatizado) para las IPRESS del I nivel de atención C. S. La Libertad
✓	Se logró fortalecer al personal de salud obstetra como facilitadores regionales
✓	Capacitación a promotores de salud en factores de riesgo en factores de cáncer.
✓	Brigadas móviles urbanas las cuales realizan los tamizajes de VPH, tamizaje de colon y recto de manera gratuita a la población objetivo.
✓	Se aprobó la Creación e implementación del Registro de Cáncer de Base Poblacional (RCBP) en la Región Junín con la Ordenanza Regional N° 384-2023-GRJ/CR.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
✓	Demora en la entrega de insumos para cumplir con los tamizajes de cáncer de colon y recto y PSA.
✓	Presupuesto asignado por D.S. en específicas restringidas.

Cuadro N° 09: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad (D)	
1	SALUD		Programa presupuestal 131 control y prevención en salud mental		El PP 131 Busca abordar los problemas psicosociales y trastorno mentales y del comportamiento que afecta a la población de nuestro región desde la detección oportuna hasta su recuperación.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
9 provincias de la región Junín		102,622	S/ 24,576.720	S/ 23,776.417	98.11%	81 %

Ubicación: Región Junín

Provincia: Huancayo

Distrito: Comas

Aperturado: 20 De Noviembre Del 2023

% Avance Físico: Csmc Implementado

% Avance Financiero: Ds 108-2023-Ef

Beneficiarios:

Población De La Provincia De Huancayo,
Distrito De Comas Y Aledaños.



Ubicación: Region Junín

Provincia: Satipo

Aperturado: 21 De Diciembre Del 2023

% Avance Físico: Ushm Implementado

% Avance Financiero: Ds 108-2023-Ef

Beneficiarios:

Población De La Provincia De Satipo Y Distritos Aledaños.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se implementó un Centro de Salud Mental Comunitario en el distrito de Comas - Concepción
- ✓ Se implementó la Unidad de Hospitalización de Salud Mental – Satipo
- ✓ Se incrementó las atenciones en salud mental por apertura de los centros comunitarios.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Demora en los procesos logísticos para la adquisición de los bienes para la implementación de los servicios comunitarios.

ii. Red de Salud del Valle del Mantaro

Cuadro N° 10: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
2	SALUD	----	ATENCION DEL PARTO NORMAL; PARTO NORMAL:	Atención que se brinda a toda las gestante programada para su atención de parto de nuestros establecimientos de salud I-4,I-3,I-2 y I-1.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)

DEPARTAMENTO DE JUNIN, PROVINCIA HUANCAYO Y CONCEPCION	8044	2,073,501	2,061,820.03	99.44 %	100
 					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
✓ Se realizó la compra de camas y camillas para las IPRESS I-4, así como para las IPRESS de mayor necesidad. ✓ Dotación de alimentos a todas las gestantes en internamiento, parto y puerperio, hasta el 15 /11/2023. ✓ Se sensibilizo a la madre y familia para culminar el parto institucional, tal como se evidencia en coberturas de parto. ✓ Se realice la capacitación con los agentes comunitarios de los lugares alejados; donde se produjo las muertes maternas, perinatal y partos domiciliarios, realizando un pacto para las atenciones de parto institucional con interculturalidad.					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
✓ Personal obstetra con licencia por edad, maternidad, morbilidad, otros; hasta la fecha no hay solución de dichos personales. ✓ Solo se brinda atención de los casos presentados, de acuerdo a nuestra capacidad resolutive; SERUMS manifiestan que no pueden atender partos, requieren de capacitaciones continuas. ✓ Migración de población gestante a sus lugares de origen, negatividad de atención de parto por no tener una buena atención, o por demandar demasiado tiempo en espera. ✓ Brecha de recursos humanos en las zonas alejadas para la continuidad de la atención a nuestras gestantes; se presenta requerimiento de personal en salud que a la fecha no hay respuesta.					

Cuadro N° 11: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Salud,		3033256 "NIÑO CON SUPLEMENTO DE HIERRO Y VITAMINA A"		Niño con suplemento de hierro y vitamina "A" es aquel niño que de acuerdo a su edad ³ ha recibido suplemento de hierro y/o fortificación casera (Multimicronutriente) y Vitamina "A", según esquema vigente, con el objetivo de mantener niveles adecuados en su organismo y prevenir anemia por deficiencia de hierro y vitamina "A", mejorando su inmunidad y favoreciendo su crecimiento.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)

			S/ (H)		
PROVINCIA HUANCAYO – CONCEPCION	8717	2,559,118	2,511,393.00	98.14%	100%
  C.S SANTA ROSA DE OCOPA 20 /10/2023 C.S PUCARA 16 /09/2023					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
✓ Se logró suplementar al 100% la población programada de menores de 36 meses; ya que son 6 entregas consecutivas para lograr el indicador. ✓ Se logró realizar un trabajo articulado con las áreas externas e internas para el logro de este indicador trazador. ✓ Se realizaron llamadas de adherencia en los menores de 36 meses en forma presencial; además de generar un mayor seguimiento en los niños.					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
✓ Se ha tenido dificultades para el seguimiento de los niños en la visita domiciliaria; ya que no se cuenta con personal para la actividad y el problema del registro; por lo no se ha cumplido con la meta programada. ✓ En lo que respecta a suplementación con vitamina A se ha tenido al inicio del semestre falta de insumo y en el segundo semestre se ha generado el abastecimiento; lo que ha generado fallas en el registro lo que ha ocasionado una sobreestimación en el cumplimiento.					

Cuadro N° 12: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Salud	-	5000027 ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS		Es asegurar la atención y tratamiento de casos de Infecciones Respiratorias Agudas, para prevenir las complicaciones y las muertes infantiles por IRAS.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	%Ejecución física 2023 (J)

34 distritos de la Provincia de Huancayo y Concepción, Departamento de Junín	260 Centros Poblados	S/ 2,301,005	S/. 2,300,999.18	100.00 %	92%
 Actividad: ATENDER A NIÑOS CON INFECCIONES RESPIRATORIAS AGUDAS. Foto: Niño captado en consulta CRED que es derivado para atender a niños con infecciones respiratorias agudas. Lugar: IPRESS LA LIBERTAD. Fecha: Mayo/2023					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
Cumplimiento de meta POI 2023.					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
Incremento de casos de IRA a nivel regional, por temporada de lluvias y friaje.					

iii. Hospital Regional Docente Clínico Quirúrgico Daniel Alcides Carrión

Cuadro N° 13: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Salud	-----	5006012 DIAGNOSTICO DEL CÁNCER DE CUELLO UTERINO		Es la atención que se les brinda a las mujeres con diagnostico presuntivo de Cáncer de Cuello Uterino, con el propósito de establecer un diagnóstico definitivo, determinar el estadio clínico del Cáncer e iniciar el tratamiento respectivo.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		24 personas diagnosticada	2,321,194	2,283,693.10	98.00	100.00

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.
En hojas de anexos con los detalles de cada panel.



Consejería y atención en consultorio externo de oncología a usuaria que se le realizó una colposcopia 12/07/2023



Procesamiento de Muestras de Papanicolaou de la campaña realizada en el Cuartel 9 de diciembre el



Consejería en prevención del cáncer de cuello uterino a usuarias del HRDCQDAC 26/03/23



Consejería en prevención del cáncer de cuello uterino a usuarias asistentes a campaña en el Instituto de Educación Superior Tecnológico Andrés Avelino

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Al contar con solo 2 Obstetrices se logró alcanzar las expectativas planificadas con campañas durante el año 2023.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Debería tener mínimo 4 Lic. En obstetricia para mayor logros y la población este atendida en su totalidad.

Cuadro N° 14: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Salud	-----	INTERVENCIONES QUIRURGICAS	Se realiza las intervenciones quirúrgicas de las 8 especialidades como cirugía general, otorrinolaringología, cabeza y cuello, traumatología, neurocirugía, cirugía plástica, urología, tórax y cardiovascular y oftalmología.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		5,400 pacientes quirúrgicos	5,709,287.00	5,709,202.57	99.99	96.27

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.		
		
Plan de desembalse de Cirugías Ambulatorias	Cirugía de Tórax Cardiovascular	Cirugía Plástica
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)		
✓ En el año 2023, se continuó con el plan de desembalse con el cual se logró, disminuir en 89% la grande lista de espera de pacientes en las diferentes especialidades. ✓ Se implementó el servicio de terapia del dolor en consultorios externos, se logró incluir en el REFCON, y con ello atender a los pacientes referidos de los centros de salud. ✓ Reincorporación de médicos anestesiólogos para cumplir con las metas de atención.		
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)		
✓ Suspensión de cirugías por diversos motivos entre las más dadas tenemos (tiempo prolongado de la intervención anterior, hipertensión arterial, falta de personal de Rayos X). ✓ Falta de Mantenimiento de equipos Biomédicos. ✓ Falta de Plan de Mantenimiento Preventivo y Correctivo por parte de la Oficina de Ingeniería Biomédica. ✓ Factores de riesgo en quirófano donde se utiliza en quipo en arco en C, expuesto a rayos x en intervenciones quirúrgicas de traumatología y neurocirugía. ✓ Falta de presupuesto y reducción del mismo para reemplazar el instrumental y/o equipo dado de baja. ✓ Inoperatividad de autoclaves del Servicio de Central de Esterilización.		

iv. Hospital Regional Docente Materno Infantil El Carmen

Cuadro N° 15: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		ATENCIÓN DEL PARTO COMPLICADO QUIRÚRGICO		Es la atención del Parto que, por complicación propia del embarazo y trabajo de parto, culmina en cesárea o histerectomía. En esta actividad se alcanzó 2480 cesáreas, debido a que somos un hospital referencial que brinda atención a la región y macroregión.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)

Provincia Huancayo Departamento de Junín	2480 Cesáreas	S/1,509,520	S/1,509,518.38	100%	100%
					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
- Se logró brindar atención oportuna a todas las gestantes que acudieron al hospital para culminación de gestación. - Se adquirió equipo de anestesia que contribuye a la atención de calidad de todas las gestantes. - Se adquirió monitores multiparámetros que garantiza el monitoreo estricto.					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
- Infraestructura reducida para ampliar sala de operaciones. - Brecha de recurso humano en especial médicos especialistas. - Presupuesto limitado.					

Cuadro N° 16: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		TRATAMIENTO ESPECIALIZADO DE RECIÉN NACIDO CON RETINOPATÍA DE LA PREMATURIDAD CON LASER MÁS ANGIOGENICOS		Acto quirúrgico dirigido a resolver los casos de Retinopatía de la Prematuridad con indicación de tratamiento láser y antiangiogénicos, es realizado por el médico oftalmólogo capacitado en tratamiento láser para ROP y tratamiento con antiangiogénicos (tratamiento de primera elección dentro de las primeras 48 horas de confirmación diagnóstica), de acuerdo a la normatividad vigente. Se realiza en los establecimientos de salud del 3er nivel de atención.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen"		5 RECIEN NACIDOS	S/3,240.00	S/3,239.36	100%	40%

		
Tratamiento de ROP con Laser Diodo (Sala de Operaciones) Año 2023 (Se adquirió dicho equipo en Julio)		
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)		
- Se implementó el tratamiento de los neonates con ROP - Disminuye las referencias a la Ciudad de Lima para Tratamiento del ROP - Se cuenta con médico Especialista en Retina		
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)		
Falta de prioridad en la programación sala, para dicho procedimiento.		

Cuadro N° 17: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		MANEJO DE EMERGENCIA O URGENCIA HIPERTENSIVA		Conjunto de actividades orientadas al diagnóstico, tratamiento y control de personas con enfermedad hipertensiva y alteraciones metabólicas (dislipidemias), en establecimientos de salud que cuentan con médico, incluye el manejo de complicaciones y multimorbilidad, así como la valoración de riesgo cardiovascular y organización de actividades educativas para las personas. Comprende acciones para el manejo de la emergencia o urgencia hipertensiva.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Hospital Regional Docente Materno Infantil "El Carmen"		30 PACIENTES	S/3,099.00	S/3,098.70	100%	70%

	
Manejo de paciente Hipertensos	
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
- Se cuenta con un médico especialista (Cardiologo) - Se trata a todos los pacientes con problemas de hipertension (Gestantes , niños y mujeres)	
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
Ser un hospital especializado materno neonatal, lo que dificulta la atención de otras patologías, los pacientes acuden con problemas ginecológicos.	

Cuadro N° 18: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad (D)	
1	SALUD		APOYO ALIMENTARIO PARA GRUPOS EN RIESGO		Consiste en brindar alimentación a los pacientes hospitalizados, personal de salud de guardia y familiares de pacientes que viven en zonas alejadas. Esta actividad busca mantener o mejorar el estado nutricional de los pacientes y ayudar en la recuperación de su salud, disminuyendo su estancia hospitalaria.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
HRDMI EL CARMEN PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN		271,190.00 raciones	S/ 2,611,484	S/2,602,861.01	100.00%	95.00%

 Suministro de alimentación a gestante del Servicio de Alto Riesgo Obstétrico I	 Suministro de alimentación a paciente del Servicio de Pediatría
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
✓ Se brindó alimentación a los pacientes hospitalizados, según indicación médica y cumpliendo los horarios establecidos. ✓ Se calculó el aporte calórico promedio de las preparaciones brindada a los pacientes. ✓ Se mejoró las opciones brindadas como alimentación complementaria a los niños de 6 a 12 meses. ✓ Se mejoró el aporte proteico en la alimentación brindada en desayuno y cena. ✓ Se realizó una encuesta de satisfacción para el personal de salud.	
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
✓ Falta de profesionales en Nutrición responsables del área de Producción y Hospitalización, para una planificación, supervisión y monitoreo nutricional adecuados. ✓ Falta de Manual de Buenas Prácticas de Manipulación y Manual de Procedimientos. ✓ Espacio único y reducido para el Área de Repostería. ✓ Comedor para el personal de salud de espacio reducido. ✓ Falta de coches térmicos para la distribución de las preparaciones. ✓ Falta de presupuesto para el mantenimiento o renovación de cocina industrial y coches para distribución de alimentos, con más de 10 años de antigüedad.	

Cuadro N° 19: *Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023*

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		BRINDAR UNA ADECUADA DISPENSACION DE MEDICAMENTOS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS		Gestionar el oportuno abastecimiento, manteniendo la disponibilidad adecuada de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios para garantizar una adecuada atención a los usuarios, monitorizando la accesibilidad a medicamentos esenciales por parte de la población, especialmente de aquellas de escasos recursos económicos y el “uso racional del medicamento”.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)

HRDMI EL CARMEN PROVINCIA HUANCAYO DEPARTAMENTO JUNIN	623,617 RECETAS	S/ 4,174,290	S/4,111,621.94	98.5%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.  AREA DE SALA DE VENTAS  AREA DE DOSIS UNITARIA					

v. Red de Salud Chupaca

Cuadro N° 20: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		5005585: SEGURIDAD FÍSICO-FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS		El mantenimiento de la infraestructura de los establecimientos de Salud	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca – Departamento de JUNÍN		4362 habitantes	21,580.00	18,874.00	99.98%	100%
						

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
- De la meta física programada 01 se logra intervenir a 03 Establecimientos optimizando los recursos financieros. - Se logra la continuidad de los servicios de salud. - se logra ejecutar el 99.98% de presupuesto asignado.	
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
- No se cuenta con profesionales como Arquitecto o Ing. Civil. Para el estudio de riesgo estructural de los establecimientos de salud. - No se cuenta con Unidad Móvil para realizar seguimiento y Monitoreo de las actividades. - Escasa asignación presupuestal que no cubre las necesidades de Mantenimiento de los establecimientos.	

Cuadro N° 21: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		PP104 3000685 DESPACHO DE LA UNIDAD MOVIL Y COORDINACION DE LA REFERENCIA / PP104 3000685 5005140 COORDINACION Y SEGUIMIENTO DE LA REFERENCIA		La actividad consiste en realizar la coordinación y/o seguimiento de la referencia para la atención del paciente que se encuentra en situación de emergencia y/o urgencia.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca – Departamento de JUNÍN		990 BENEFICIARIOS	1,957,302	1,953,594	99.8%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO

FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS REFERENCIAS, A NIVEL DE IPRESS DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CHUPACA, POR ENDE, SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE ATENCION DEL PACIENTE



FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES AL PERSONAL DE SALUD RESPONSABLE DE GARANTIZAR EL SEGUIMIENTO DE LAS REFERENCIAS, A NIVEL DE IPRESS DENTRO DE LA JURISDICCION DE LA UNIDAD EJECUTORA SALUD CHUPACA, POR ENDE, SE GARANTIZA LA CONTINUIDAD DE ATENCION DEL PACIENTE



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Fortalecimiento de capacidades del recurso humano, para mejorar el seguimiento de la referencia.
- Coberturar la meta física al 100%, indicativo del seguimiento oportuno de las referencias.
- Garantizar los circuitos cerrados, por la mejora del seguimiento de las referencias..

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Brecha de recurso humano en IPRESS I-4 (mayor capacidad resolutive en la UESCH), para garantizar la atención de las 24 horas, para seguimiento de referencias.
- Inyección de presupuesto en específica 23, siendo la necesidad contar con presupuesto en la genérica 26, para fortalecer los ambientes, para dar continuidad al seguimiento.

vi. Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del Centro (IREN-Centro)

Cuadro N° 22: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Salud		CIRUGÍAS REALIZADAS DE LOS CANCERES MAS FRECUENTES EN EL INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS		El departamento de cirugía especializada brindamos un servicio sub especializado de atención integral a los pacientes oncológicos de los diversos tipos de Cánceres, formando parte importante del manejo multidisciplinario en este tipo de pacientes.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Concepción Departamento de Junín		1063 pacientes tratados quirúrgicamente de la microrregión	5,955,013	2,819,577	47.35%	100%



Estadística anual 20

Gastrectomía distal laparoscópica




Estadía de cáncer de ovario gigante en el servicio de Ginecología

TOTAL DE CIRUGÍAS	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE	ACUMULADO
NEUROCIRUGÍA	5	7	4	4	6	3	67
UROLOGÍA	15	8	17	16	10	11	148
MAMAS	14	19	11	15	17	15	187
GINECOLOGÍA	14	18	14	21	16	19	198
CABEZA Y CUELLO	10	14	20	18	19	15	212
ABDOMEN	15	22	22	23	18	23	250
TORAX Y CV	0	0	0	1	0	0	1
TOTAL	73	88	88	98	86	86	1063

23 de cirugías de los diferentes tipos de Cánceres

vii. Red de Salud Concepción

Cuadro N° 23: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

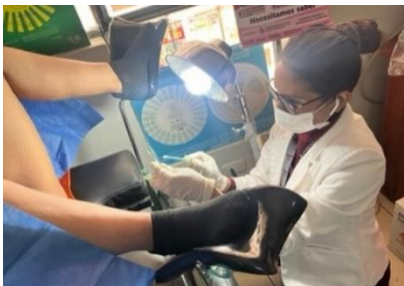N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		0024 300004 5006002 TAMIZAJE CON PAPANICOLAOU PARA DETECCIÓN DE CÁNCER DE CUELLO UTERINO		La citología convencional de cuello uterino o PAP se brinda a las mujeres de 25 a 64 años aparentemente para realizar una evaluación clínica junto a la colección de muestra con un Citocepillo del exocervix.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincias de Chupaca, Huancayo y Concepción – Departamento de JUNÍN		3011 mujeres tamizadas	95,904	94,781	98.8%	100%
CAMPAÑAS DE DETECCIÓN TEMPRANA DE CUELLO UTERINO.						
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
• Cobertura del indicador al 64 %. • Campañas de Despistaje de Cáncer de Cuello Uterino en todas las Microredes • Convenio con Instituto Regional de Enfermedades Neoplásicas del IREN Centro para campaña de atención integral con respecto al descarte de cáncer de cuello uterino • Contar con el servicio de Lectura de láminas, para la entrega oportuna de resultados • Detección de 25 usuarias con lesiones precancerosas las cuales fueron referidas a IPRESS de mayor capacidad resolutive.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
• Demora en la entrega de resultados de papanicolaou. • Cambio de personal encargado de la estrategia de prevención y control del cáncer en las micro redes. • Falta de recursos humanos en la IPRESS Pedro Sánchez Meza. • Población reacia para el tamizaje de papanicolaou. • Compromiso de todo el equipo de salud para cumplimiento del indicador.						

Cuadro N° 24: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		Niños con CRED completo según edad		Conjunto de actividades periódicas según edad y paquete integral de atención en la atención de niños menores de 36 meses desarrolladas por el profesional de enfermería, con el objetivo de evaluar el crecimiento y desarrollo e identificar precozmente signos de alarma y/o patologías.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Concepción – Departamento de JUNÍN		2023 niños con CRED completo para su edad.	1,227,018	1,199,225.08	97.73%	63%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
• Primer lugar en indicador niñas y niños menores de 12 meses de edad del departamento, que cuentan con controles CRED según edad. • Niños con controles completos. • Detección temprana de displasia de cadera y trastornos de desarrollo. • Niños suplementados según edad. • Niños recibieron visita domiciliaria en adherencia de suplementación. • 100% Personal de salud de las 39 IPRES capacitado en control de crecimiento y desarrollo con enfoque de desarrollo infantil temprano. • 100% Personal de salud de las 39 IPRES capacitado en consejería en lactancia materna. • 100% Personal de salud de las 39 IPRES capacitado en detección temprana de cáncer infantil. • Se realizó mantenimiento preventivo de las balanzas pediátricas con el objetivo de garantizar una adecuada antropometría.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
• Recién nacidos prematuros y/o bajo peso al nacer hospitalizados • Migración constante a otras regiones • Niños que cuentan con doble seguro/SIS-ESSALUD. • Asignación de niños por ubigeo. • Padres reacios a realizar el control de crecimiento y desarrollo. • Personal de salud nuevo.						

viii. Red de Salud Jauja

Cuadro N° 25: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		5000059 BRINDAR INFORMACION SOBRE SALUD SEXUAL, SALUD REPRODUCTIVA Y METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR		Cumplir actividades de comunicación y difusión de mensajes a la población sobre salud sexual reproductiva, maternidad saludable, controles prenatales, signos de alarma y el acceso a los métodos de planificación familiar	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Jauja y Yauli-La Oroya, Departamento de Junín.		13226 personas	S/.3000.00	S/.3000.00	100%	100%
Campañas informativas sobre la maternidad saludable segura y voluntaria. 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Las intervenciones de comunicación fueron cumplidas en un 100%, por parte del área de Comunicación. - Las metas financieras se tiene un cumplimiento del 100%. - El presupuesto asignado a publicidad ayudó en algo la difusión de mensajes.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Aún es poco el presupuesto asignado para publicidad y poder coberturar dos provincias: Jauja y Yauli-La Oroya. - La mayoría de los medios de comunicación nos facilitan entrevistas siempre en cuando cuentan con publicidad. - Falta de apoyo de los gobiernos locales para el apoyo en la difusión mediante otros medios de comunicación alternativos.						

Cuadro N° 26: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCION (A)	N° CUI (SOLO PROYECTOS) (B)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (C)		BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (D)	
1	SALUD		5000058 ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO		Contribuir al desarrollo integral de la salud y el bienestar de la población y ciudadanía, desarrollo positivo, género, diversidad, interculturalidad, inclusión social, curso de vida y enfoque integral, orientadas hacia la prevención de riesgos y fortalecimiento de factores protectores, en especial para la prevención del embarazo no deseado.	
AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO (E)		NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (F)	PIM 2023 S/ (G)	EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO 2023 S/ (H)	% EJECUCION FINANCIERA 2023 (I)	% EJECUCION FISICA 2023 (J)
Provincia de Jauja y La Oroya, Departamento de Junín		2917 Adolescente Atendido	S/.10,060	S/.9,968.82	99.99%	80.7 %
PANEL FOTOGRAFICO: Ubicación: Región Junín EDUCATIVA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO EN ADOLESCENTES REALIZADO EN LA I.E. Nstra. SEÑORA DEL CARMEN, EN LA PROVINCIA DE JAUJA, EN ABRIL 2023 						
principales logros alcanzados ✓ Se cobertura en un 99.99% (Ejecución Financiera) ✓ Coordinación con las Instituciones Educativas para la atención integral al adolescente. ✓ Uso de los medios de comunicación para la información de la continuidad de los servicios de atención integral de adolescentes. ✓ Coordinación para el trabajo articulado con los demás servicios para realizar la atención integral del adolescente. ✓ Se garantizó atenciones integrales a todos los adolescentes que acudieron a las instituciones prestadoras de servicio por cualquier tipo de atención.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS ✓ Se cobertura en 80.7% (Ejecución Física), por las siguientes dificultades: ✓ Población adolescente migrante, y dispersa, por motivos de estudios no se encuentran en su lugar de origen. ✓ Poca aceptación de los colegios con respecto a brindar orientación y consejería de salud sexual y reproductiva para la prevención del embarazo, en especial en algunos colegios religiosos. ✓ Números telefónicos inexistentes y desactualizados.						

Cuadro N° 27: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCION (A)	N° CUI (SOLO PROYECTOS) (B)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (C)		BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (D)	
1	SALUD		5000037 BRINDAR ATENCION PRENATAL REENFOCADA		Son intervenciones preventivas que se realizan durante la atención prenatal de la gestante de manera presencial para la vigilancia y detección oportuna de complicaciones que pueden presentarse durante el periodo del embarazo.	
AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO (E)		NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (F)	PIM 2023 S/ (G)	EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO 2023 S/ (H)	% EJECUCION FINANCIERA 2023 (I)	% EJECUCION FISICA 2023 (J)
Provincia de Jauja y La Oroya, Departamento de Junín		877 GESTANTE CONTROLADA	S/. 2,044,602	S/. 2,023,219.35	98.95 %	82.2 %
PANEL FOTOGRAFICO: Ubicación: Región Junín  ATENCION PRENATAL REENFOCADA IPRESS - HUASQUICHA 25 DE OCTUBRE 2023						
principales logros alcanzados ✓ Las actividades de atención prenatal reenforcada fueron cumplidas en un 82.2 %, no se llegó a la meta establecida debido a captación tardía, migración de gestantes sin ninguna atención prenatal y falta de profesional obstétrico para realizar los seguimientos oportunos. ✓ Las metas financieras se tiene un cumplimiento de 91.08% ✓ Se realizó la compra de Doppler, coche metálico, tensiómetro y biombo para la atención a la gestante. ✓ Personal obstetra sensibilizado e involucrado en captación temprana y seguimiento de gestantes. ✓ Monitoreo estricto de padrón de gestantes con vea obstétrico.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS ✓ Migración de gestantes a otros lugares. - Cambio de seguro de SIS a ESSALUD y viceversa. ✓ Acceso tardío a inicio de atenciones prenatales. ✓ Idiosincrasia de la población que por temor no acuden a atenciones prenatales y ocultan embarazo.						

Cuadro N° 28: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCION (A)	N° CUI (SOLO PROYECTOS) (B)	NOMBRE DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (C)		BREVE DESCRIPCION DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (D)	
1	SALUD		5000044 BRINDAR ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES		Es la atención por consulta externa o emergencia que se brinda a la gestante que acude con patologías. Lo realiza el Médico Gineco Obstetra con participación del equipo multidisciplinario capacitado en manejo Estandarizado para la atención de las Emergencias Obstétricas a partir de los establecimientos FONB.	
AMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCION DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO (E)		NUMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (F)	PIM 2023 S/ (G)	EJECUCION FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO 2023 S/ (H)	% EJECUCION FINANCIERA 2023 (I)	% EJECUCION FISICA 2023 (J)
Provincia de Jauja y La Oroya, Departamento de Junín		537 CASO TRATADO	S/ 100,950.00	S/. 99,717.00	98.78 %	100 %
ATENCION A LA GESTANTE CON COMPLICACIONES HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA 18 DE OCTUBRE 202 						
principales logros alcanzados ✓ El 106,5 % son gestantes con complicaciones, se sobrepasó la meta ya que las complicaciones son impredecibles. ✓ Contratación de Gineco-Obstetras para las emergencias obstétricas. ✓ Abastecimiento de insumos, materiales, equipos gradualmente para la adecuada atención de las gestantes con complicaciones.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS • Falta de sensibilización del personal de salud para la atención de pacientes con complicaciones • Mejora en el trato, por el cual las gestantes tienen temor de acudir al hospital para su atención. • Falta en la educación para la identificación de los signos de alarma y la referencia y traslado oportuno.						

Cuadro N° 29: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		5000047 BRINDAR ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO		Es la atención del parto que, por complicación propia del embarazo y trabajo de parto, culmina en cesárea o histerectomía, lo realiza un equipo de profesionales: Médico Gineco Obstetra, Médico Anestesiólogo, Médico Neonatólogo, Enfermera, partir del establecimiento FONE.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincia de Jauja y La Oroya, Departamento de Junín		351 CESAREA	S/ 962,925	S/. 962,538	99.95 %	100 %
PANEL FOTOGRÁFICO ATENCION DEL PARTO COMPLICADO QUIRURGICO HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA 15 DE AGOSTO 2023 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
✓ Se alcanzó 124 % de partos atendidos por cesárea, debido a que se presentaron complicaciones durante el embarazo y/o parto que ponen en riesgo la salud de la madre y el niño, que requieren de una intervención más especializada. ✓ Menor riesgo de complicaciones para el recién nacido. ✓ Disminución de traumas en la zona vaginal.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ La recuperación post parto en una cesárea implica más días de hospitalización.						

ix. Red de Salud Tarma

Cuadro N° 30: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Salud		MEJORAMIENTO DEL ACCESO DE LA POBLACION A METODOS DE PLANIFICACION FAMILIAR	Conjunto de actividades, procedimiento e intervenciones dirigidas a mujeres y hombres en edad fértil, dentro de las cuales se encuentra además de la información, educación, orientación/consejería; la prescripción y provisión de métodos anticonceptivos para que las personas o parejas ejerzan el derecho a decidir libre y responsablemente, si quieren o no tener hijos, así como el número y el espaciamiento entre ellos.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Tarma, Departamento de Junin		Mujeres de 12 a 49 años y varones de 12 a 59 años	456,973.00	456,972.14	100%	76%

TOMBOLA INFORMATIVA POR CELEBRACION DEL DIA INTERNACIONAL DE LA PLANIFICACION



AEROTON POR EL DIA DEL CONDON (18



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logro un avance de 76% de un total programado de 6417 alcanzando una cobertura de 4875 parejas protegidas de la poblacion en edad reproductiva, lo que asu vez genera la disminucion de la morbilidad materna y neonatal por ser un componente de la salud sexual y reproductiva que genera la prevencion oportuna y conciente de los embarazos no planificados, que predispone a complicaciones. Se esta trabajando en la sensibilizacion de la poblacion general a traves de consejerias oportunas y masivas que mejora la accesibilidad uso de metodos anticonceptivos que mas se adecue a sus propias necesidades.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Debido a diversos factores acontecidos durante el 2023 hubo algunas dificultades en relacion al cumplimiento de algunos metodos metodos, la principal deficiencia de personal en el area de urologia que tuvo como resultado el 0% del avance en ese MAC.
desabastecimiento de insumos en distintos meses debido a dificultades con CENARES provoco la desercion de usuarios que perjudico en relacion a alcanzar las coberturas planificadas.

x. Red de Salud Chanchamayo

Cuadro N° 31: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		0160799 ORGANIZACION Y ENTRENAMIENTO DE COMUNIDADES EN HABILIDADES FRENTE AL RIESGO DE DESASTRES		Este curso taller titulado ELABORACIÓN DE MAPA COMUNITARIO DE RIESGO Y PRIMEROS AUXILIOS, se desarrolló de manera descentralizada en el año 2023 se llevó a cabo en el distrito de san ramón, en la cual se tuvo la participación con más de 150 personas, responsables de autoridades y líderes de los caseríos, barrios, anexos y comunidades nativas, lo cual identificaron zonas seguras y de riesgo de sus localidades.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Anexos, barrios, caseríos y comunidades nativas del Distrito de san ramón provincia de Chanchamayo departamento Junín		155 personas	11,603,000	11,603,000	100%	100 %
TALLER SOBRE ELABORACION DE MAPA COMUNITARIO DE RIESGO Y PRIMEROS AUXÍLIOS MICRORED SAN RAMON 10/10/2023						
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS						
- Se logró que puedan ubicar correctamente las zonas seguras para la buena evacuación ante un evento por desastres. - Se logró que elaboren y den la réplica en sus localidades sobre la elaboración de mapa comunitario de riesgo y primeros auxilios. - Se logró en más del 100% realizar las actividades programadas.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS						
- La falta de movilidad para el traslado de personal instructor, ponente y equipo técnico del programa presupuestal de defensa nacional. - Vías inaccesibles por falta de mantenimiento para llegar a la zona.						

xi. Red de Salud Junín

Cuadro N° 32: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		ADOLESCENTES ACCEDEN A SERVICIOS DE SALUD PARA PREVENCIÓN DEL EMBARAZO; ADOLESCENTE		Consiste en un conjunto de prestaciones en salud sexual y reproductiva que forman parte del paquete de atención integral de salud del adolescente y contribuyen a la prevención del embarazo. Estas prestaciones se brindan a los adolescentes hombres y mujeres de 12 a 17 años con 11 meses y 29 días.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Junín, Departamento de Junín		1399 Adolescentes	S/. 7,461,000	S/. 7,194.12	96.42%	100.00%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Trabajo articulado con el equipo en algunas instituciones educativas de nuestra jurisdicción. - Se concientizo a la población a cerca de la importancia de la prevención del embarazo en adolescentes. - Disminución de la tasa de incidencia de embarazo en adolescentes en la Provincia de Junín.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Recursos humanos limitados en algunos establecimientos para el cumplimiento de esta actividad. - Falta de apoyo y compromiso por parte de los docentes en la mayoría de instituciones educativas. - Falta de consultorios diferenciados en algunos establecimientos de salud de la Red de Salud Junín.						

Cuadro N° 33: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		Despistaje de tuberculosis sintomáticos respiratorios		El despistaje de sintomáticos respiratorios consiste en identificar precozmente a las personas sospechosas de tuberculosis pulmonar a través de la identificación y examen inmediato, que se detecta durante la atención por el personal de salud, en cualquier área o servicio del establecimiento de salud.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Junín, Departamento de Junín		866 Población de la Red de Salud Junín	236,315	236,309	100 %	100 %
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se disminuyó el porcentaje de muestras salivales. - Disminución de la tasa de incidencia de tuberculosis en la Red de Salud Junín						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Constante rotación del personal de salud en los establecimientos de salud. - Sobrecarga de actividades de las diferentes estrategias en el personal del puesto de salud.						

Cuadro N° 34: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD		DIAGNOSTICO TRATAMIENTO CASOS ENFERMEDADES ZONOTICAS	Y DE DE	Programa orientado a disminuir la incidencia de enfermedades Zoonoticas tales como la Hidatidosis, teniasis, fasciolasis, atención por mordedura de animales domésticos y ponzoñosos. La atención oportuna para un tratamiento eficaz y eficiente de los pacientes..	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecucion física 2023 (J)
Provincia: Junín Distritos: Junín, Ondores, Carhuamayo y Ulcumayo		118 personas tratadas	62153.00	60387.08	97.16%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Gracias al apoyo y coordinación con instituciones educativas se logró realizar la prevención secundaria para los casos de fasciolosis, hidatidosis y teniasis (cisticercosis), y tratamiento de pacientes con coberturas del 100 %. - Los profesionales del equipo técnico del Programa Presupuestal (personal de salud) se comprometieron con la Estrategia y estuvo activo para atención de la población como prioridad del potencial zoonótico que representan estas enfermedades.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- La Interculturalidad de la población hace que dificulte el trabajo. - Falta de implementación de un laboratorio en zoonosis en la red de salud.						

xii. Red de Salud San Martín de Pangoa

Cuadro N° 35: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Salud	---	Evaluación Clínica y Tamizaje Laboratorial de Personas con Riesgo de Padeecer Enfermedades Crónicas no Transmisibles. (Glucosa, Colesterol y Triglicéridos) en Personas Mayores de 15 Años		En el programa presupuestal de enfermedades no transmisibles se realiza diferentes actividades enfocadas en el bienestar del paciente.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecucion financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de Pangoa Provincia de Satipo, Departamento de Junín		3736 personas	4,924	4,923.91	100%	100.00 %
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
✓ En el año 2023 se logró tamizar un total de 3252 personas con valoración clínica de factores de riesgo y exámenes de laboratorio como glucosa, colesterol y triglicéridos, de los cuales se diagnosticó 162 personas con diabetes mellitus ✓ Se logró la atención un total de 152 paciente hipertensos empadronados, evidenciándose incremento significativo en el año 2023. ✓ Se logró la atención un total de 527 paciente diabéticos, de las cuales suman entre transeúntes y empadronados evidenciándose incremento significativo en el año 2023, con una población de 303 paciente diabéticos empadronados.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ Falta de personal de técnicos y profesional de laboratorio en los centros de salud, se contaban con escasos insumos para los exámenes, falta de personal capacitado para la toma y lectura de los exámenes de laboratorio. ✓ Falta de compromiso y empatía de parte de las distintas IPRESS en cumplir su labor. ✓ Falta de sensibilidad y concientización de la población en la importancia de hacerse un tamizaje oportuno para descartar factores de riesgo. ✓ Falta de personal médico en los algunos establecimientos y mayores recursos humanos que pueden hacer efectivo el desarrollo de las intervenciones. ✓ No se contó con los insumos y medicamentos necesarios y en cantidad para poder cumplir con las metas y atenciones todo el año.						

- ✓ La mayoría de los responsables del programa son profesionales SERUMS, los cuales cambian cada año, lo cual dificulta el avance asistencial de la programación.
- ✓ La mayoría de puestos de salud son alejados, cuyos pobladores se niegan a acudir a otros centros de salud u hospital para realizarse los exámenes de laboratorio ya sea por la lejanía, tiempo, o factor económico.
- ✓ Se ha observado también deceso de personal lo cual dificulta el avance asistencial de la programación.
- ✓ La falta de apoyo de algunas áreas y/o servicios

e. Dirección Regional de Educación Junín (DREJ)

i. Dirección Regional de Educación Junín (DREJ)

Cuadro N° 36: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Educación		PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2023	Promover la creación literaria, en el marco del desarrollo de las competencias comunicativas en lengua originaria o en lengua castellana, a partir de la lectura de la obra de José María Arguedas para expresar el mundo personal del lector, la cultura local, regional y nacional, así como la diversidad cultural y lingüística de las/los estudiantes de nuestro país, la evaluación se realizará a distancia, sin necesidad de movilizar a los estudiantes y a sus docentes.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		130 estudiantes	17,000	17,000	100.00	100



PREMIO NACIONAL DE NARRATIVA Y ENSAYO JOSÉ MARÍA ARGUEDAS 2023
HUANCAYO PREMIACIÓN DE GANADORES REGIONALES 2023 -15 de diciembre de 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)
Participación a nivel nacional de 5 estudiantes de las categorías: cuento, fábula, historieta, ensayo y narrativa oral. Participación a nivel regional de 130 estudiantes de las categorías: cuento, fábula, historieta, ensayo y narrativa oral.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)
- Los estudiantes tienen dificultades en la producción de textos escritos. - Las lecturas de José María Arguedas tienen que tener un conocimiento previo sobre el idioma quechua y el contexto sociocultural andino.
- Poco involucramiento de los especialistas en educación, para un trabajo colaborativo y cooperativo como actividad institucional. - No se cuenta con una base de datos de posibles jurados que cumplan los requisitos mínimos de IDONEIDAD para los concursos posteriores. - Limitada difusión y/o promoción del Concurso Nacional Crea y Emprende 2023 a nivel regional. - Poco involucramiento de las entidades y/o empresarios privados, para gestionar el apoyo a este evento.

Cuadro N° 37: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2350180	"POR UNA INFANCIA FELIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA REGIÓN JUNÍN"		Las videoconferencias y difusión de spot "POR UNA INFANCIA FELIZ DE LOS NIÑOS Y NIÑAS DE LA REGIÓN JUNÍN" se desarrolló como respuesta al diagnóstico de la realidad que actualmente afrontan los padres de familia de nuestra región.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Junín		1 700 PADRES DE FAMILIA	4,480,000	4,480,000	100%	100%
						

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
✓	Brindar soporte en la tarea parental para conciliar los roles de trabajo/estudio en casa mejorando el cuidado y atención de sus niños y niñas de 3 a 5 años de manera eficiente.
✓	Fomentar acciones que disminuyan las dificultades en el estado emocional (indicadores de ansiedad y estrés) en los padres y madres de familia o cuidador responsable para una atención de calidad a los niños y niñas de 3 a 5 años.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
✓	Ninguna

ii. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Tarma

Cuadro N° 38: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		PLAN DE TRABAJO REINCORPORACIÓN DE ESTUDIANTES QUE INTERRUMPIERON SUS ESTUDIOS EN EL AÑO ESCOLAR 2021 Y 2022		Desarrollar actividades de focalizar las IE en la que se tiene alto %e de estudiantes que interrumpieron sus estudios por diversos factores, sensibilizar a la población por dramatización con el contenido temático "logro mis objetivos con el estudio" enfatizando la importancia de la educación a los estudiantes.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Tarma, Departamento de Junín		66 pack escolar para estudiantes del nivel inicial, primaria y secundaria	4600.00	4600.00	99.66%	100.00
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
-Lograr el retorno y la permanencia de las niñas, niños y adolescentes a la educación básica que interrumpieron sus estudios. -Impulsar la reincorporación al sistema educativo en el año 2023 de los estudiantes que interrumpieron sus estudios.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitado presupuesto para el traslado a las instituciones educativas focalizadas.						

iii. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Satipo

Cuadro N° 39: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		AOI00111200216 : CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL INICIAL..		Regular la contratación de profesores y las características de su renovación, con la finalidad de seleccionar y contratar profesores idóneos para el servicio educativo en los programas y las Instituciones Educativas públicas. Asegurar la selección y contratación oportuna de profesores en igualdad de pago oportuno de sus remuneraciones en cumplimiento de las disposiciones legales, presupuestales y administrativas en cumplimiento a la Norma Técnica D.S. 001-2023 - MINEDU, se convoca en las diferentes etapas los procesos de contrata docente en el nivel inicial en la Ugel Satipo, garantizando con esto el buen inicio del año escolar 2023.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito, Satipo, Río Negro, Mazamari, Coviriali, Llaylla, Pampa Hermosa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín		189 Instituciones Educativas	13,044,004.00	13,041,762.83	100	100
En la adjudicación de plaza se entrega de R.D de Contratacion docente en el nivel Inicial en el mes de febrero 2023.						
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						

Numero de Instituciones Educativas del nivel inicial atendidos con la contratación y pago oportuno a los docentes, en cumplimiento de las Horas lectivas Normadas para el logro de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes. Contratación y pago oportuno del personal docentes de las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, Educación Especial, Educación Básica Alternativa avanza e Intermedio y sede, para el buen inicio del año escolar UGELs Satipo y Rio Ene Mantaro, debido al cronograma establecido según Resolución Viceministerial N° 004-2021-EF/52.01.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Docentes titulados con carencia de dominio de lengua, para cubrir plazas docentes en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del nivel inicial.

Algunas Instituciones Educativas de EBR del nivel inicial, que no requieren dominio de lengua.

Algunas renuncias de docentes por la lejanía de institución Educativa.

Fuente: Plan Operativo Institucional.

Elaborado: Oficina de Planilla.

Cuadro N° 40: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL PRIMARIA.		Regular la contratación de profesores y las características de su renovación, con la finalidad de seleccionar y contratar profesores idóneos para el servicio educativo en los programas y las Instituciones Educativas públicas.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito, Satipo, Río Negro, Mazamari, Coviriali, Llaylla, Pampa Hermosa, Provincia de Satipo, Departamento de Junín		189 Instituciones Educativas	13,044,004.00	13,041,762.83	100	100
Adjundicacion y entrega de RD de contrata docente nivel primaria Satipo, mes de Febrero 2023.						



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Numero de Instituciones Educativas del nivel primario atendidos con la contratación y pago oportuno a los docentes, en cumplimiento de las Horas lectivas Normadas para el logro de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Contratación y pago oportuno del personal docentes de las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, EBE,EBA y sede, para el buen inicio del año escolar, debido al cronograma establecido según Resolución Viceministerial N° 004-2021-EF/52.01.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Docentes titulados con carencia de dominio de lengua, para cubrir plazas docentes en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del nivel primaria.

Algunas Instituciones Educativas de EBR del nivel primaria, que no requieren dominio de lengua.

Renuncia de algunos docentes por la lejanía de algunas I.EE.

Fuente: Plan Operativo Institucional.

Elaborado: Oficina de Planilla.

Cuadro N° 41: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y PROMOTORAS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR DEL NIVEL SECUNDARIA.		Regular la contratación de profesores y las características de su renovación, con la finalidad de seleccionar y contratar profesores idóneos para el servicio educativo en los programas y las Instituciones Educativas públicas.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito, Satipo, Río Negro, Mazamari, Coviriali, Llaylla, Pampa Hermosa, Provincia de Satipo.		54 Instituciones Educativas	29,934,497.00	29,914,940.45	100	100



Entrega de Resolución en la adjudicación de plazas docentes para contrata nivel secundaria periodo 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Numero de Instituciones Educativas del nivel secundario atendidos con la contratación y pago oportuno a los docentes, en cumplimiento de las Horas lectivas Normadas para el logro de la enseñanza aprendizaje de los estudiantes.

Contratación y pago oportuno del personal docentes de las instituciones educativas inicial, primaria y secundaria, EBE,EBA, y sede, para el buen inicio del año escolar , debido al cronograma establecido según Resolución Viceministerial N° 004-2021-EF/52.01.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Docentes titulados con carencia de dominio de lengua, para cubrir plazas docentes en las Instituciones Educativas de Educación Básica Regular del nivel secundaria.

Algunas Instituciones Educativas de EBR del nivel secundaria, que no requieren dominio de lengua.

Renuncia de algunos docentes por la lejanía de la II.EE.

iv. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Huancayo

Cuadro N° 42: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Educación		La Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología- FENCYT "EUREKA"	El concurso se desarrolló dentro del marco de la R.V. M. 091-2023 que aprobó la XXXIII Feria Escolar Nacional de Ciencia y Tecnología "Eureka". Los participantes de la categoría B presentaron proyectos en el área de indagación científica, alternativa de solución tecnológica y indagación cualitativa, basados en los enfoques de indagación y alfabetización Científica y

				Tecnológica, Desarrollo Personal y Ciudadanía Activa.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín-Huancayo	136 estudiantes	s/. 10,373.00	s/. 10,373.00	100.00	100.00

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Ganadores absolutos etapa nacional



Ganadores etapa regional

Premio recibido en la

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se conformó la comisión Central y subcomisiones que fueron reconocidos mediante RD, se llevó a acaba en coorganización con la I.E Politécnico Regional del Centro el 20 de octubre, se elabora una guía de orientaciones, se realiza el WEIBINAR denominado APRENDEMOS A ELABORAR INFORMES TECNICO Y CIENTIFICOS, la premiación y reconocimiento el 15 de setiembre. Se presentó el informe final para la emisión de RD de reconocimiento y felicitación, también se hizo la premiación mediante 3 Kits de laboratorio (primer puesto de cada área), las medallas y diplomas, así como la RD de reconocimiento y felicitación. Los proyectos ganadores presentaron sus trabajos a la etapa nacional del 3,4 y 5 de diciembre 2023 en la ciudad de Arequipa.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ La gestión de los recursos financieros fue tediosa, por los procesos a seguir.
- ✓ Poco interés de las autoridades regionales, locales para apoyar el aprendizaje de las ciencias.
- ✓ Ciertos desintereses por algunos docentes en la promoción de aprendizaje basado en investigación.
- ✓ Poca participación en el área de la indagación cualitativa, debido al desinterés de ciertos docentes por dificultades en la aplicación del enfoque del desarrollo personal y ciudadanía activa.

Cuadro N° 43: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Educación	2350180	III CONCURSO REGIONAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN A NIVEL DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL	El "III CONCURSO REGIONAL DE PROYECTOS DE INNOVACIÓN A NIVEL DE LAS COMUNIDADES DE APRENDIZAJE DEL NIVEL DE EDUCACIÓN INICIAL" - 2022 se desarrolla con la finalidad de difundir y reconocer el aporte pedagógico mediante propuestas creativas e innovadoras a nivel de las comunidades de aprendizaje de las docentes de Educación Inicial y Profesoras Coordinadoras teniendo como prioridad atender las necesidades de aprendizaje de los niños y niñas del ciclo I y ciclo II; buscando reconocer el liderazgo pedagógico destacando el rol que cumple el docente en generar las condiciones, el trabajo colaborativo y la promoción del bien común.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Junin		50 docentes, coordinadoras, promotoras y personal directivo.	10,480,000	10,480,000	100%	100%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						

✓ Se fomentó de la implementación de proyectos de innovación que contribuyeron a la mejora de los aprendizajes de los niños y niñas del ciclo I y ciclo II del Nivel de Educación Inicial. ✓ La difusión de las experiencias exitosas como un referente de un servicio educativo de calidad para la atención de las necesidades de aprendizaje y desarrollo de competencias de los niños y niñas que respondan al contexto local y regional. ✓ Implementar para que las prácticas sean sostenibles y puedan expandirse a otras Instituciones Educativas Públicas de Educación Inicial de nuestra región.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuadro N° 44: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2350180	MICROTALLERES REGIONALES DE FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES PEDAGÓGICAS DIRIGIDO A ESPECIALISTAS, DIRECTORAS, PROFESORAS, COORDINADORAS Y PROMOTORAS DEL NIVEL INICIAL DE LAS 13 UGEL PARA LA MEJORA DE LA PRÁCTICA DOCENTE		Los MICROTALLERES REGIONALES - 2023 se desarrolló con el como propósito que los actores educativos de Inicial de la región asuman el liderazgo pedagógico siendo necesario para ello que estén fortalecidas en el desarrollo de competencias, garantizando su actualización permanente en estos temas y de esta manera estén preparadas para que tomen la responsabilidad de promover actividades formativas y de asistencia técnica logrando mejorar los aprendizajes y desarrollo de las/los bebes, niños y niñas de las II.EE. escolarizadas y no escolarizadas del Nivel Inicial de las 13 UGEL de nuestra región.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Huancayo, Jauja, Concepción, Chupaca, Tarma, Yauli, Junín, Chanchamayo, Satipo, Pichanaki, Pangoa, Río Tambo y Ene Mantaro		495 docentes, coordinadoras, promotoras y personal directivo. 28 especialistas UGEL	13,856,000	13,856,000	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Promover la mejora y transformación de las prácticas pedagógicas en los servicios educativos del nivel inicial de la región a través de réplicas de los microtalleres en las comunidades de aprendizaje.
- ✓ Fortalecer en los especialistas, directivos, docentes y coordinadoras de educación inicial de las UGEL las competencias técnico – pedagógicas referidas a aspectos curriculares, disciplinares y didácticos.
- ✓ Orientar la labor pedagógica a nivel de las comunidades de aprendizaje en temas sobre la planificación y evaluación en el nivel inicial.
- ✓ Comprender la función de los elementos curriculares: competencias, capacidades, estándares y desempeños en la planificación.
- ✓ Conocer los momentos claves en el proceso de evaluación: durante la planificación, el desarrollo de la enseñanza y aprendizaje, al término de un periodo.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuadro N° 45: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Educación	2350180	Población Estudiantil desarrolla habilidades psicosociales para la prevención del consumo de drogas.	La actividad contempla la implementación de programas de prevención universal y selectiva para su aplicación en la población escolar. Estas acciones están encaminadas al desarrollo y fortalecimiento de habilidades psicosociales de los/las estudiantes a través de sesiones de tutoría, estrategias socioeducativas y sesiones con familias para favorecer su proceso de desarrollo integral.

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín	14199 estudiantes	607,789.00	544,319	89.60	96.40



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se cumplió con las metas físicas y financieras de la actividad “Fortalecimiento de habilidades psicosociales en escolares”.
- ✓ En la meta Física se cumplió con los talleres de asistencia técnica dirigido a los facilitadores del programa presupuestal de prevención y tratamiento del consumo de drogas.
- ✓ Los docentes tutores fueron capacitados y desarrollaron las 12 sesiones de tutoría por grados y secciones de primero a quinto de secundaria en las IE focalizadas.
- ✓ Se desarrollaron los talleres socioeducativos en las Instituciones Educativas focalizados por el programa PP0051 DEVIDA.
- ✓ Se realizaron los talleres con el programa de Familias Fuertes: Amor y Límites con los facilitadores seleccionados.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ La contratación tardía de la coordinadora y asistente administrativo que se dio en el mes de mayo y julio, los participantes para la convocatoria de facilitadores no cumplían con el perfil requerido por el Programa, por tal motivo se retrasó en la convocatoria de facilitadores para la prevención universal y selectiva.
- ✓ En la oficina se encontró equipos de cómputo malogrados solo una computadora en estado regular.
- ✓ La demora en abastecimiento para el revisado de los expedientes de los participantes a la convocatoria de los facilitadores.
- ✓ Facilitadores que no cuentan con el perfil que solicita el programa.
- ✓ Retraso en la adquisición de los materiales en abastecimiento solicitados por el programa.
- ✓ Inestabilidad en la contratación de la coordinadora y asistente administrativo ya que se hace la ADDENDA de un mes o dos meses.
- ✓ Facilitadores/as pocos comprometidos en la labor que realizan por el mismo hecho de ser locadores. Aduciendo que no está en su contrato no quieren participar en actividades en beneficio de la DREJ.
- ✓ Las Instituciones educativas se resistieron a recibir a los facilitadores y no querían trabajar con el programa ya que empezamos tarde aducen que tenían su planificación programada.
- ✓ Docentes que sentían que le están imponiendo las actividades del programa ya que no tenían una planificación desde el inicio del año escolar.

Cuadro N° 46: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		Actividad 1: Formación y capacitación en materia de gestión del riesgo de desastres y adaptación al cambio climático		Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento de Junín a través de cursos o capacitaciones dirigido a Especialistas de las UGEL y Directores de II.EE.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín		70 Especialistas 131 Directores	S/ 256,725.00	S/ 254,343.00	99.1 %	84.1%
 Equipo de GRD-DRE JUNIN						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
FORMACIÓN Y CAPACITACIÓN EN MATERIA DE GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO. ✓ Se logró capacitar a través del curso en GRD-PREVAED- 2023 a 169 personas (DREJ, UGEL, II.EE) quienes ahora son líderes en sus respectivos lugares y están preparados para afrontar cualquier evento adverso. ✓ Se logró implementar en las 13 UGEL Los planes de Gestión del Riesgo de Desastres, Planes de contingencia frente a Lluvias intensas, Sismo, Heladas/friaje ✓ Se logró implementar en las 13 UGEL El Plan de Continuidad Operativa, así garantizamos en la DRE y UGEL las actividades laborales no paren a pesar de la emergencia que se pueda presentar. ✓ Se logró conformar la COGIREDE en la DREJ y 13 UGEL, esta comisión tiene la tarea de atender las emergencias en su respectivo ámbito. ✓ Se logró implementar los planes de Gestión del Riesgo de Desastres y acciones de contingencia en las 131 II.EE. ✓ Se logró conformar las distintas comisiones operativas, brigadas etc. Para poder afrontar correctamente cualquier emergencia						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ Contrato tardío del personal del Programa.						

Cuadro N° 47: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		Actividad 3: Seguridad físico funcional de servicios públicos.		Fortalecer la Gestión del Riesgo de Desastres en el Departamento de Junín, a través de la implementación de dispositivos de seguridad a 12 II.EE. del ámbito de la Región Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín		12 II.EE.	S/ 34,508.00	S/ 34,508.00	100%	100%
IMPLEMENTACION A 12 II.EE. DE DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD FISICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PUBLICOS.						
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
ACTIVIDAD 3: SEGURIDAD FÍSICO FUNCIONAL DE SERVICIOS PÚBLICOS. ✓ Se logró implementar con dispositivos de seguridad a 12 II.EE. del ámbito de la región Junín (UGEL: Jauja, Tarma, Chanchamayo, Pichanaki, Satipo) Estas II.EE. podrán afrontar de manera más efectiva los eventos adversos que puedan causar afectación. Se logró conformar la COGIREDE en la DREJ y 13 UGEL, esta comisión tiene la tarea de atender las emergencias en su respectivo ámbito. ✓ Se logró implementar los planes de Gestión del Riesgo de Desastres y acciones de contingencia en las 131 II.EE. ✓ Se logró conformar las distintas comisiones operativas, brigadas etc. Para poder afrontar correctamente cualquier emergencia						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ Contrato tardío del personal del Programa.						

v. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Concepción

Cuadro N° 48: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCIÓN (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	NOMBRE DE ACTIVIDADES/ PROYECTO (C)	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/ PROYECTO (D)		
01	Educación	YACHAY: Soporte emocional en las instituciones educativas del nivel secundaria del ámbito de la UGEL Concepción	PREMIACIÓN DE CONCURSOS ESCOLARES	La UGEL Concepción tiene como política la promoción del bienestar y reconocimiento a la noble labor de nuestros docentes.		
Ámbito territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023	Ejecución financiera nivel devengado 2023	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Auditorio de la IE "Heroínas Toledo"		600 II.EE	S/. 13,000.00	S/. 13,000.00	100%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (CADA FOTOGRAFÍA ADJUNTA DEBERÁ ESPECIFICAR: NOMBRE DE ACTIVIDAD/ PROYECTO REPRESENTA, LUGAR Y FECHA)						
		PREMIACIÓN A ESTUDIANTES DE LA IE "VIRGEN DE LA ASUNCIÓN" PRIMARIA - MATAHUASI				
		PREMIACIÓN A ESTUDIANTES DE LA IE "SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS" - CONCEPCIÓN				
		PREMIACIÓN A ESTUDIANTES DE LA IE "HEROÍNAS TOLEDO" - CONCEPCIÓN				
		ENTREGA DE REFRIGERIOS A LOS PARTICIPANTES				

vi. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Chupaca

Cuadro N° 49: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		MANTENIMIENTO Y OPERACIÓN DE LOCALES ESCOLARES DE IIEE DE EBR ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO		Dotación de materiales de escritorio para los niveles de inicial, primaria y secundaria	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca-Departamento de Junín		180 IIEE	26,668.00	26,666.12	99.99	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Entrega de materiales de escritorio a directores de las IIEE – 25/08/2023



Entrega de materiales de escritorio en el área de almacén a directores de las IIEE – 25/08/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se logró dotar de materiales al 90% de las Instituciones Educativas para el buen funcionamiento de sus actividades.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ El 10% de Instituciones Educativas no recogieron sus materiales de escritorio.

Cuadro N° 50: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		DOTACIÓN DE MATERIAL Y RECURSOS PARA ESTUDIANTES DE EBR		Transporte y ddotación de material didáctico para los niveles de Inicial, Primaria y Secundaria.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca- Departamento de Junín		17,744 estudiantes	23,647.00	23,643.67	99.99	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Distribución de libros a IE N°31425 –



Distribución de libros a la IE N°30068 –

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se logró entregar los materiales educativos en su oportunidad, de acuerdo a la llegada del ministerio de educación.
- ✓ Desarrollo de prácticas pedagógicas de calidad orientadas al desarrollo de competencias y al trabajo en profundidad.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)


- ✓ Algunos materiales educativos no llegan completos para todos los estudiantes de las IIEE.
- ✓ Instituciones con necesidades básicas insatisfechas, a nivel de infraestructura, equipamiento, servicios, entre otros.

vii. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Jauja

Cuadro N° 51: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Educación		5000276/ GESTION DEL PROGRAMA	Implementación con mochilas (mochila escolar de poliéster impermeable con las medidas correspondientes a la edad de los niños con diseño propuesto más un tomatodo, hombrera y espalda acolchada) y kit de útiles escolares a los niños y niñas 3 años matriculados oportunamente, para incentivar a los padres de familia con pocos recursos económicos de los distritos Q1 y Q2, META 001 específica de gasto 2.3.1.9.1.2.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distritos de la Provincia donde es considerado Q1 y Q2		1000 Estudiantes de 3 años.	43,307.00	43,148.30	99.63%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.

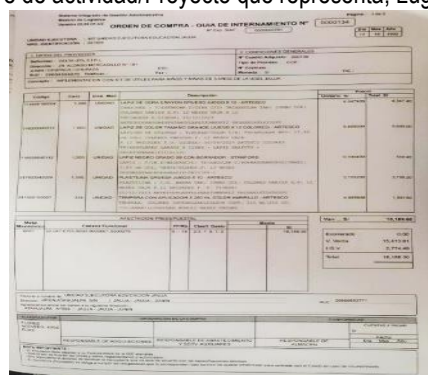

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Previsión de las mochilas y kit de útiles escolares para los estudiantes 3 años garantizando el acceso al servicio educativo y matrícula oportuna.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuadro N° 52: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		5005642/DOTACION DE MATERIAL Y RECURSOS EDUCATIVOS PARA ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA REGULAR		Implementación con kit de materiales fungibles en las instituciones educativa del nivel inicial, contribuirán a mejorar los logros de aprendizaje de los niños y niñas matriculados en programas no escolarizados - PRONOEI, y por consiguiente al logro de competencias priorizadas en el marco de la emergencia educativa, adoptando medidas de soporte apoyo y facilitadores en la adquisición de aprendizajes de la calidad, con el fin de favorecer el desarrollo integral y asegurando el servicio educativo en modalidad presencial. META 26	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Instituciones educativas de la provincia de Jauja y sus distritos en las que se brinda educación inicial no escolarizada-PRONOEIS.		1575 Estudiantes de PRONOEI.	39,437.00	39,435.59	100%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
✓ Previsión kit de materiales fungibles para los estudiantes del nivel inicial de programas no escolarizados PRONOEI, garantizando el acceso al servicio educativo y matrícula oportuna.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

Cuadro N° 53: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación		5005943 / MANTENIMIENTO Y OPERACION DE LOCALES ESCOLARES DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACION BASICA REGULAR CON CONDICIONES ADECUADAS PARA SU FUNCIONAMIENTO.		Consiste en la IMPLEMENTACIÓN CON MATERIAL DE ESCRITORIO, ASEO EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE EDUCACIÓN BÁSICA REGULAR-INICIAL, que consta de útiles de escritorio y aseo con el objetivo de mejorar las condiciones del funcionamiento de locales escolares de las Instituciones Educativas del nivel inicial para favorecer el logro de aprendizajes de los niños y niñas. META 21	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Instituciones educativas de la provincia de Jauja y sus distritos en las que se brinda educación inicial escolarizada		113 Instituciones educativas de la provincia de Jauja y sus distritos en las que se brinda educación inicial escolarizada.	22,570.00	22,569.55	100%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
✓ Dotación con material de escritorio y aseo a las instituciones educativas de educación básica regular-inicial para soporte logístico en las acciones pedagógicas y de gestión. ✓ Los materiales de escritorio distribuidos a las instituciones educativas como (papel bond, papel de colores, papelotes, etc.) sirvieron para el uso exclusivamente de los niños y niñas en el proceso de enseñanza – aprendizaje. ✓ La implementación de materiales de limpieza y aseo contribuyeron a la higiene personal de los niños y niñas y al mantenimiento de los ambientes de los locales escolares como medidas de seguridad para evitar casos de contagio de la COVID19. ✓						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

viii. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Yauli

Cuadro N° 54: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Educación		"CONTRATACIÓN OPORTUNA Y PAGO DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE LA PROVINCIA DE YAULI – LA OROYA"	Se desarrolló la contratación de docentes y administrativos para las II.EE. de la provincia de Yauli – La Oroya, incluido el personal CAS para las II.EE JEC y animadoras y coordinadoras de PRONOEI.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Yauli La Oroya		96 II. EE.	39,323,071	39,318,288	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



**CONTRATACION OPORTUNA Y PAGO DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS DE II. EE. DE LA PROVINCIA DE YAULI LA OROYA
FEBRERO 2023**

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se realizó las contrataciones de acuerdo con los plazos establecidos.
- ✓ Las II.EE. iniciaron el año escolar con el personal contratado.


PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Renuncias
- ✓ Ampliaciones en el proceso de contratación.

ix. Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) Junín

Cuadro N° 55: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCIÓN (A)	N° CUI (SÓLO PROYECTOS) (B)	NOMBRE DEL ACTIVIDAD / PROYECTO (C)	BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (D)		
1	Educación		Saneamiento físico legal de inmuebles de predios de las instituciones educativas, hasta el certificado de búsqueda catastral.	Se realizó el reconocimiento y levantamiento topográfico a los predios de las ii.ee., recopilando la información técnica de campo, para la elaboración de los respectivos planos de ubicación y perimétrico.		
ÁMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO (E)		NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (F)	PIM 2023 S/ (G)	EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO 2023 S/ (H)	% EJECUCIÓN FINANCIERA 2023 (I)	% EJECUCIÓN FÍSICA 2023 (J)
Junín, Ondores Carhuamayo , Ulcumayo		8 instituciones	40000.00	39945.00	100%	99.80%

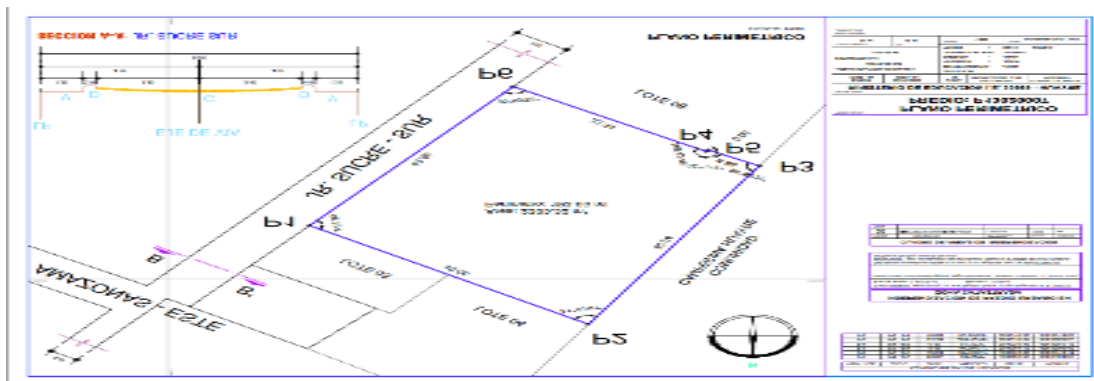

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logró contratar a un profesional para el Saneamiento Físico Legal de los predios de las instituciones educativas, hasta el Certificado de la Búsqueda Catastral, de las varias II.EE:

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

La transferencia presupuestal por cumplimiento de compromisos de desempeño, se realizó muy tardíamente (01-09-2023), lo cual impidió en culminar el saneamiento físico legal en su totalidad.

Cuadro N° 56: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCIÓN (A)	N° CUI (SÓLO PROYECTOS) (B)	NOMBRE DEL ACTIVIDAD / PROYECTO (C)		BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (D)	
1	Education		atención con implementación de cocinas para nivel secundaria		implementación de impresoras a las II.EE del nivel secundaria	
ÁMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO (E)		NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (F)	PIM 2023 S/ (G)	EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO 2023 S/ (H)	% EJECUCIÓN FINANCIERA 2023 (I)	% EJECUCIÓN FÍSICA 2023 (J)
provincia de Junín, departamento de Junín		17 II.EE secundaria	23,800.00	23,800.00	100%	100%



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Implementación de cocinas para las 17 II.EE del nivel secundario de la unidad de Gestión educativa local Junín.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

disponibilidad presupuestal no cubre la atención a las 71 II.EE del nivel primario, 36 ii.ee del nivel inicial.

f. Dirección Regional de Vivienda, Construcción y Saneamiento

Cuadro N° 57: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Vivienda		5000276 Gestión del programa		Esta actividad corresponde a las tareas administrativas para la ejecución de las actividades del Programa Presupuestal, con el fin de asegurar la provisión oportuna del servicio de agua y saneamiento de calidad y sostenible a la población rural del país.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
El ámbito de intervención centros poblados del ámbito de la región Junín priorizados por el Convenio FED.		fueron 525 centros poblados, la población beneficiaria fueron de zona rural del ámbito de la región Junín priorizados por el Convenio FED.	S/ 238,894.00	S/ 236,288.24	98.91 %	100%
  Actividad: Reunión de coordinación en el marco al PPIS 083 Lugar y fecha: Auditorio DIRESA JUNIN – 13/04/2023 Actividad: Reunión de coordinación en el marco al PPIS 083 Lugar y fecha: Sala de reuniones de la DRAJ – 28/09/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró articular con todos los involucrados para el cumplimiento en conjunto del Programa Nacional de Saneamiento Rural PPIS 083, en el tema administrativo se logró gestionar, informar, capacitar, recepcionar y remitir los documentos de gestión en los tiempos oportunos para su óptimo avance presupuestal de ello se obtuvo un 98.43 % de avance presupuestal a nivel del Programa Nacional de Saneamiento Rural PPIS 083.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
La principal dificultad fue en el área de Abastecimiento se demoran en generar las ordenes de servicios y de compras lo cual retrasa lo programado.						

Cuadro N° 58: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Vivienda		5006299 potabilización y otras formas de desinfección y tratamiento		La Actividad esta orienta a brindar y asegurar la provisión de agua de calidad para los hogares rurales concentrados.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
El ámbito de intervención centros poblados del ámbito de la región Junín priorizados por el Convenio FED y Convenio PNSR.		fueron 525 centros poblados, la población beneficiaria fueron de zona rural del ámbito de la región Junín priorizados por el Convenio FED y 101 centros poblados beneficiados en la caracterización de sistema de agua, 49 centros poblados beneficiarios.	749,760.00	707,760.00	94.40%	100%
 Actividad: caracterización de fuente de agua del CCPP Alanya – Ahuac – Chupaca en marco al PPIS 083 Lugar y fecha: CCPP Alanya – 15/12/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se Entregó 101 caracterizaciones del agua con (análisis físico, químico y bacteriológico la cual cuenta con 37 parámetros) se realiza antes del ingreso al reservorio, luego se procedió a la instalación de 49 casetas de seguridad de estructuras metálicas con su sistemas de cloración (hipoclorador de goteo de carga constante de doble recipiente), esto se ubica sobre los reservorios de almacenamiento de agua con la cual se mejora la calidad del agua para consumo humano a nivel de las zonas rurales a nivel de la región Junín.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ El convenio firmado con el PNSR y el pre listado entregado por el PNSR, dificulta y dilatación toma mucho tiempo para la selección de lugares a intervención y la validación para proceso de la Licitación Pública la cual tiene sus dificultades porque tiene tiempos que son amplios y otro factor los pocos proveedores con experiencia en los rubros de las actividades del PPIS 0083, por la cual no permitió que se desarrolle bien las actividades. ✓ Una de las dificultades fue el cambio constante de las Áreas Técnicas Municipales que retrasan las coordinaciones. ✓ Los cambios climatológicos que retrasan el cronograma de ejecución.						

Cuadro N° 59: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Vivienda		5006302 Fortalecimiento de capacidades a prestadores, GL - ATM y GR- D/GRVCS		Esta actividad que fortalece las capacidades de los actores involucrados en los servicios de agua y saneamiento quienes son los que asuman las responsabilidades y ejercen de manera adecuada en sus funciones.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
92 distritos y 525 Centros Poblado de la región Junín		181,540 habitantes de la zona rural de la región Junín (525 centros poblados)	587,948.00	584,000.00	99.33%	100%
 Actividad: taller vivencial de Fortalecimiento de capacidades de Sistema de Cloración en el marco al PPIS 083 Lugar y fecha: CCPP Yauli - Yauli – 26/05/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Capacitación 30 promotores, 120 responsables de las Áreas Técnicas Municipales y 210 Operadores, con el propósito de formar y fortalecer el conocimiento a nivel de Prestador que son los (Operador y miembros administrativos del Consejo Directo), Áreas Técnicas Municipales (ATMs), para que se contribuya a la reducción de prevalencia de enfermedades diarreicas, parasitarias, desnutrición crónica infantil, el desarrollo infantil temprano y de la misma forma adultos mayores. También con esta actividad se logró realizar el fortalecimiento de capacidades en los 525 centros poblados de intervención por el Convenio FED						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ Transferencia económica muy tardía por parte del FED (20-11-2023), el cual no permitió la contratación de personal por temor a no llegar a pagar por cierre de gestión. ✓ Para los cumplimientos de metas se requiere más compromisos de los miembros de las Organizaciones Comunales, Gobiernos Locales y sus Áreas Técnicas Municipales. ✓ Alta rotación de personal responsable de las ATMs de los Gobiernos Locales. ✓ Miedo a la privatización del agua por los potable en algunos centros poblados del ámbito rural de la región Junín.						

Cuadro N° 60: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Vivienda		5006303 Educación sanitaria para hogares rurales		Esta actividad se busca, principalmente, fomentar una cultura de pago, el consumo responsable del agua, y el cuidado adecuado de las UBS en los hogares concentrados.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
26 distritos y 60 Centros Poblados		19,684 habitantes de la zona rural de la región Junín (60 centros poblados)	12,000.00	12,000.00	100%	100%
 La hora de la red no está sincronizada 11° 7' 48" S, 74° 27' 8" W 62° NE Observación: Ubicación: Bella Esperanza SENSIBILIZACIÓN SELVA Fecha: 25/05/23 Actividad: Sensibilización sobre el uso adecuado del agua potable y la cloración de aguas residuales en el marco al PPIS 083 Lugar y fecha: CCPP Bella Esperanza – 25/05/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se Capacito y sensibilizo a 60 organizaciones comunales en diferentes Centros Poblados del ámbito rural de la región Junín, con el único propósito de educar en sanitaria en los hogares rurales que abarca la promoción de la valoración del agua y saneamiento y su buen uso de los servicios sanitarios, con esto se busca fomentar una cultura de pago, sobre el consumo responsable del agua de calidad contribuyendo a la reducción de prevalencia de enfermedades diarreicas, parasitarias, reducción de desnutrición crónica infantil, adecuado desarrollo infantil temprano y en la misma medida a los adultos mayores.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ Transferencia económica muy tardía por parte del FED (20-11-2023), el cual no permitió la contratación de personal por temor a no llegar a pagar por cierre de gestión. ✓ Para los cumplimientos de metas se requiere más compromisos de los miembros de las Organizaciones Comunales, Gobiernos Locales y sus Áreas Técnicas Municipales. ✓ Alta rotación de personal responsable de las ATMs de los Gobiernos Locales.						

- ✓ Miedo a la privatización del agua por los potable en algunos centros poblados del ámbito rural de la región Junín.
- ✓ La información consignada en el DATASS difiere en algunos casos la información de la situación real de los sistemas de agua potable en general.

Cuadro N° 61: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Vivienda		5006304 Monitoreo de la prestación de los servicios de agua potable y disposición sanitaria de excretas para hogares rurales concentrados.	La actividad está orientada a monitorear las condiciones de calidad que debe tener la prestación de los servicios de agua y saneamiento brindados por las organizaciones comunales en el ámbito rural de la región Junín.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
92 distritos y 525 Centros Poblados		181,540 habitantes de la zona rural de la región Junín (525 centros poblados)	437,570.00	428,570.00	97.94%	100%
 Actividad: Asistencia Técnica en cloración y seguimiento de cloro residual en el marco al PPIS 083 Lugar y fecha: CCPP Acopalca - Huancayo – /03/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró realizar el monitoreo de cloro residual (reservorio, primera vivienda, vivienda intermedia y ultima vivienda) en 525 centros poblados del ámbito rural, seguimiento, capacitación y asistencia técnica, en temas de operación y mantenimiento de sistemas de agua, sistemas de cloración, limpieza desinfección de reservorio, redes, cloración del agua, calibración del sistema de cloración y parte de educación sanitaria con el fin de garantizar el consumo responsable del agua de calidad con el propósito de contribuir a la reducción de prevalencia de enfermedades diarreicas, parasitarias y otras, reducción de desnutrición crónica infantil.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

- ✓ Transferencia económica muy tardía por parte del FED (20-11-2023), el cual no permitió la contratación de personal por temor a no llegar a pagar por cierre de gestión.
- ✓ Para los cumplimientos de metas se requiere más compromisos de los miembros de las Organizaciones Comunales, Gobiernos Locales y sus Áreas Técnicas Municipales.
- ✓ Alta rotación de personal responsable de las ATMs de los Gobiernos Locales.
- ✓ Miedo a la privatización del agua por los potable en algunos centros poblados del ámbito rural de la región Junín.
- ✓ La información consignada en el DATASS difiere en algunos casos la información de la situación real de los sistemas de agua potable en general.

g. Dirección Regional de Archivo

Cuadro N° 62: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1			ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL		PROCESO ARCHIVÍSTICO QUE CONSISTE EN EL DESARROLLO DE UN CONJUNTO DE ACCIONES ORIENTADAS A CLASIFICAR, ORDENAR Y SIGNAR LOS DOCUMENTOS QUE CUSTODIA LA INSTITUCIÓN Y DEL ARCHIVO CENTRAL.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		3,300 usuarios atendidos (Ciudadanía, estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros)	114,339	67,100	58.685	100.00
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						



Nombre de la Actividad: ORGANIZACIÓN DOCUMENTAL
Lugar: DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO JUNIN
Fecha: 31/DICIEMBRE/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Se avanzó en un 45% en la clasificación, ordenamiento y signatura de los documentos archivísticos pertenecientes al fondo documental Corte Superior de Justicia de Junín y 25% de avance de la Prefectura (Impuestos Sucesorios).
- Se Identificó el tipo documental de los documentos archivísticos que custodia la institución.
- Se elaboró el mapa de ubicación de los fondos documentales de acuerdo a la normatividad archivística.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Los ambientes no son adecuados para la custodia de documentos archivísticos.
- No se cuenta con equipos informáticos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo de dicha actividad.
- No contar con personal capacitado en materia archivística y asignación presupuestal insuficiente para contratar a personal especializado en archivos.

Cuadro N° 63: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1			DESCRIPCION DOCUMENTAL		PROCESO ARCHIVÍSTICO QUE CONSISTE EN IDENTIFICAR, ANALIZAR Y DETERMINAR LAS CARACTERÍSTICAS EXTERNAS E INTERNAS DE LOS DOCUMENTOS CON LA FINALIDAD DE ELABORAR LOS AUXILIARES O INSTRUMENTOS DESCRIPTIVOS PARA FACILITAR EL CONOCIMIENTO Y CONSULTA DE LOS FONDOS DOCUMENTALES..	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		3,300 usuarios atendidos (Ciudadanía, estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros)	114,339	67,100	58.685	95.00
 Nombre de la Actividad: DESCRIPCION DOCUMENTAL Lugar: DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO JUNIN Fecha: 31/DICIEMBRE/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se continuó con la implementación de instrumentos descriptivos (inventarios) de los fondos documentales que custodia la institución, el cual coadyuvó a la atención inmediata. - Se valoró el 5% de los fondos documentales, para su descripción.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- No se cuenta con ambientes adecuados para el desarrollo de dicha actividad. - No se cuenta con equipos informáticos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo de dicha actividad. - No contar con personal capacitado en materia archivística y asignación presupuestal insuficiente para contratar a personal especializado en archivos.						

Cuadro N° 64: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1			CONSERVACION DOCUMENTAL		CONSERVACIÓN DE DOCUMENTOS ES UN PROCESO ARCHIVÍSTICO QUE CONSISTE EN MANTENER LA INTEGRIDAD FÍSICA DEL SOPORTE Y DEL TEXTO DE LOS DOCUMENTOS A TRAVÉS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE PRESERVACIÓN Y RESTAURACIÓN (LIMPIEZA Y ENCUADERNACIÓN).	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		3,300 usuarios atendidos (Ciudadanía, estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros)	114,339	67,100	58.685	100.00



Nombre de la Actividad: CONSERVACION DOCUMENTAL
Lugar: DIRECCION REGIONAL DE ARCHIVO JUNIN
Fecha: 31/DICIEMBRE/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Se adquirió 2,350 cajas archiveras, para conservar en óptimas condiciones los documentos archivísticos de valor permanente (expedientes judiciales e impuestos sucesorios).
- Se avanzó en 20% la limpieza de la cada pieza documental, para mantener la integridad del documento archivístico.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- No se cuenta con ambientes adecuados para el desarrollo de dicha actividad.
- No se cuenta con equipos informáticos y materiales necesarios para el óptimo desarrollo de dicha actividad.
- No contar con personal capacitado en materia archivística y asignación presupuestal insuficiente para contratar a personal especializado en archivos.

Cuadro N° 65: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

Nº	Sector de intervención (A)	Nº CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1			ELIMINACION DOCUMENTAL		PROCEDIMIENTO ARCHIVÍSTICO QUE CONSISTE EN LA DESTRUCCIÓN FÍSICA DE SERIES DOCUMENTALES, AUTORIZADO EXPRESAMENTE POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN O ARCHIVOS REGIONALES.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Jauja, Yauli, Tarma, Chanchamayo y Satipo.		3,300 usuarios atendidos (Ciudadanía, estudiantes e investigadores nacionales y extranjeros)	114,339	54,339	97.00	9700
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
				Nombre de la Actividad: ELIMINACION DOCUMENTAL Lugar: CORTE SUPERIOR DE JUSTICIA DE JUNIN Fecha: 31/DICIEMBRE/2023		
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Autorización a 8 instituciones públicas para eliminar sus documentos declarados innecesarios, previa evaluación de acuerdo a la Directiva N° 001-2018-AGN/DAI y modificatorias. - Disposición final de 1,232.187 metros lineales de documentos declarados innecesarios, lo que con lleva a que los repositorios de dichas entidades se liberan de documentos temporales. - Ambientes descongestionados para albergar nuevos documentos administrativos, hasta el cumplimiento del tiempo de custodia.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- No se cuenta con equipo adecuado (tritadora) para la destrucción de los documentos declarados innecesarios, por ello se terceriza el servicio, generando el gasto a la institución. - Falta de conocimiento por parte de las instituciones públicas de la directiva de eliminación, por lo que destruyen su documentación sin la autorización del ente rector de su jurisdicción, exponiéndose a ser denunciados.						

EJE INSTITUCIONAL – OER 3: ESTADO MODERNO Y GOBERNABILIDAD

1.2 CONSEJO REGIONAL

a. Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional

Cuadro N° 66: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
	Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional		PRODUCCIÓN DE Y ORDENANZAS ACUERDOS REGIONALES		La producción de los Acuerdos y Ordenanzas Regionales, es el producto del análisis en el debate de las propuestas generadas del Consejo Regional como del Ejecutivo; concordando con los criterios políticos y técnicos para la aprobación en Sesión Ordinaria y Extraordinaria, viendo las necesidades y problemas de la población de cada provincia y de interés público regional, con la finalidad de contribuir al bienestar y la gobernabilidad de la población de la Región Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín, Provincia de Huancayo		Población general del departamento de Junín, entidades públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil y otros	725,760.00	725,388.02	99.948 %	100%



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se produjeron 25 Ordenanzas Regionales y 440 Acuerdos Regionales, 24 Actas Ordinaria y 10 Actas Extraordinarias para beneficio y desarrollo de la población de la Región Junín.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Se produjeron 25 Ordenanzas Regionales de las cuales se **publicó** en el Diario el Peruano 18 Ordenanzas Regionales y 07 Ordenanzas Regionales pendientes de su publicación por falta de asignación presupuestal.

Cuadro N° 67: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
	Secretaria del Consejo Regional		ACCIONES DE FISCALIZACIÓN DE ACTIVIDADES Y PROYECTOS PROGRAMADOS Y EJECUTADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL JUNÍN	Los Consejeros del Gobierno Regional de Junín, desarrollan sus actividades y acciones de Fiscalización, mediante decisiones internas, conforman Comisiones Permanentes y Comisiones Especiales, integrado por tres miembros por cada comisión, para los diferentes sectores; como educación, salud y Infraestructura etc. Son órganos consultivos y/o deliberativos del Consejo, cuya finalidad es formular propuestas, proyectos de normas e investigaciones y emitir Dictámenes o Informes. Con el objetivo de esclarecer hechos, sobre los asuntos de su competencia o que el Consejo les encargue.

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín, Provincia de Huancayo	Población total del Departamento de Junín	188,574.00	188,372.14	99.892 %	94.736 %



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Las actividades y acciones de fiscalización se conformaron 13 comisiones permanentes, quienes desarrollaron diversas acciones de fiscalización en las distintas Áreas, Gerencias, Direcciones Regionales Sectoriales del Gobierno Regional Junín, los mismos que elevan sus proyectos de normas, los resultados de las investigaciones e informes sobre los asuntos de su competencia.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Las fiscalizaciones se encuentran previstas en los respectivos reglamentos internos del Consejo Regional de Junín, muchas veces los funcionarios del Ejecutivo Regional los vienen cuestionando y se resisten a su cumplimiento, aduciendo que éstos no se encuentran previstos expresamente en la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, obstaculizando con ello la labor fiscalizadora del Consejo Regional.

Cuadro N° 68: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
	Secretaría Ejecutiva del Consejo Regional		FISCALIZACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN PÚBLICA	La labor de fiscalización de los Consejeros Regionales se desarrolla en cumplimiento a sus funciones, fiscalizan el avance financiero y físico de la ejecución de las obras, el uso adecuado de los recursos públicos en gastos corrientes como proyectos de inversión del Gobierno Regional Junín.

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín, Provincia de Huancayo	Población total del Departamento de Junín	119,056.00	39,098.50	32.840 %	50 %



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

En la actividad de la fiscalización y control de la gestión pública se realizaron 22 Acuerdos Regionales de fiscalización en los diferentes sectores (Direcciones Regionales) y proyectos de inversión que se encuentran en ejecución por el Gobierno Regional Junín, para el fortalecimiento de la función fiscalizadora del Consejo Regional, en beneficio de la población de la Región Junín.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Se produjeron 22 Acuerdos Regionales de fiscalización de las cuales 13 Acuerdos Regionales de fiscalización concluidos al 100%, 9 pendientes por concluir por información entregada con deficiencia e incompletas por las áreas involucradas y tiempo reducido para realizar las actividades de fiscalización.

Fuente: Elaboración propia.

Elaborado: Secretaría Ejecutiva de Consejo Regional


1.3 GOBERNACIÓN / VICE GOBERNACIÓN

a. Secretaría General

Cuadro N° 69: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	INSTITUCIONAL		AOI00081800455 CONDUCIR EL PROCESO DE TRANSCRIPCIÓN, DIFUSIÓN Y CUSTODIA DE RESOLUCIONES, CONTRATOS, ADENDAS, DECRETOS Y OTROS QUE SE RECIBE; Y DOCUMENTOS QUE GENERA ESTA DEPENDENCIA	Gestión normativa de los Decretos Regionales, Resoluciones Ejecutivas, Gerenciales Regionales, Directorales y Administrativas; asegurando la celeridad y fluidez de la información; en base a la normatividad vigente.

				Así mismo, se realizan actividades de ingreso, numeración, registro, fotocopiado, transcripción, derivación y distribución de las Resoluciones Ejecutivas, Gerenciales Regionales, Directorales, Contratos CAS, Locación de Servicio y Procesos, a las diferentes oficinas de la sede Regional, Unidades Orgánicas del Gobierno Regional Junín, Empresas y/o consorcios y usuarios.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo Departamento de Junín	470 notificaciones	S/.452,222.00	S/.439,648.17	97%	100%

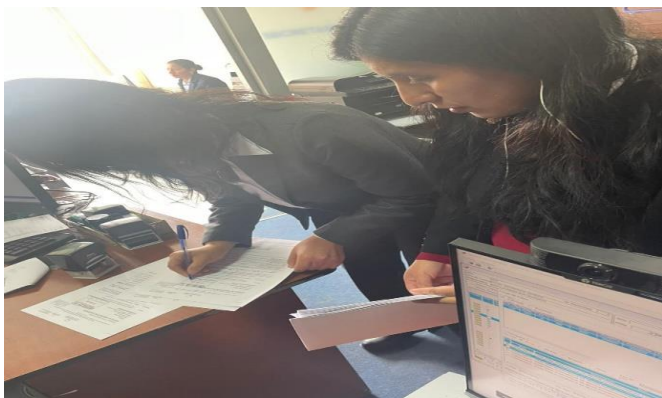

Entrega de Resoluciones, adendas etc.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
✓	Apertura del Libro de Reclamaciones Virtual, concatenado al portal web del Estado Peruano.
✓	Se logró el 97% de ejecución de las metas financieras programadas.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
✓	Necesidad de renovación de equipos informáticos y de sistema de telecomunicaciones con las diferentes áreas adscrito a esta unidad ejecutora.
✓	Limitaciones económicas en Recursos Ordinarios y Recursos directamente Recaudados.
✓	Necesidad de renovación de equipos informáticos y de sistema de telecomunicaciones con las diferentes áreas adscrito a esta unidad ejecutora.
✓	Falta de presupuesto para la adquisición de papel bond, toners, archivadores y útiles de escritorio en general.

1.4 OFICINA REGIONAL DE CONTROL INTERNO

Cuadro N° 70: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Otros: Institucional	-	<u>Servicio de Control Posterior:</u> Auditoría de cumplimiento, servicio de control específico a hechos con presunta irregularidad y acción de oficio posterior	La Auditoría de Cumplimiento. Se recopila y evalúa evidencias para determinar si los aspectos significativos de los actos, actividades, procesos, asuntos específicos o resultados de las operaciones financieras, presupuestales, operativas y administrativas realizadas cumplen con la normativa, disposiciones internas y las estipulaciones contractuales. El Servicio de Control Específico a Hechos con Presunta Irregularidad, consiste en la intervención oportuna y puntual con el objeto de verificar la existencia de hechos con evidencias de presunta irregularidad. La Acción de Oficio Posterior, se realiza a partir de información proveniente de los servicios relacionados, cuyo objetivo es comunicar al Titular de la entidad, la existencia de hechos con indicio de irregularidad evidenciados.

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín	La población en general	302 655.00	300 371.44	99.25	100

Cabe indicar, que el desagregado del presupuesto asignado al Órgano de Control Institucional para la ejecución de las diversas Actividades y Servicios de Control durante el año 2023 es el siguiente:

Rubro de financiamiento		Programado (PIM - S/)	Ejecutado (Devengado al 31.12.2023 - S/)
2.1.1.1	Personal y Obligaciones Sociales	185,740.00	185,725.73
2.3.1.5	Materiales de oficina, aseo; libros, revistas y otros.	76,524.00	76,522.26
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	40,391.00	38,123.45
TOTAL S/		302,655.00	300,371.44

Al respecto, del cuadro precedente se advierte que en dicho presupuesto se está considerando la específica de gasto **21 Personal y Obligaciones Sociales**, que comprende remuneraciones y demás cargas y beneficios del **personal administrativo nombrado y de plazo fijo**, que asciende la suma de **S/185 740.00** (PIM) y **S/185 725.73** (Devengado); sin embargo, se precisa que en este Órgano de Control Institucional, no se tiene asignado personal del Gobierno Regional Junín bajo dichas modalidades de contratación.

PANEL FOTOGRÁFICO

Servicio de Control Posterior: Auditoría de cumplimiento a la obra: “Mejoramiento y Ampliación de los Sistemas de Agua Potable y Alcantarillado de **Satipo**, departamento de Junín”, en su segunda ejecución a cargo del “Consortio Ejecutor Satipo”.



Lugar: Satipo - Junín

Fecha: 04/05/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logró concluir diecinueve (19) informes de Servicios de Control Posterior, entre ellos, una (1) Auditoría de Cumplimiento, ocho (8) Servicios de Control Específico y diez (10) Acción de Oficio Posterior, que conllevaron a la determinación de presuntas responsabilidades administrativa, civil y penal, así como, en casos de las Acciones de Oficio Posterior, se comunicó al Titular de la entidad la existencia de hechos con indicio de irregularidad evidenciados, con el fin de que se adopten las acciones inmediatas que correspondan.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Limitación en la atención oportuna de los requerimientos de información, puesto que fueron atendidos de manera parcial y con retraso por las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional Junín, situación que se viene repitiendo desde periodos anteriores.
- ✓ Falta de ambientes amplios y acondicionado para el adecuado desarrollo de las labores de control y para el archivo de la documentación de auditoría, toda vez que los ambientes son reducidos para la cantidad de auditores que laboran actualmente.
- ✓ Carencia de mobiliarios para el manejo y archivo de la documentación de auditoría.
- ✓ Limitación de equipos de cómputo, al contarse con equipos cuyo funcionamiento viene presentando fallas y lentitud de procesamiento al ser de años anteriores.

Cuadro N° 71: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
2	Otros: Institucional	-	<u>Servicio de Control Simultáneo:</u> Control Concurrente, Visita de Control y Orientación de Oficio.		El Control Concurrente se realiza a modo de acompañamiento, tiene por finalidad realizar la evaluación, a través de la aplicación de diversas técnicas, sobre un conjunto de hitos de control que corresponde a un proceso en curso, en el momento de su ejecución, para verificar si estos se realizan conforme a la normativa aplicable, las disposiciones internas, estipulaciones contractuales u otras análogas que les resultan aplicables. La Visita de Control. Implica inspección u observación de una actividad que forma parte de un proceso en curso, en el lugar y momento de su ejecución. La Orientación de Oficio. Consiste principalmente en la revisión documental y el análisis de información vinculada a una o más actividades de un proceso en curso, con la finalidad de verificar si estas se efectúan conforme a la normativa aplicable, disposiciones internas o estipulaciones contractuales u otra análoga.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)

			devengado 2023 S/ (H)		
Departamento de Junín	La población en general	302 655.00	300 371.44	99.25	100

Cabe indicar, que el desagregado del presupuesto asignado al Órgano de Control Institucional para la ejecución de las diversas Actividades y Servicios de Control durante el año 2023 es el siguiente:

Rubro de financiamiento		Programado (PIM - S/)	Ejecutado (Devengado al 31.12.2023 - S/)
2.1.1.1	Personal y Obligaciones Sociales	185,740.00	185,725.73
2.3.1.5	Materiales de oficina, aseo; libros, revistas y otros.	76,524.00	76,522.26
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	40,391.00	38,123.45
TOTAL S/		302,655.00	300,371.44

Al respecto, del cuadro precedente se advierte que en dicho presupuesto se está considerando la específica de gasto **21 Personal y Obligaciones Sociales**, que comprende remuneraciones y demás cargas y beneficios del **personal administrativo nombrado y de plazo fijo**, que asciende la suma de **S/185 740.00** (PIM) y **S/185 725.73** (Devengado); sin embargo, se precisa que en este Órgano de Control Institucional, no se tiene asignado personal del Gobierno Regional Junín bajo dichas modalidades de contratación.

Servicio de Control Simultáneo: Control Concurrente a la Ejecución de la Obra: “Mejoramiento del Servicio de Educación Superior en el Instituto Pedagógico Pedro Monge Córdova - Distrito de **Jauja** - Provincia de Jauja - Departamento de Junín” CUI 2432713 - Hito de Control N° 2 - Avance de ejecución de obra y valorización mensual de octubre 2023.



Lugar: Jauja - Junín

Fecha: 24/11/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se ejecutó treinta y seis (36) servicios de control simultáneo, entre ellos, quince (15) informes de hito de control, quince (15) orientaciones de oficio y seis (6) visitas de control; logrando cumplir las metas programadas en el Plan Anual de Control de 2023. De esta forma se contribuyó en el uso y destino de los recursos y bienes del Estado, con eficiencia, eficacia, transparencia, economía y legalidad.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Limitación en la atención oportuna de los requerimientos de información, puesto que fueron atendidos de manera parcial y con retraso por las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional Junín, situación que se viene repitiendo desde periodos anteriores.
- ✓ Falta de ambientes amplios y acondicionado para el adecuado desarrollo de las labores de control y para el archivo de la documentación de auditoría, toda vez que los ambientes son reducidos para la cantidad de auditores que laboran actualmente.
- ✓ Carencia de mobiliarios para el manejo y archivo de la documentación de auditoría.
- ✓ Limitación de equipos de cómputo, al contarse con equipos cuyo funcionamiento viene presentando fallas y lentitud de procesamiento al ser de años anteriores.

Cuadro N° 72: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	Otros: Institucional	-	Servicios Relacionados		Constituyen servicios relacionados , la gestión de denuncias, el seguimiento a la implementación de las recomendaciones de los informes de control, la rendición de cuentas y transferencia de gestión, la recopilación de información, entre otros servicios relacionados que determine la Contraloría.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		La población en general	302 655.00	300 371.44	99.25	100

Cabe indicar, que el desagregado del presupuesto asignado al Órgano de Control Institucional para la ejecución de las diversas Actividades y Servicios de Control durante el año 2023 es el siguiente:

Rubro de financiamiento		Programado (PIM - S/)	Ejecutado (Devengado al 31.12.2023 - S/)
2.1.1.1	Personal y Obligaciones Sociales	185,740.00	185,725.73
2.3.1.5	Materiales de oficina, aseo; libros, revistas y otros.	76,524.00	76,522.26
2.6.3.2.1.2	Mobiliario	40,391.00	38,123.45
TOTAL S/		302,655.00	300,371.44

Al respecto, del cuadro precedente se advierte que en dicho presupuesto se está considerando la específica de gasto **21 Personal y Obligaciones Sociales**, que comprende remuneraciones y demás cargas y beneficios del **personal administrativo nombrado y de plazo fijo**, que asciende la suma de **S/185 740.00** (PIM) y **S/185 725.73** (Devengado); sin embargo, se precisa que en este Órgano de Control Institucional, no se tiene asignado personal del Gobierno Regional Junín bajo dichas modalidades de contratación.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Durante el año 2023, el Órgano de Control Institucional del Gobierno Regional Junín, ejecutó trece (13) Servicios Relacionados, incluyendo recomendaciones para la Gestión Administrativa del Gobierno Regional Junín, quienes dispusieron a las diversas áreas de la Sede y Unidades Ejecutoras la implementación de dichas recomendaciones, las que vienen implementándose en las diferentes Gerencias y Sub Gerencias de la Región Junín; logrando cumplir las metas programadas en el Plan Anual de Control de 2023.

Así también, se apoyó a la gestión en la atención de algunos derechos de consultas, reclamaciones, denuncias y otra serie de quejas interpuestos por los ciudadanos, cuyo contenido común es la transparencia de la actuación institucional.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Durante el periodo 2023, se han presentado limitaciones en el desarrollo de los Servicios de Relacionados, a continuación, se menciona los siguientes:

- ✓ Limitación en la atención oportuna de los requerimientos de información, puesto que fueron atendidos de manera parcial y con retraso por las diferentes unidades orgánicas del Gobierno Regional Junín, situación que se viene repitiendo desde periodos anteriores.
- ✓ Falta de un ambiente especial para la atención a los denunciantes.

1.5 PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL

Cuadro N° 73: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	PROCURADURIA PUBLICA REGIONAL JUNIN		ASESORAMIENTO Y DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO		La Procuraduría Pública Regional, ejerce la representación y defensa en los procesos y procedimientos en el que el Gobierno Regional Junín actué como demandante, demandado, denunciante, denunciado o parte civil. Presta confesión en juicio en representación del Gobierno Regional Junín y conviene en la demanda o desiste de ella o transigir en juicio previa autorización mediante Resolución Ejecutiva Regional y acuerdo de gerentes regionales.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución Financiera 2023 (I)	% Ejecución Física 2023 (J)
DEPARTAMENTO DE JUNIN		9 PROVINCIAS	425,010.00	389,818.74	98.74%	100%
SERVIDORES LABORANDO EN LA OFICINA DE LA PROCURADURIA REGIONAL EJERCIENDO LA DEFENSA JUDICIAL EN UN AMBIENTE NO ADECUADO, INCLUSIVE NO EXISTE UNA SALA EXCLUSIVAMENTE PARA AUDIENCIAS PROGRAMADAS. 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
➤ EN LOS PROCESOS JUDICIALES: - Se realizó la representación y defensa judicial de los intereses y derechos del Gobierno Regional Junín en todos los procesos y procedimientos, ante cualquier órgano jurisdiccional del poder judicial. - Mantener relaciones de coordinación y cooperación con el Consejo de Defensa Judicial del Estado. - Se ha realizado las respectivas denuncias penales en defensa de los intereses del estado. - Se ha obtenido como resultado que se declare infundada la demanda laboral sobre reposiciones. ➤ EN PROCESOS LABORALES: - Se han expedido 900 sentencias de las cuales 370 son favorables al Gobierno Regional de Junín o sea un 44.00%; y 530 sentencias son desfavorables en un 56.00%, en este caso es, debido a que se incluyen beneficios por Fonavi, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), Bonificación Personal, Subsidio por Luto y Gastos de Sepelio -						

Gratificaciones por 20, 25 y 30 años de servicios prestados al Estado, 30% por Preparación de Clases, entre otras Bonificaciones que por ley les corresponde su derecho a todos los administrados.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

INADECUADA E INOPORTUNA INFORMACIÓN DE LOS ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS

LIMITACION DE PRESUPUESTO ASIGNADO A LA PROCURADURIA PÚBLICA REGIONAL

1.6 GERENCIA GENERAL REGIONAL

a. Oficina Regional de Defensa Nacional, Seguridad Ciudadana y Gestión de Riesgos y Desastres

Cuadro N° 74: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervencion (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AMBIENTE (Sub Gerencia de Defensa Civil)		Administración y almacenamiento de kits		Adquisición de bienes, alimentos y atención a población afectada y damnificada por emergencias y desastres en el ámbito de la región Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
09 Provincias del Departamento de Junín.		46,000 personas aproximads	1,391,626	1,388,169.00	99.75%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Reabastecimiento con bienes de ayuda humanitaria a los almacenes de avanzada (provincia de Satipo y Chanchamayo)
Atención a población afectada por bajas temperaturas a 46,000 personas aproximado (con kits de abrigo y alimentos consistente en chocolate, leche, azúcar)

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Retraso en la adquisición de bienes de ayuda humanitaria de parte de la oficina de adquisiciones
Quedo decierto por dos veces el requerimiento de frazadas polyester para reabastecimiento del almacén central del COER-JUNIN.


Cuadro N° 75: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AMBIENTE (Sub Gerencia de Defensa Civil)		Mantenimiento de cauces, drenajes y estructuras físicas de seguridad		Atención con combustible para trabajo de reducción del riesgo en el ámbito de la región Junín Atención con combustible para trabajos en limpieza de vías por emergencias.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
09 Provincias del Departamento de Junín.		46 intervenciones	454,979.00	454,978.00	99.99	46
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró 30 intervenciones en recuperación de vías en el ámbito del departamento e Junín Se logró 14 intervenciones en limpieza y descolmatacion de ríos en el ámbito del departamento e Junín						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Retraso en la asignación de recursos para la actividad antes mencionada Demora en la adquisición de DIESEL B5- S50, para trabajos de reducción del riesgo en el ámbito de la región Junín.						

1.7 GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL.

a. Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento (SGCTP)


Cuadro N° 76: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Planeamiento	-	REPORTE DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNÍN AL 2050 (CON METAS AL 2021 Y 2030) – PERÍODO 2022		✓ El Reporte de Seguimiento del PDRC es el proceso continuo de recopilación de información sobre la implementación y resultados del PDRC, para verificar su progreso. ✓ El medio esencial para el Reporte de Seguimiento del PDRC, son los indicadores de resultados, para cuyo fin se debe contrastar los valores esperados con los valores obtenidos. ✓ Se identifican alertas tempranas a fin de tomar medidas correctivas durante la implementación del PDRC. ✓ Aumenta las posibilidades de alcanzar los resultados que se esperan. ✓ Fortalece la gestión pública basada en evidencia.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		1'246,038 Habitantes	12,600.00	12,370.27	98.2	100.00
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO, PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL SUBGERENCIA DE COOPERACIÓN TÉCNICA Y PLANEAMIENTO  REPORTE DE SEGUIMIENTO PERÍODO 2022 PLAN DE DESARROLLO REGIONAL CONCERTADO JUNÍN AL 2050 <i>(con metas al 2021 y 2030)</i> Huancayo, octubre 2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						

✓	Con Resolución Gerencial Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial N.º 006-2023-GR-JUNÍN/GRPPAT del 30 octubre 2023, aprueba el Reporte de Seguimiento del PDRC Junín al 2050 (con metas al 2021 y 2030), correspondiente al año 2022.
✓	Documento Informe de Reporte de Seguimiento del PDRC Junín al 2050 (con metas al 2021 y 2030), correspondiente al año 2022, en 83 folios.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
✓	Escasa disponibilidad de tiempo y alta rotación de los planificadores de las Gerencias Regionales y Direcciones Regionales Sectoriales.
✓	Escasa capacitación sobre el contexto internacional, nacional y sectorial para interpretar adecuadamente el comportamiento de los indicadores de resultados a nivel regional.

Fuente: GRPPAT – SGCTP, archivos de informes y resoluciones 2023.
Elaborado: SGCTP y Equipo Técnico.

Cuadro N° 77: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023


N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Institucional	---	AOI00081800707 - ELABORACIÓN - INFORME DE EVALUACIÓN DE RESULTADOS PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL 2022		De acuerdo a la Guía para el Planeamiento Institucional (2019: 55) la evaluación identifica los resultados anuales generados por el PEI, así como los factores que contribuyeron a alcanzarlos	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín		31 Unidades Ejecutoras, 04 Gerencias Regionales y 09 Direcciones Regionales del Pliego 450 – Gore Junín	7,640.00	7,619.00	99.73%	100.00
 PLIEGO 450: Gobierno Regional del Departamento de Junín Informe de Evaluación de Resultados PEI - POI Correspondiente al año 2022 Junio, 2023 Sub Gerencia de Cooperación Técnica y Planeamiento 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se brindó acompañamiento y asistencia técnica a las unidades responsables durante el proceso de evaluación de resultados del PEI y POI. - Se precisó claramente las responsabilidades de cada unidad en la evaluación de resultados de los indicadores institucionales.						

documento para conocer el avance de cumplimiento de los OEI y las AEI, asimismo para la mejora continua de la gestión regional.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Cambios permanentes de los planificadores en las diversas Unidades Orgánicas.
- La planificación no está alineada con las prioridades actuales de la organización



Cuadro N° 79: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	Institucional	---	AOI00081800984 - PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN A LAS UNIDADES RESPONSABLES DE INDICADORES DEL PEI 2022		Conjunto de acciones sistemáticas y planificadas, orientadas a asegurar la correcta comprensión, aplicación y seguimiento de los indicadores del Plan Estratégico Institucional (PEI) 2022 por parte de las unidades responsables de su medición y cumplimiento.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín		31 Unidades Ejecutoras, 04 Gerencias Regionales y 09 Direcciones Regionales del Pliego 450 – Gore Junín	25,900.00	21,900.00	84.56%	100.00%
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
• Se brindó capacitación y orientación constante a las unidades responsables sobre la importancia de los indicadores del PEI, su metodología de cálculo, y los mecanismos de seguimiento y evaluación. • Se precisó claramente las responsabilidades de cada unidad en la medición, seguimiento y reporte de los indicadores. • Se aprobó el Plan Estratégico Institucional ampliado del Gobierno Regional para el periodo 2021-2026, con Resolución Ejecutivo Regional N°0227-2023-GR-JUNIN/GR, como insumo primordial para la formulación del Plan Operativo Institucional Multianual						

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)
- Falta de interés por parte de los jefes inmediatos de los planificadores, para asistir a las capacitaciones. - La rotación constante de planificadores en las unidades dificulta la continuidad del trabajo y la acumulación de conocimiento.

Cuadro N° 80: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	multisectorial		1. Elaboración del Plan Operativo Institucional Multianual 2024 – 2026. 2. Seguimiento del POI 3. Evaluación semestral y anual del POI		ELABORACION: comprende la programación multianual de las Actividades Operativas e Inversiones necesarias para ejecutar las Acciones Estratégicas Institucionales definidas en el PEI. SEGUIMIENTO: permite la identificación de alertas tempranas con base en desviaciones respecto a lo programado que conlleven a una evaluación de las medidas correctivas necesarias para mejorar la gestión. EVALUACION: se define como una valoración rigurosa de los planes institucionales en curso o finalizados para determinar los factores que contribuyeron o dificultaron alcanzar los efectos esperados con la finalidad de contribuir a la toma de decisiones para la mejora de la gestión pública.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Multiprovincial		Se avanzó en un 100% y los beneficiarios son las 32 Unidades Ejecutoras, 04 Gerencias Regionales y 09 Direccione Regionales del Pliego 450 – Gore Junín	Seguimiento 36,039.00	Elaboración Seguimiento 35,768.18	99.25 %	100 %
			Evaluación 2,400.00	Seguimiento 2,398.00	99.91 %	100 %
			Elaboración 3400	Evaluación 3,390.00	99.71	100 %

	
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
- Se logró capacitar a operadores de planeamiento de las distintas Unidades Orgánicas y Unidades Ejecutoras, en temas concernientes del Plan Operativo Institucional. - Aprobación del POI multianual 2024 – 2026, con Resolución Gerencial General Regional N° 073-2023-GR-JUNÍN/GGR, de fecha 02-05-23	
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
- Para la elaboración del Presupuesto Institucional de Apertura, no toman como insumo al Plan Operativo Institucional (POI) anual. - Se ha identificado que el Cuadro de Necesidades solicitado anualmente por la Oficina de Abastecimiento, no está acorde con el Plan Operativo Institucional. - La Sub Gerencia de Presupuesto debería de informarnos cuando se crea una nueva meta de actividades o inversiones para una oficina (centro de costo), lo cual nos impide la identificación del total de metas de una determinada oficina, y esto conlleva a no poder hacer un seguimiento eficaz y oportuno de metas financieras en el POI. - La Sub Gerencia de Presupuesto al momento de hacer su evaluación de metas solicitadas por el MEF, no es concordante con las unidades de medida de las metas de los centros de costo (Oficinas) de la sede regional. - Falta de interés por parte de los jefes inmediatos de los planificadores, para asistir a las capacitaciones en temas de Planeamiento Institucional. - Falta de desinterés por parte de alguno de los planificadores en conocer el sistema al cual pertenecen, así como desconocimiento cabal de las funciones dentro de cada oficina. - Falta de presupuesto para hacer el monitoreo inopinado a las distintas unidades Ejecutoras y Unidades Orgánicas del Gobierno Regional de Junín.	

Cuadro N° 81: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Regional	---	AUDIENCIAS PÚBLICAS REGIONALES DE RENDICIÓN DE CUENTAS	Las Audiencias Públicas Regionales, se dan en cumplimiento al marco legal establecido para tal fin. Por lo que se desarrolló la I y II Audiencia Pública Regional de Rendición de Cuentas 2023, en cumplimiento del Art. 24 de la Ley 27867.

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín	Población del departamento de Junín	S/ 162,650.00	S/ 162,336.60	99.81%	100.00%
					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
Informe de Rendición de Cuentas, dado a conocer a la población en general					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
--					

Cuadro N° 82: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

Nº	Sector de intervención (A)	Nº CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Regional	---	PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO REGIONAL BASADO EN RESULTADOS 2024		Se desarrolló el Proceso del Presupuesto Participativo Regional Basado en Resultados para el ejercicio fiscal 2024, de acuerdo al marco legal vigente.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)

Departamento de Junín	Población del departamento de Junín	S/ 50,939.00	S/ 41,961.43	82.38%	100%
					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
Se desarrollaron talleres regionales descentralizados con la participación de la población (agentes participantes acreditados)					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
--					

Cuadro N° 83: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Regional	---	CONDUCCIÓN DE LA SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN REGIONAL JUNÍN (CCR)		Se Conformó el Consejo de Coordinación Regional Junín para el periodo 2023 – 2024 y se desarrolló sesiones ordinarias y extraordinarias con el Consejo de Coordinación Regional Junín, a fin de tratar temas acordes al marco legal establecido (Presupuesto Participativo y PDRC).	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		Población del departamento de Junín	S/ 10,085.00	S/ 8,280.10	82.10%	33%



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se conformó el Consejo de Coordinación Regional Junín y se logró obtener la opinión consultiva sobre el Presupuesto Participativo y el PDRC.


PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

--

b. Sub Gerencia de Inversión Pública (OPMI)

Cuadro N° 84: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	MULTISECTORIAL	-	ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.		ELABORACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN PERIODO 2024-2026.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
MULTIPROVINCIAL DEPARTAMENTO DE JUNIN		TODA LA REGION	67,740.00	67,739.59	99.99	100
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha).						

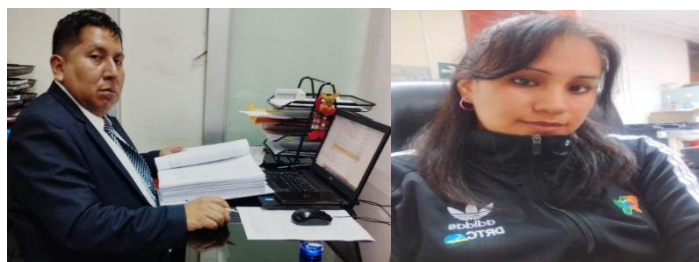

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

SE ELABORACION Y ACTUALIZACION DE LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES, ASI MISMO SE IDENTIFICO LAS BRECHAS SECTORIALES CON EL OBJETIVO DE PLANIFICAR Y SELECCIONAR LA CARTERA ESTRATEGICA DE PROYECTOS EN BASE A CRITERIOS DE PRIORIZACION RELACIONADOS A LA POBREZA, LAAS NECSIDADES DE LA POBLACION, LA EJECUTABILIDAD PRESUPUESTAL- REDUCCION DE BRECHAS.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEBE DE SER EN FORMA OPORTUNA.

Cuadro N° 85: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
2	MULTISECTORIAL	-	SEGUIMIENTO DE METAS PREVISTAS EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES		SEGUIMIENTO DE METAS PREVISTAS Y MONITOREO DE LA EJECUCION DE INVERSIONES.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
MULTIPROVINCIAL DEPARTAMENTO DE JUNIN		TODA LA REGION	333,302.00	330,885.30	99.27	100




PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

SE REALIZARON EL SEGUIMIENTO Y MONITOREO DE 506 PROYECTOS DE INVERSION DE METAS PREVISTAS EN LA PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEBE DE SER EN FORMA OPORTUNA.

Cuadro N° 86: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023


N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	MULTISECTORIAL	-	EVALUACION EX POST DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PREVISTOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES.		EVALUACIONES EX POST DE PROYECTOS DE INVERSION DETERMINADOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
MULTIPROVINCIAL		TODA LA REGION	15,437.00	15,436.51	99.99	100

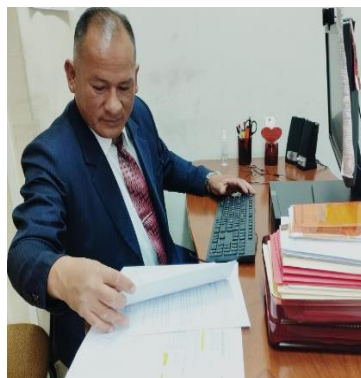

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)
SE REALIZARON 04 EVALUACIONES EX POST DE LOS PROYECTOS DE INVERSION PREVISTOS POR LA DIRECCION GENERAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSIONES.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)
LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEBE DE SER EN FORMA OPORTUNA.

c. Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial (SGAT)

Cuadro N° 87: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

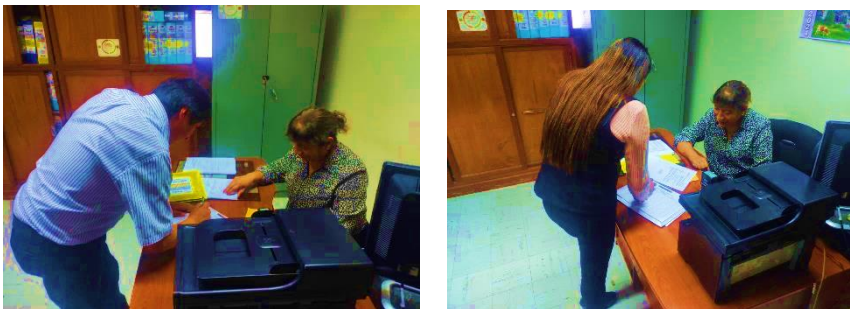
N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		ASESORAMIENTO EN ACCIONES DE DEMARCACIÓN TERRITORIAL		La actividad de asesoramiento en Acciones de Demarcación Territorial está enfocada en brindar información a la población y absolver dudas respecto a temas limítrofes.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		185 Usuarios	58,752.39	56,687,83	96.49%	100%
 Usuarios registrándose para asesoría en demarcación territorial en la Sub Gerencia de Acondicionamiento Territorial Fecha: 08/08/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró el 96.49% de ejecución de las metas financieras programadas respecto al Asesoramiento en Acciones de Demarcación Territorial						
Se logró el 100% de ejecución respecto al Asesoramiento en Acciones de Demarcación Territorial						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Surgen controversias y conflictos de intereses entre circunscripciones políticas y administrativas (Provincias y Distritos) complicando el proceso de demarcación y generando tensiones en la toma de decisiones.						

Cuadro N° 88: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023


N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
2	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia		ATENCIÓN DE PETITORIOS EN ACCIONES TECNICAS DE DEMARCACION TERRITORIAL		La actividad de atención de petitorios consiste en responder a dudas y/o peticiones de la población interesada en temas limítrofes	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		78 Usuarios	178,537.83	174,687.83	97.84%	84.78%
  Reunión técnica en Puerto Ene Mesa de Trabajo en Puerto Ene Fecha: 18 de octubre 2023 Fecha: 07 de diciembre 2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró el 97.84% de ejecución de las metas financieras programadas respecto a la Atención de Petitorios en Acciones Técnicas de Demarcación Territorial.						
Se logró el 100% de ejecución respecto a la Atención de Petitorios en Acciones Técnicas de Demarcación Territorial.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Cambios en las normativas y regulaciones relacionadas con la demarcación territorial pueden introducir incertidumbre y requerir adaptaciones en los procesos de atención						

1.8 OFICINA REGIONAL DE DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN (ORDITI)

Cuadro N° 89: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2613466	ADQUISICION DE COMPUTADORA (LABORATORIO), NETWORKING CORE DATA CENTER / EDIFICIO, SISTEMA ELECTRICO DATA CENTER (GRUPO ELECTROGENO, TTA/TTM, TRANSFORMADORES, SAI, STS) Y SOFTWARE; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL(LA) SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN, DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN		Comprende equipamiento con computadoras, laptops, software, impresoras, servidores.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo departamento de Junín		400 trabajadores	978,592	978,591.27	100%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
COMPUTADORA PERSONAL I 7, 16 GB RAM, 01 TB SSD						
PANTALLA INTERACTIVA DE 75" PULGADAS						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Oficinas equipadas en forma adecuada y óptima. - Softwares actualizados.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Demoras en los procesos de adquisición.						

Cuadro N° 90: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA		REDES LAN Y SOPORTE TÉCNICO		Comprende la administración de redes, el soporte de equipos informáticos, así como elaborar fichas técnicas y conformidades de equipos, y soporte a las necesidades del SIAF y SIGA	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de Huancayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		1000 trabajadores	366,898.15	366,898.15	100%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
Soporte de SIGA y SIAF para la sede Gobierno Regional Junín.						
Soporte de equipos de cómputo para el Gobierno Regional Junín y Sedes.						
Administración de redes – Data Center del Gobierno Regional Junín.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Soporte exitoso del SIGA y SIAF a nivel de la sede central y sus direcciones. - Se redujo las fallas de los equipos tecnológicos. - La Oficinas de Abastecimientos y servicios auxiliar se encuentra en buenas condiciones debido a la implementación de fibra óptica.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

1.9 OFICINA REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

a. Dirección Regional de Administración y Finanzas

Cuadro N° 92: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad/Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Dirección Regional de Administración y Finanzas ORAF		IMPLEMENTAR LAS RECOMENDACIONES DE LA CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA Y DE LA OFICINA REGIONAL DE CONTROL INSTITUCIONAL.		Disponer la implementar las observaciones emitidas por el Órgano de Control Institucional y la Contraloría General de la Republica.	
Ámbito Territorial de Intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (H)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución físico 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín			1,165,262.00 Soles	1,164,753.57 Soles	99.95%	100%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se dispuso la implementacion y se efectuo el seguimiento del 100% de las observaciones efectuadas por el Organo de Control Interno del Gobierno Regional Junin. - Se conformo la Comision Central y Comisiones Funcionales para la Implementacion de las Directivas emitidas por la DNCP del MEF. de Depuracion y Sinceramiento Contable del Pliego 450 Gobierno Regional Junin, efectuandose el seguimiento de su implementacion.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Cambios constates del personal y funcionarios de las Unidades Ejecutoras, viene retrasando la presentacion de las informaciones dificultando la consecucion de los logros de ejecucion presupuestal, presentacion de los Estados Financieros de Pliego e Implementacion de las observaciones emitidas por el Organo de Control Institucional y Contraloria General de la Republica.						

b. Oficina de Administración Financiera (OAF)

Cuadro N° 93: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad/Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Sub Dirección Regional de Administración Financiera OAF		ADMINISTRACION DEUDA INTERNA		La Oficina de Administración Financiera, durante el ejercicio presupuestal 2023, con relación a la actividad operativa ADMINISTRACION DEUDA INTERNA, Servicio de la deuda , cuenta con avance financiero de 52'298,560.85 Soles en el año 2023.	
Ámbito Territorial de Intervención de la actividad o proyecto (E) Ámbito de la Región Junín		Número y tipo de beneficiarios (F) 49 unidades Orgánicas 32 Unid. Ejecutoras	PIM 2023 S/ (H)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución físico 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín			56'958,526 Soles	52'298,560.85 Soles	91.81%	91.81%

PANEL FOTOGRAFICO: SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, responsable de la Sub Dirección.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
Con relación a la actividad operativa: ADMINISTRACION DEUDA INTERNA , la oficina de Administración Financiera ha efectuado pagos programados (12 cuotas) de las deudas contraídas por el monto de S/. 52'298,560.85 Soles durante el año 2023.	
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
Dificultades presentadas por la limitada asignación presupuestal para efectuar la actividad operativa.	

Cuadro N° 94: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad/Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Sub Dirección Regional de Administración Financiera OAF		ELABORAR INTEGRAR CONSOLIDAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN.		La Oficina de Administración Financiera a través de un profesional especialista en Integración Contable, verifica y contabiliza toda la documentación que sustenta los ingresos y gastos de las 32 Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional Junín, de conformidad a la normatividad vigente y cuyo órgano rector es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, y realiza la actividad operativa: ELABORAR, INTEGRAR, CONSOLIDAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE PLIEGO DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN , cuyo resultado es un Estado Financiero por mes, para luego sustentar y presentar a la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, cumpliéndose el principio de rendición de cuentas.. Así mismo efectuó acciones de Depuración y Sinceramiento Contable de Pliego del Gobierno Regional Junín.	
Ámbito Territorial de Intervención de la actividad o proyecto (E) Ámbito de la Región Junín		Número y tipo de beneficiarios (F) 49 unidades Orgánicas 32 Unid. Ejecutoras	PIM 2023 S/ (H)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución físico 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín			239,861.00 Soles	238,215.62 Soles	99.95%	100%

PANEL FOTOGRAFICO: INTEGRADOR CONTABLE DE PLIEGO 450 GOBIERNO REGIONAL JUNIN: responsable de la actividad



Cuadro N° 95: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad/Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Sub Dirección Regional de Administración Financiera OAF		FISCALIZACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL		La Oficina de Administración Financiera, a través de la Coordinación de Fiscalización, efectúa la revisión y fiscalización de los documentos y/o expedientes, que provienen de todas las unidades orgánicas de la Sede Central del Gobierno Regional Junín, para luego efectuar el registro SIAF SP de las fases de compromiso y devengado, la actividad operativa se denomina: FISCALIZACION Y EJECUCION PRESUPUESTAL , de conformidad a la normatividad vigente de la Ley de Administración Financiera para el Sector Público, cuya unidad de medida es FISCALIZACION APROBADA .	
Ámbito Territorial de Intervención de la actividad o proyecto (E) Ámbito de la Región Junín		Número y tipo de beneficiarios (F) 49 unidades Orgánicas	PIM 2023 S/ (H)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución físico 2023 (J)

Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		239,861.00 Soles	238,215.62 Soles	99.31%	100%
---	--	---------------------	---------------------	--------	------

PANEL FOTOGRAFICO: SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACION FINANCIERA, responsable de la Sub Dirección.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se efectuó la fiscalización del 100% de documentos y expedientes recibidos para ejecución presupuestal durante el 2023.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Dificultades presentadas por la limitada asignación presupuestal para efectuar la actividad operativa.

Cuadro N° 96: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad/Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Sub Dirección Regional de Administración Financiera OAF		CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE		La Oficina de Administración Financiera a través de la Coordinación de Tesorería, efectúa la recaudación de Ingresos y la ejecución de gastos, conforme al procedimiento que están normados en la Directiva de Tesorería del Sector Público.		
	Ámbito Territorial de Intervención de la actividad o proyecto (E) Ámbito de la Región Junín	Número y tipo de beneficiarios (F) 49 unidades Orgánicas 32 Unid. Ejecutoras	PIM 2023 S/ (H)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución físico 2023 (J)	

	Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		239,861.00 Soles	238,215.62 Soles	99.95%	100%
	PANEL FOTOGRAFICO: COORDINADORA DE TESORERIA, responsable de la Actividad: CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE. 					
	PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
	Con relación a la actividad operativa: CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE , se realiza conciliaciones que van a ser traducidos en ACTAS, los que son insumo para la elaboración de los Estados Financieros de la Sede Central y del Pliego del Gobierno Regional Junín, cumpliéndose lo programado en el Plan Operativo del año 2023.					
	PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
	Dificultades presentadas por la limitada asignación presupuestal para efectuar la actividad operativa.					

Cuadro N° 97: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad/Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Sub Dirección Regional de Administración Financiera OAF		ELABORAR, INTEGRAR, CONSOLIDAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN	La Oficina de Administración Financiera a través de la Coordinación de Contabilidad, verifica y contabiliza toda la documentación que sustenta los ingresos y gastos de la Sede Central del Gobierno Regional Junín, de conformidad a la normatividad vigente cuyo órgano rector es la Dirección General de Contabilidad Pública del Ministerio de Economía y Finanzas MEF, y realiza la actividad operativa: ELABORAR, INTEGRAR, CONSOLIDAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO

				REGIONAL JUNIN, y elabora y presenta un Estado Financiero por mes. Así mismo conforme la Comisión Central de Depuración y Sinceramiento Contable del Gobierno Regional Junín.	
Ámbito Territorial de Intervención de la actividad o proyecto (E) Ámbito de la Región Junín	Número y tipo de beneficiarios (F) 49 unidades Orgánicas	PIM 2023 S/ (H)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución físico 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		239,861.00 Soles	238,215.62 Soles	99.95%	100%

PANEL FOTOGRAFICO: COORDINADORA DE CONTABILIDAD, responsable de la Actividad: CONCILIACION DE CUENTAS DE ENLACE.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Con relación a la actividad operativa: **ELABORAR, INTEGRAR, CONSOLIDAR Y PRESENTAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA SEDE CENTRAL DEL GOBIERNO REGIONAL JUNIN**, presenta Estados Financieros mensuales y Estados Financieros anual de la Sede Central del GRJ., cumpliéndose lo programado en el Plan Operativo del año 2023 y efectuó acciones de depuración y sinceramiento contable. Así mismo se efectuó las acciones de Depuración y Sinceramiento Contable de acuerdo a las normas de la DNCP del MEF.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Dificultades presentadas por la limitada asignación presupuestal para efectuar la actividad operativa.

c. Oficina de Recursos Humanos

Cuadro N° 98: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN		CURSO DE SISTEMA DE CONTROL INTERNO		El objetivo principal de este curso es lograr que los funcionarios y servidores desarrollen una mayor y mejor comprensión de la implementación del control interno, vean al control interno como una herramienta de gestión, orientada a prevenir riesgos y promover la eficiencia, eficacia, transparencia y economía, así como resguardar los recursos del Estado y mitigar irregularidades o actos de corrupción	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
GRJ		67 Trabajadores	S/. 8,000.00	S/. 8,000.00	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logró capacitar al 100% de trabajadores estimados en el PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP 2023.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Algunos directivos no brindan facilidades a los servidores para poder asistir a los cursos.
- Falta de compromiso de funcionarios y servidores en asistir al 100% del curso.
- Falta de mayor asignación de presupuestos para cursos de capacitación

Cuadro N° 99: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN		CURSO DE PLANEAMIENTO ESTRATEGICO EN EL SECTOR PUBLICO		El objetivo principal de este curso es lograr que los servidores desarrollen una mayor y mejor comprensión de los aspectos teóricos y prácticos de la planeación estatal aplicados por el Estado peruano.

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
GRJ	52 Trabajadores	S/. 7,000.00	S/. 7,000.00	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logró capacitar al 100% de trabajadores estimados en el PLAN DE DESARROLLO DE PERSONAS PDP 2023.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Algunos directivos no brindan facilidades a los servidores para poder asistir a los cursos.
- Falta de compromiso de funcionarios y servidores en asistir al 100% del curso.
- Falta de mayor asignación de presupuestos para cursos de capacitación


d. Oficina de Gestión Patrimonial

Cuadro N° 100: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto ©	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Institucional		ELABORACION DE INFORMES TECNICOS Y EMITIR RESOLUCIONES DE ALTAS Y BAJAS,ADMINISTRACION Y DISPOSICION DE BIENES PATRIMONIALES	La actividad contempla la ejecución de Altas, Bajas y Disposición de Bienes Muebles Patrimoniales teniendo como meta la ejecución de 26 Resoluciones y 3 Informes Técnicos, se ejecutaron 29 entre Resoluciones y Informes Técnicos de altas y baja y disposición de bienes muebles de Gobierno Regional Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)

Provincia de Huancayo, Tarma, Chanchamayo Satipo Departamento de Junín	31 Municipios 03 Institutos de Educación Superior Tecnológicos 1017 Baja Disposición por RAEE	9360,00	9,358.00	99.97	96.55
---	--	---------	----------	-------	-------

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se donó 1610 bienes muebles por causal de RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) de acuerdo a la Directiva N° 001-2020-EF/54.01 Aprobada con la Resolución N°08-2021-EF/54.01.
Se entregó en Afectación en Uso 93 bienes muebles-equipos menores de construcción a 31 Municipalidades Distritales y Centros Poblados.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Falta de apoyo logístico como es Movilidad, equipos de seguridad y falta de presupuesto

Cuadro N° 101: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto ©		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Institucional		ELABORACION Y ACTUALIZACION DE FICHAS DE ASIGNACION DE BIENES, NOTAS DE SALIDA, NOTAS DE ENTRADA DE BIENES PATRIMONIALES		La actividad consiste en la elaboración del formato de fichas de asignación cuando se entrega bienes al trabajador de oficina y bienes a proyectos que ejecutan obras, así mismo las Notas de entrada y salida consiste en la elaboración del formato cuando se entrega bienes a solicitud de una Gerencia Sub Gerencia, Direcciones para el cumplimiento de sus funciones.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo (Sede central, oficinas descentralizadas en las provincias de Tarma, Chanchamayo, Satipo, Departamento de Junín)		474 bienes para oficinas 150 bienes para Obras	1,500,00	1,496,00	100.00	98.88

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logro la movilización, entrega y salida de los 624 bienes muebles patrimoniales para el cumplimiento de metas programadas en el año 2023


PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Falta de movilidad para el recojo, traslado, monitoreo de los bienes asignados a los trabajadores y a las diferentes obras y otras entidades.

Cuadro N° 102: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto ©		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Institucional		REGISTRO Y CONTROL DE BIENES PATRIMONIALES EN EL SIGA MODULO PATRIMONIO Y EMITIR EL INVENTARIO PATRIMONIAL TRIMESTRAL Y ANUAL BEBIDAMENTE CONCILIADO CON CONTABILIDAD		La actividad consiste en dar de alta los bienes patrimoniales adquiridos por el Gobierno Regional y registrarlo en el Sistema denominado SIGA-Modulo Patrimonio, los bienes registrados en este sistema están interrelacionados con el MEF y el Gobierno Regional Junín para un mejor control y ubicación de los bienes del Estado	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		624 bienes patrimoniales que beneficia al Gobierno Regional Junín	7,288,00	7,287.25	89.06	66.67

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Atraves del nuevo Sistema SIGA-PATRIMONIO a mejorado el debido control de los bienes patrimoniales adquiridos por el Gobierno Regional Junín esto genera el mejor control de los bienes.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Falta de capacitación para el manejo del Sistema SIGA-Patrimonio
Falta apoyo con personal con conocimiento del Sistema SIGA-Patrimonio
Falta de equipo adecuado a la tecnología actual del sistema Siga-Patrimonio

EJE ECONÓMICO – OER 4: CRECIMIENTO ECONÓMICO SOSTENIBLE CON ALTO EMPLEO

1.10 GERENCIA REGIONAL DE DESARROLLO ECONÓMICO

a. Sub Gerencia de Promoción de Inversiones

Cuadro N° 103: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	PRODUCCION		ORGANIZACIÓN DE PRODUCTORES MANUFACTURERA	DE FERIAS PARA E INDUSTRIA	SE REALIZARON 2 FERIAS EN EL AÑO, DE VENTA Y PROMOCION DE CERVEZA ARTESANAL EN LA REGION JUNIN ACOMPAÑADO DE GASTRONOMIA REGIONAL	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín, Provincia de CHANCHAMAYO		15 PRODUCTORES DE CERVEZA Y 25 MICROEMPRESARIOS DEL SECTOR GASTRONOMICO	1,885.00	1,717.00	91.09%	100.00
(INSTALACIONES DEL NUEVO MERCADO DE PRODUCTORES GRAU – EL TAMBO LOS DIAS 27,28 Y 29 DE OCTUBRE)						
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
SE LOGRA PONER EN VALOR LA CERVECERIA ARTESANAL QUE TENEMOS EN LA REGION Y SE PRETENDE PONER A LA ALTURA DE LAS CERVECERIAS DE PAISES COMO ALEMANIA,ESPAÑA Y DEMAS SOSTENIENDO UN CONSUMO RESPONSABLE Y APOYANDO A LA PRODUCCION LOCAL CON PRODUCTOS RECONOCIDOS EN NUESTRA REGION Y A SU VEZ ASPIRANDO A SER LOS PRODUCTORES DE CEBALA QUE EN LOS AÑOS '80 SE LOGRO SER PARA PROVEER A NIVEL NACIONAL Y POR QUE NO SUDAMERICANO DE UNA BUENA MATERIA PRIMA, PARA LO CUAL SE PROPUSO SE CONFORME UNA ASOCIACION DE CERVECEROS ARTESANALES DEL CENTRO DEL PERU.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
NO SE TUVO DIFICULTADES						

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	PRODUCCION		TALLER PARA MEJORAR CAPACIDADES EN GESTION Y ASOCIATIVIDAD EMPRESARIAL		TALLER REALIZADO PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS EMPRESARIOS MYPE EN GESTIÓN Y ASOCIATIVIDAD, INCENTIVANDO Y HACIENDO CONOCER LOS BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD PARA CUBRIR ESPACIOS DE MAYORES DEMANDAS	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín		120 MUJERES EMPRENDEDORAS Y MICRO EMPRESARIAS	4,720.00	4,720.00	100%	100.00

(AUDITORIO DE LA DIREPRO JUNIN EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DEL 2023)



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

SE REALIZARON 2 TALLERES DIRIGIDOS PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LOS EMPRESARIOS MYPE (PRINCIPALMENTE MUJERES) EN GESTIÓN Y ASOCIATIVIDAD, INCENTIVANDO Y HACIENDO CONOCER LOS BENEFICIOS DE LA ASOCIATIVIDAD PARA CUBRIR ESPACIOS DE MAYORES DEMANDAS, EMPODERANDO SU ESFUERZO QUE REALIZAN PARA MEJORAR LA CONDICIÓN DE VIDA DE SUS HOGARES Y PONIENDO EN VALOR REAL LA MANO DE OBRA, INTELIGENCIA Y PROACTIVIDAD DE LAS MUJERES DONDE LAS MISMAS RECONOCIERON LAS FORTALEZAS Y OPORTUNIDADES QUE TENDRIAN EN CASO DE LOGRAR SU ASOCIATIVIDAD

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

NO SE TUVO DIFICULTADES

b. Dirección Regional de Agricultura (DRAJ)

Cuadro N° 104: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA		PPR 121 - MEJORA DE LA ARTICULACION DE PEQUEÑOS PRODUCTORES AL MERCADO		Se articuló a pequeños productores haciendo un total de 2,500 productores dedicados principalmente a las cadenas productivas en el ámbito de la región Junín principalmente en sierra y selva atendiendo las cadenas productivas de cultivos en sierra (papa nativa, maíz amiláceo, quinua y paltos) y selva (café, cítricos, palto plátano/ banano, cacao y piña). en las cadenas de productivas de crianzas principalmente en sierra (animales menores (cuy), vacunos y ovinos)	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
9 Provincias x 124 distritos Y Anexos		2500 pequeños productores agropecuarios	398,686	398,669	100 %	54%



Capacitación para la formación de semilleros Juzgadores de Animales Menores



Capacitación a profesionales, promotores y productores a través de ECAS en el ámbito regional

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Mejoramiento de las capacidades comerciales gestionando empresarialmente hacia el mercado a través de actividades programadas en el POI- 2023 a 2500 productores.
- ✓ Se logró formar juzgadores de animales menores de forma institucional a nivel de la región Junín, mediante el desarrollo de capacitaciones a profesionales y productores representativos de cada agencia agraria con la participación del comité multisectorial por el Día Nacional de Cuy.
- ✓ Se realizaron capacitaciones a profesionales, promotores y productores a través de ECAS en ámbito de la región Junín tanto en sierra y selva, capacitando en total a 300 personas.
- ✓ Por el día nacional de la alimentación se preparó desayunos saludables y estas fueron compartidas a las escuelas vulnerables de la provincia de Concepción, siendo un total de 500 desayunos repartidos.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Falta de profesionales responsable de las diferentes cadenas productivas en las Agencias Agrarias.
- ✓ No se cuenta con profesionales estables, generando atraso al cumplimiento de metas.
- ✓ El contrato corto del personal responsable de las cadenas productivas (3 meses y/o al mes fueron rotados a otras agencias Agrarias)
- ✓ Falta de presupuesto y logística para realizar las diferentes actividades
- ✓ Falta de oportunidades de capacitación a los profesionales de la unidad.

Cuadro N° 105: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	AGRICULTURA		APNOP - PROMOCION DE LA COMPETITIVIDAD AGRARIA	Se mejoró las capacidades productivas de 8,700 productores dedicados a las cadenas productivas priorizadas el ámbito de la región Junín principalmente en sierra y selva atendiendo las cadenas productivas de cultivos en sierra (papa nativa, maíz amiláceo, quinua y paltos) y selva (café, cítricos, palto plátano/ banano, cacao y piña) y en crianzas (animales menores, vacunos y ovinos). La promoción de la competitividad agraria está basada en el fortalecimiento de las capacidades productivas de los pequeños productores agropecuarios organizados que acceden a servicios de capacitación y asistencia técnica para implementar sistemas de gestión de calidad y la participación en ferias locales, nacionales e internaciones en las cadenas productivas priorizadas.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
9 Provincias x 124 distritos Y Anexos		8,700 pequeños productores agropecuarios	1,406,285	1406,279	100 %	80 %

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Participación de productores organizados en ferias.



Asistencia técnica en la producción de plantones de café.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Se mejoró las capacidades productivas en manejo del cultivo de café.
- ✓ Se logró fortalecer las capacidades productivas con las capacitaciones y asistencias técnicas a 8,700 pequeños productores de las diferentes cadenas productivas priorizadas.
- ✓ Se transfirió tecnología en información para mejorar las capacidades productivas de los productores, realizando cursos en las diferentes etapas fenológicas del cultivo en control de plagas y enfermedades.
- ✓ Se transfirió tecnología en información para mejorar las capacidades productivas de los productores, realizando cursos en las diferentes etapas de desarrollo de animales para el control en el manejo, sanidad, alimentación, reproducción y mejoramiento genético.

- ✓ Participación de los pequeños y medianos productores agropecuarios en las diferentes ferias y eventos programas en el calendario regional de ferias y eventos agropecuarios.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Insuficiente presupuesto para los gastos operativos de campo.
- ✓ Falta de articulación con las Instituciones del estado que tienen que ver con el sector agrario, trabajan cada uno por su lado.
- ✓ Falta de personal técnico en las Agencias Agrarias, en las diferentes cadenas productivas para la ejecución del plan operativo institucional (P.O.I)
- ✓ Dotación de movilidad en estado operativas para las Agencias Agrarias las que tienen son obsoletas donde no hay seguridad para el personal técnico
- ✓ Implementación de equipos de cómputo e impresora multifuncional para la Oficina de las Cadenas productivas de crianzas y cultivos.
- ✓ Limitado conocimiento de la tecnología virtual de parte de los productores.

Cuadro N° 106: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA	2610692	"ADQUISICIÓN DE EQUIPO PARA INSEMINACIÓN ARTIFICIAL DEMOSTRATIVO; EN EL (LA) DIRECCIÓN REGIONAL DE AGRICULTURA, DISTRITO DE EL TAMBO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNÍN"		La IOARR de Reposición será mediante la adquisición de 01 generador de nitrógeno líquido de 60 litros, 07 tanques criogénico de 50 litros ,07 tanque criogénico de 2 litros, 07 Ecógrafo veterinario portátil, 07 Termo descongelador, 07 Pistola de inseminación con cámara portátil e implementos, orientado a mejorar el proceso de inseminación artificial en el ganado vacuno a nivel de las provincias de Huancayo, Chupaca, Concepción, Jauja, Tarma, Junín y Yauli.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
7 provincias		107 Distritos	55,770	55,770	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Adquisición de 7 tanques criogénicos de 2 Litros, adquisición de 7 termos des congelador, adquisición de 14 pistolas de inseminación con cámara portátil e implementos de inseminación artificial.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se realizó la adquisición de 7 tanques criogénicos de 2 Litros, adquisición de 7 termos des congelador, adquisición de 14 pistolas de inseminación con cámara portátil e implementos de inseminación artificial.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuando se solicitó los requerimientos sobrepaso las 8 UIT por lo cual se necesitaba un proceso de selección el cual demora aproximadamente 3 meses y no se iba a culminar en el AÑO FISCAL 2023

Cuadro N° 107: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA	2264599	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFÉ, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN		El proyecto trabaja con organizaciones productores agrarios formalizados en pequeñas empresas agropecuarias y cooperativas agropecuarias el busca el desarrollo de capacidades técnicas los componentes que tienen el proyecto son: - Desarrollo de capacidades asociativas de los productores. - Mejora de la calidad de la producción agropecuaria. - Mayores conocimientos sobre mercados.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Región por 9 Provincias		4600 Productores Agropecuarios	2,772,038	2,672,616.75	96,41 %	72.46 %
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
   Escuela de Campo – Tauribamba acopalca Participación en ferias DRAJUNIN Asistencia técnica Runatullo						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
De acuerdo a los Componentes: - Desarrollo de Capacidades Técnicas de los Productores 99,61% de avance que a su vez tiene los sub componentes: Líneas de base, Implementación de concursos (planes de implementación), implementación de módulos demostrativos. - Mayores conocimientos sobre Mercados 81.54% de avance tiene sub componentes: Articulación a mercados, Estudios de Mercado, Gastos COVID: - Desarrollo de Capacidades de la DRA JUNIN 92.96 % de avance este componente se refiere a la implementación del 'área de difusión de la DEIA con vestuario, equipos de cómputo especializado (diseño gráfico), Implementación de agencias agrarias de la DRAJUNIN a través de equipos de cómputo, periféricos de computación (impresora multifuncional) ,vestuario, útiles de escritorio, seguimiento y monitoreo de planes de servicios agrarios mediante la dotación de combustible (30 galones por Agencia Agraria por mes).						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Proceso de formalización de varias organizaciones con resultados inconclusos y no formalizados demoras en entidades SUNARP						

Dentro del presupuesto y el descriptivo del analítico no se consideró gastos por viáticos de los profesionales: Asistente de Residente, Asistente de Supervisor para realizar seguimiento de actividades desarrolladas de los diferentes planes de implementación en la mayoría de ocasiones fueron cubiertos por los mencionados profesionales.

Cuadro N° 108: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA	2144078	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES EN LA CONSERVACION, MANEJO Y APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA VICUÑA (VICUGNA VICUGNA) EN LAS COMUNIDADES CAMPESINAS DE LA REGION JUNIN		Fortalecer la conservación de los recursos naturales y transferencia tecnológica para desarrollar un manejo sostenible de los recursos naturales por medio de capacitaciones, asistencia técnica, habilitación y rehabilitación de cercos y equipamiento, formación de guardas comunales, repoblamiento de vicuñas, fortalecimiento institucional comunal y su aplicación práctica al manejo desarrollando talleres de capacitación en liderazgo, sensibilización social para la conservación y protección, gestión empresarial y comercialización, integración de las comunidades a nivel regional, fomento de la competitividad y articulación al mercado mediante capacitación en el proceso de transformación primaria de la fibra, construcción de un centro de acopio de fibra y transformación.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
5 provincias y 17 distritos		31 comunidades	104,173	47,668	45.8%	90 %
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.  Entrega de Kits Veterinario a las comunidades beneficiarias.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se realizó la entrega de Kits Veterinarios a las comunidades beneficiarias de repoblamiento de vicuñas.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- No se llegó a realizar la liquidación del Proyecto debido a que el presupuesto fue extornado por el Ministerio de Economía y Finanzas.						

Cuadro N° 109: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA		PP 121 GENERACION Y ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION DE MERCADOS		Consiste en la producción de la estadística agraria, pecuaria, agroindustrial, precios de mercado, en la región, desarrollando estrategias de comunicación que permitan llegar adecuada y oportunamente a los productores y agentes económicos, con información útil y confiables para la toma de decisiones, así mismo la coordinación para el desarrollo del Sistema Integrado de Estadística Agraria en el ámbito de la región, Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Región: Junín Provincias: Chanchamayo, Chupaca, Huancayo, Concepción, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli Sectores Estadísticos: 446		Durante el año 2023 se ha logrado alcanzar (1887) productores beneficiados con el acceso a la información agraria ofertada por la DRAJ.	84,221	84,219	100	100

PANEL FOTOGRÁFICO



Recolección de información de mercado Mayorista.

Leche, Provincia de Huancayo



Difusión de información estadística, Satipo.

Difusión de información estadística a productores agrarios, así misma recolección de información de mercado de los principales centros a abasto de la región Junín.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Productores agropecuarios recibieron información estadística agraria especializada sobre mercados, a quienes ha permitido incursionar con éxito a los mismos
- ✓ Difusión de información, reuniones y boletines informativos sobre estadística agrícola, pecuaria y asistencia técnica en la región Junín.
- ✓ Información actualizada según la campaña agrícola.
- ✓ La información recopilada esta sistematizada y publicada al alcance de todo el público en general mediante aplicativo SIEA MIDAGRI.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ Limitado recursos económicos y asignación de viáticos y movilidad local para los servidores dedicados a la actividad dentro del ámbito de las Agencias Agrarias.
- ✓ Escaso personal capacitado para la ejecución de las actividades de Información Agraria
- ✓ Limitado apoyo logístico para el cumplimiento de las actividades de Información Agraria en las Agencias y Oficinas Agrarias
- ✓ Mínima dotación de materiales de escritorio para los responsables de la actividad estadística.
- ✓ Deficiente dotación de logística (vehículos, motocicletas y equipos de cómputo) al personal de estadística. No se cuenta con una unidad móvil asignada a la Dirección de Estadística e Información Agraria.
- ✓ Los Equipos Informáticos de la Dirección de Estadística e Información Agraria se constituyen en obsoletas cuando se requiere instalar aplicativos estadísticos actualizados.

Cuadro N° 110: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA	APNOP	PROCESO DE FORMALIZACION Y TITULACION DE PREDIOS RURALES INDIVIDUALES		Proceso de saneamiento de predios rurales individuales de aquellos poseedores que realizan cultivos agrícolas en el predio, según las características de las zonas de intervención, así como: Café, Maíz, Yuca, Naranja, Eucalipto, plátano, etc; dentro de la Región Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Satipo, Pichanaqui, Pampa Hermosa y Tapo		234 títulos de propiedad que benefician a mas de 600 familias	861,830.00	861,821.00	100	29.25 %

PANEL FOTOGRÁFICO



Entrega de títulos de propiedad en la provincia de Satipo, 2023 Presentación e inscripción de títulos en la OR Satipo, 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- 234 Títulos de propiedad en la provincial de Satipo, de los cuales 121 están inscritos en la SUNARP
- Se entregó 672 títulos de propiedad en las Provincias de Satipo y Chanchamayo, como producto de la continuidad del proceso de titulación que quedó pendiente del 2022.
- Mas de 800 expedientes de titulación conformados en los distritos de Tapo, Pichanaqui y Satipo, para la emisión del título y formalización de los poseedores dedicados a la agricultura familiar, en el 2024.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

1. La exoneración de tasas registrales para la inscripción de los actos en el RdP (SUNARP), que dificulta en el acceso de información de los antecedentes registrales (CBC, título archivado, copia literal).
2. El CTCUM de los predios ubicados en selva y ceja de selva.
3. Acceso a la data geodesica del IGN

Cuadro N° 111: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	AGRICULTURA	2473255	PROYECTO: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE CATASTRO, TITULACIÓN Y REGISTRO DE PREDIOS RURALES EN TODAS LAS PROVINCIAS Y DISTRITOS DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN; DISTRITO DE CHANCHAMAYO – PROVINCIA DE CHANCHAMAYO – DEPARTAMENTO DE JUNÍN		Difusión de información y ejecución del Proceso de Saneamiento Físico Legal de las Unidades territoriales de intervención en predios agrícolas de productores agropecuarios.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		279 TITULOS INSCRITOS	1,693,594.00	1,670,379.46	98.63	55.80

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.

Imagen N° 01: Elaboración de 20 estudios de diagnóstico físico legal.




Imagen N° 02: 2,635 predios liderados en selva y Sierra.



Imagen N° 04: Proceso de Publicación de poseedores calificados como Aptos – PERENE IV.



Imagen N° 05: Proceso de Publicación de poseedores calificados como Aptos – PERENE III.

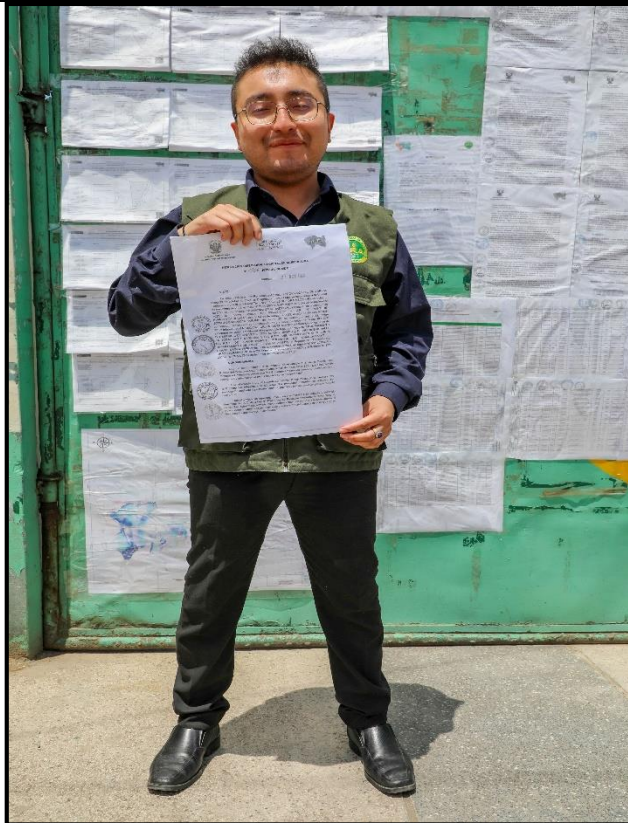

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Se realizó la creación de 28 Unidades Territoriales mediante Informes Técnicos como primera actividad en el proceso de saneamiento y formalización de predios rurales individuales.
- Se realizó la determinación de 24 Unidades Territoriales mediante Resolución Directoral Regional de Agricultura como primera etapa del proceso de saneamiento y formalización de predios rurales individuales.
- Se realizó el diagnóstico físico legal de veinte (20) Unidades Territoriales.
- Se realizó el ingreso de 1062 expedientes a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP para el acto de anotación preventiva en cinco (05) Unidades Territoriales del Departamento de Junín.
- Se realizó la emisión seis (06) Resoluciones Directorales Regionales de Agricultura para su declaración como propietarios a poseedores calificados como aptos mediante el Procedimiento Administrativo de Prescripción Adquisitiva de Dominio.
- Se realizó la emisión de 977 Instrumentos (Certificado Registrado de Declaración de Propiedad Rural) en seis (06) Unidades Territoriales del Departamento de Junín.
- Se realizó el ingreso de 662 expedientes a la Superintendencia Nacional de Registros Públicos – SUNARP para el acto de anotación definitiva en seis (06) Unidades Territoriales del Departamento de Junín, registrando de esa manera su propiedad.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Adaptación de los procesos de saneamiento y formalización en el ámbito de selva y ceja de selva, al cambio del Reglamento de Clasificación de Tierras por su Capacidad de Uso Mayor – CTCUM, el cual agrega el estudio de levantamiento de cobertura vegetal (bosques) al estudio de levantamiento de suelos.

c. Dirección Regional de Comercio exterior y Turismo (DIRCETUR)

Cuadro N° 112: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
1	Turismo		PROMOCIÓN INTERNA DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS		Con el objetivo de posicionar a la Región Junín como principal destino turístico a nivel nacional, se ha realizado la impresión y difusión del calendario turístico de la Región Junín, por zonas de desarrollo turístico; asimismo, se ha realizado la promoción de Semana Santa, Semana Turística de Selva Central, Fiestas Patrias y Día Mundial del Turismo, en los principales mercados emisores (Lima y Huancayo).	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
09 provincias de la Región Junín		Visitantes, prestadores de servicios Turísticos, gobierno locales y población de la Región	385,893	385,093	100	100

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.		
		
Actividad: Promoción interna de los destinos turísticos. Lugar: Lima Fecha: 19 de abril del 2023	Actividad: Promoción interna de los destinos turísticos. Lugar: Lima Fecha: 08 de junio del 2023	Actividad: Promoción interna de los destinos turísticos. Lugar: Lima Fecha: 01 de agosto del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS		
• A setiembre de 2023 se registraron 1,021,954 arribos a la Región Junín, según el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. • Promoción de Semana Santa Junín 2023 (Conferencia de prensa y Feria turística) • Promoción de la XVIII Semana Turística Selva Central. (2 Press Tours, 2 Conferencia de Prensa y 2 Feria Turística) • Promoción de Fiestas Patrias Junín 2023 (Pasacalle, Rueda de Prensa y 2 Press Tours) • Promoción del Día Mundial del Turismo Junín 2023(2 Pasacalles, Lanzamiento y Desfile) • Organización del Lanzamiento y Conferencia de Prensa del Campeonato Valle del Downhill Tarma 2023 • Organización del lanzamiento de la “XXII Maratón Internacional Selva Central - Orlando Cárdenas Muje 2023		
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS		
• Limitada asignación presupuestal para ejecutar las actividades programadas en la Sub Dirección de Turismo.		

Cuadro N° 113: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
2	Turismo		CONSERVACIÓN Y PUESTA EN VALOR DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS		Con la finalidad de contribuir con la planificación turística y el desarrollo de las inversiones, se ha realizado el registro y jerarquización de recursos turísticos; asimismo, se ha gestionado el financiamiento para estudio de preinversión y expediente técnico de proyectos de inversión pública, así como el recorrido de reconocimiento de circuito turístico.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Provincias de Huancayo, Chanchamayo y Satipo		68 Municipalidades y prestadores de servicios turísticos.	S/. 15,196	S/. 15,196	100	100

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Actividad: Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos
Lugar: Auditorio del Lugar de la Memoria
Fecha: 30 y 31 de mayo del 2023



Actividad: Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos
Lugar: Valle del Mantaro - Canipaco
Fecha: 24 de noviembre del 2023



Actividad: Conservación y puesta en valor de los recursos turísticos
Lugar: Convento de Santa Rosa - Concepción
Fecha: 25 de julio del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS	
- Se realizó 25 registros de recursos turísticos en el Inventario Nacional de Recursos Turísticos y 05 jerarquizaciones. - Asignación Presupuestal para elaboración de ficha técnica del proyecto de inversión pública "Mejoramiento de los Servicios Turísticos Públicos en Recursos Turísticos en la Conmemoración del Bicentenario de la Batalla de Junín" y expediente técnico con saldos de obra del proyecto de inversión pública "Puesta en Valor y Promoción del Corredor Turístico Tarma – Selva Central en la Región Junín". - Recorrido de reconocimiento del Circuito Turístico del Valle del Canipaco.	
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS	
- Demora en la contratación de personal CAS temporal, para dotar de más personal profesional en la Sub Dirección de Turismo. - Priorización de actividades de la Dirección Regional, enfocados a promoción turística. - Limitada asignación presupuestal para ejecutar las actividades programadas en la Sub Dirección de Turismo.	

Cuadro N° 114: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

Nº	Sector de intervención	Nº CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
3	Turismo		REGULACIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS		En el marco de la aplicación de la regulación para prestadores de servicios turísticos, se ha atendió trámites de clasificación, categorización y expedición de constancias; asimismo, se ha impulsado la verificación del cumplimiento de la normatividad legal vigente, habiendo realizado el asesoramiento y supervisión establecimientos de prestadores de servicios turísticos, operativos, acciones en materia de supervisión y opinión técnica relacionada al tema ambiental, mediante participación en diversas reuniones de comisiones y comités ambientales, y la implementación de actividades en el marco del PLANEFA.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Provincias de Huancayo Chanchamayo, Satipo, Tarma y Jauja.		202 Prestadores de servicios turísticos	15,488	15,488	100	100

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Actividad: Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos
Lugar: Huancayo
Fecha: 06 de noviembre del 2023



Actividad: Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos
Lugar: Panca - Jauja
Fecha: 06 de diciembre del 2023



Actividad: Regulación y supervisión de los prestadores de servicios turísticos
Lugar: Chilca – Restaurant Cuatro
Fecha: 15 de mayo del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
- Expedición de 61 constancias emitidas a EE.HH, 46 agencias de viaje, clasificación de 4 restaurantes. 30 acciones de Supervisión Orientativa. 10 Operativos Inopinados. - Publicación de la Guía metodológica para la elaboración del Plan de Desarrollo Turístico Local. - Publicación de la Encuesta Mensual de Turismo 2023 para establecimientos de Hospedaje en Redes Sociales. 17 Acciones de supervisión ambiental. - Atención de denuncia ambiental por vertimiento de aguas contaminadas hacia la Laguna de Paca.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS
Débil capacidad operativa de la Sub Dirección de Turismo, a nivel de recursos humanos especializados, mayor asignación presupuestal en gasto corriente e inversiones y equipamiento.

Cuadro N° 115: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
7	Turismo		GENERACIÓN Y DIFUSIÓN DE INFORMACIÓN ORIENTADA A PROMOVER LA INVERSIÓN PÚBLICA Y PRIVADA EN EL SECTOR TURÍSTICO		Con el propósito de orientar la toma de decisiones y promover la inversión pública y privada, en base a información estadística actualizada, se ha efectuado el registro de estadísticas de establecimiento de hospedaje, así como la actualización del directorio y base datos de prestadores de servicios turísticos.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Huancayo, Chupaca, Junín, Tarma, Yauli, Jauja, Chanchamayo, Satipo, Concepción		220 Prestadores de servicios turísticos	S/. 40,619	S/. 40,619	100	100

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Actividad: Generación y difusión de información orientada a promover la inversión pública y privada en el sector turístico.
Lugar: DIRCETUR
Fecha: 13 de diciembre del 2023



Fuente: Junín. Reporte Regional de Turismo Diciembre 2023- DIRCETUR

Actividad: Generación y difusión de información orientada a promover la inversión pública y privada en el sector turístico.
Lugar: Reporte Regional de Turismo
Fecha: 09 de diciembre del 2023



Actividad: Generación y difusión de información orientada a promover la inversión pública y privada en el sector turístico.
Lugar: Redes Sociales - DIRCETUR
Fecha: 18 de julio del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

- 118 Actualizaciones del directorio y base de datos de prestadores de servicios turísticos.
- 1,962 estadísticas mensuales de establecimientos de hospedaje.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS

- Débil capacidad operativa de la Sub Dirección de Turismo, a nivel de recursos humanos especializados, mayor asignación presupuestal en gasto corriente e inversiones y equipamiento.

Cuadro N° 116: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
8	Turismo	2031761	PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TARMA – SELVA CENTRAL EN LA REGIÓN JUNÍN		Elaboración del expediente técnico de saldos de obra del PIP “PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TARMA – SELVA CENTRAL EN LA REGIÓN JUNÍN”, que contempla infraestructura (05 señaléticas y 03 casetas turísticas, en Perene y Pichanaqui), fortalecimiento de capacidades (sensibilización y capacitación a prestadores de servicios turístico) y promoción turística, con la finalidad de mejorar los servicios turísticos e incrementar la afluencia turística.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Provincias de Tarma, Chanchamayo y Satipo		77,280 personas	62,000	62,000	100	100.00

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TARMA –SELVA CENTRAL EN LA REGIÓN JUNÍN
Lugar: Huagapo
Fecha: 17 de setiembre de 2023



PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TARMA –SELVA CENTRAL EN LA REGIÓN JUNÍN
Lugar: Parque Santa Ana – Perené
Fecha: 17 de setiembre de 2023



PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TARMA –SELVA CENTRAL EN LA REGIÓN JUNÍN
Lugar: Pichanaqui
Fecha: 17 de setiembre de 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Aprobación del expediente técnico de saldos de obra del PIP “PUESTA EN VALOR Y PROMOCIÓN DEL CORREDOR TURÍSTICO TARMA –SELVA CENTRAL EN LA REGIÓN JUNÍN”, mediante Resolución Gerencial Regional de Desarrollo Económico N°108 -2023—GR- JUNIN /GRD, de fecha 13 de diciembre de 2023 y registro del Formato 8A.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS

Demora en la atención de las municipalidades para atender la documentación solicitada.

Cuadro N° 117: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
9	Turismo	2624138	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA EN EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN DISTRITO DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN		Elaboración del estudio de preinversión del PIP "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA EN EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN DISTRITO DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN", que contempla componentes de infraestructura, fortalecimiento de capacidades, promoción y difusión turística, con el propósito de diversificar la oferta turística para el turismo interno y receptivo.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Provincias de Junín		22, 208 agentes económicos	186,000	186,000	100	100.00

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA EN EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN DISTRITO DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Lugar: Chacamarca

Fecha: 13 de noviembre de 2023



MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS TURÍSTICOS PÚBLICOS EN RECURSOS TURÍSTICOS EN EL SANTUARIO HISTORICO DE CHACAMARCA EN EL BICENTENARIO DE LA BATALLA DE JUNIN DISTRITO DE JUNIN DE LA PROVINCIA DE JUNIN DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN

Lugar: Chacamarca

Fecha: 15 de noviembre de 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Elaboración del estudio de preinversión a nivel de ficha técnica simplificada y registro del Formato 5.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS

Inclencencias del clima.

Cuadro N° 118: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
11	Comercio Exterior		DESARROLLO DE LA OFERTA EXPORTABLE, DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y SOSTENIBLE		Elaboración de fichas técnicas de los productos de la Región Junín, (café, cacao, aguaymanto, jengibre, maca, mármol, granadilla, palta, papas nativas y piña) para determinados mercados de destino, también se realizó la visita a empresas y capacitaciones para el desarrollo de la oferta exportable, en coordinación con el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo mediante el Programa de la Ruta Productiva Exportadora,	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Chanchamayo, Satipo y Huancayo		12 exportadores	18.834	18.834	100%	81.00

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.		
		
Actividad: Desarrollo de la oferta exportable, diversificada, competitiva y sostenible Lugar: Satipo Fecha. 11 de agosto del 2023	Actividad: Desarrollo de la oferta exportable, diversificada, competitiva y sostenible Lugar: Sapallanga Fecha. 03 de octubre del 2023	Actividad: Desarrollo de la oferta exportable, diversificada, competitiva y sostenible Lugar: Sub. Dirección de Comercio Exterior Fecha. Setiembre del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS
Acercamiento a los exportadores mediante visitas a sus empresas, y participación en la Ruta Productiva Exportadora.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS
No fue posible la mayor cobertura de atención, debido a la escasa asignación presupuestal.

Cuadro N° 119: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
12	Comercio Exterior		FACILITACIÓN DEL COMERCIO EXTERIOR Y EFICIENCIA DE LA CADENA LOGÍSTICA INTERNACIONAL		Se realizó capacitaciones virtuales sobre biocomercio y el ABC del comercio exterior, en coordinación con MINCETUR, PROMPERU y El Instituto Nacional de Industrias (INI), dirigido a exportadores y con potencial exportador.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/	% Ejecución financiera 2023	% ejecución física 2023
Satipo, Chanchamayo y Huancayo		12 exportadores	1.433	1.433	100%	50.00

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Actividad: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional
Lugar: Virtual, Oficina de Comercio Exterior

Fecha. 28 de noviembre del 2023



Actividad: Facilitación del comercio exterior y eficiencia de la cadena logística internacional
Lugar: Virtual, Oficina de Comercio Exterior

Fecha. 05 de diciembre del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

Fortalecimiento de capacidades en temas de comercio exterior y eficiencia de cadena logística.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS

No hay constancia en la participación de capacitaciones de exportadores y potenciales exportadores.

Cuadro N° 120: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención	N° CUI (sólo proyectos)	Nombre del Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad/proyecto	
14	Artesanía		Capacitación Orientada a Mejorar la Productividad Valor Agregado y Diferenciación de los Productos Artesanales		Con el propósito de mejorar la productividad y competitividad de los Artesanos, se han realizado (12) eventos de capacitación y Asistencias Técnicas en el Desarrollo de la Oferta de Productos Artesanales en temas de : Como Exhibir Nuestros Productos, I Educación Financiera para Artesanos, II Educación Financiera para Artesanos, III Educación Financiera para Artesanos, Innovación en el Diseño Artesanal de la Alfarería de San Antonio de Quicha uso de Engobes, moldes de yeso y diseño iconográfico en Cerámica y Alfarería en el Centro Poblado de Quicha Grande, Exposición de Piezas Únicas Innovadas, El poder Transformador del Diseño creando objetos que rescatan la Identidad, Reconocimiento de ganadores del III Concurso de Maestro de la Artesanía Junín 2023, Elaboración de (02) videos artesanos de la línea de platería, Caso Exitoso de la Empresa Arte Andino, (01) Recorrido de un Nuevo Circuito Una Mirada al Patrimonio Cultural, Aprendiendo a Exportar, Exportando paso a paso trabajos artesanales y Plan de Costos para la Exportación, Como Armar un Stand de Exhibición Tendencia 2024, así mismo se ha efectuado (14) campañas de promoción para la formalización e inscripción de los artesanos en el registro Nacional del artesano (RNA) supervisión a talleres artesanales, capacitaciones virtuales Ventajas de la Asociatividad para Promover la Exportación de Artesanías, Taller Vivencial Fortalecimiento de Lazos Amicales, mediante el respeto, colaboración y Trabajo en Equipo, Asociatividad y participación en Ferias.	
Ámbito Territorial de Intervención de la Actividad o Proyecto (E)		Número y Tipo de Beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a Nivel Devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución Financiera 2023 (I)	% Ejecución Física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		519 Artesanos	28,678.00	28,678.00	100	100

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Capacitación Orientada a Mejorar la Productividad Valor Agregado y Diferenciación de los Productos Artesanales



Capacitación Orientada a Mejorar la Productividad Valor Agregado y Diferenciación de los Productos Artesanales



Capacitación Orientada a Mejorar la Productividad Valor Agregado y Diferenciación de los Productos Artesanales
Lugar: Lugar de la Memoria

Lugar: Complejo de Mayo Pampa Distrito de Viques Fecha: 15 de marzo de 2023	Lugar: Centro Poblado de San Antonio de Quicha Fecha: el 08 y 09 de noviembre 2023	Fecha: 22 de marzo
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS		
- Fortalecimiento de capacidades de 415 artesanos de diversas líneas artesanales. - Reconocimiento a 05 Maestros de la Artesanía – Junín 2023, ganadores del concurso regional. - Formalización de 332 artesanos al Registro Nacional del Artesano – RNA en toda la región, y 19 actualizaciones. - Supervisión de 66 talleres artesanales en toda la región Junín. - Los jóvenes artesanos tienen conocimiento del manejo del Internet y redes Sociales.		
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS		
- Insuficientes recursos (presupuesto) destinados a la Sub Dirección de Artesanía por parte de la DIRCETUR y Gobierno Regional, para desarrollar diferentes actividades de trascendencia. - Dificultad con la movilidad, no se cuenta con camioneta lo que imposibilita cumplir con las tareas encomendadas. - Dificultad de muchos artesanos en acceder a canales de comercialización estables. - Artesanos con acceso y conocimiento limitado de las tecnologías de información y comunicación (TIC) - Excesiva informalidad en muchas de las actividades artesanales. - La comercialización de la artesanía para la exportación se encuentra concentrado en pocas empresas. - Presencia de productos de imitación, de bajo precio y de menor calidad, manufacturadas masivamente. - Existencia de intermediarios (comerciantes) que se hacen pasar por artesanos productores. - Baja priorización del sector artesanía en todos los niveles de gobierno, reflejada en los insuficientes recursos presupuestales asignados al sector.		

Cuadro N° 121: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
5	Producción		Fortalecimiento de capacidades a los productores acuícolas y pesqueras por microcuencas.		Capacitación a acuicultores de las categorías AREL Y AMYPE de sierra y selva, en temas de gestión de la producción, con el objetivo de lograr producciones de calidad y hacerla sostenible en el tiempo, con la aplicación de buenas prácticas de manejo acuícola y con la posibilidad de generar valor agregado con productos aceptados en el mercado nacional e internacional.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Multi provincial (Huancayo, Yauli y Satipo)		546 productores acuícolas, estudiantes personas interesadas en el tema.	9,870.00	12,190.00	123.51%	175%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Capacitación: Normativas Sanitarias – Financiamiento acuicola
Distrito Huayhuay Yauli – Fecha 10/05/2023

VII Encuentro de Integración Nacional e Internacional de Piscicultores
Auditorio UNCP distrito El Tambo Huancayo – Fecha 29 y 30/09/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
➤	Participación de 546 asistentes (acuicultores y personas interesadas) en 07 eventos realizados en las provincias de Huancayo (Ingenio, Chilca, El Tambo), Yauli (Huayhuay) y Satipo (Pangoa).
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
➤	No se cuenta con personal de apoyo para el desarrollo de las actividades programadas.
➤	No se cuenta con apoyo económico para realizar mayor número de asistencia técnica a los productores acuícolas para el desarrollo de la acuicultura en la región Junín.

d. Dirección Regional de Energía y Minas

Cuadro N° 122: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

Cuadro N° 12. Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023						
N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
			Convenio de Gestión entre el Ministerio de Energía y Minas y el Gobierno Regional de Junín.		El objetivo es Fortalecer la capacidad de gestión y apoyar económica y técnicamente a la DREM - Junín, con la finalidad de realizar el seguimiento de funciones que han sido trasferidas en materia de energía y minería, mediante los informe de avances y logros y evolución de indicadores.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
En todas las provincias del departamento de Junín de acuerdo a la funciones trasferidas en marco del convenio.		Pago del personal CAS y contratación de servicios profesionales.	S/ 242,493.00	S/ 207,153.67	85.43%	99.98%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se Realizó transferencia hasta por un monto de S/. 200,000.00 (doscientos mil soles), más la incorporación de saldos de balance de S/. 42,493, aprobado mediante Resolución Ministerial N° 106-2023-MINEM/DM, de fecha 13 de marzo, que fueron destinados exclusivamente al fortalecimiento de la capacidad de gestión regional en el ejercicio de las funciones transferidas en materia minero energéticas.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
✓ Demora en la Firma de Convenio. ✓ Demora en la Transferencia Financiera. ✓ Poca demanda de profesionales que cumplan el perfil de acuerdo al convenio.						

Cuadro N° 124: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	Producción		Poblamiento y/o repoblamiento de recursos hídricos con alevinos de trucha con fines sociales.		Repoblamiento de recurso hídricos (ríos y lagunas) con alevinos de trucha, en beneficio de poblaciones de zonas rurales, que permitirá variar y mejorar el consumo de alimentos de alto contenido proteico, como parte de la seguridad alimentaria	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Multi provincial (Huancayo, Jauja y Yauli)		23 comunidades campesinas de zonas alto andinas	32,000.00	32,000.00	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



Repoblamiento de recursos hídricos laguna Pomacocha
C. P. Chiche, Apata, Jauja – Fecha 14/02/2023



Repoblamiento de recursos hídricos río Vizcas
Distrito de Quilcas, Huancayo – Fecha 30/10/2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- ✓ Veintitrés recursos hídricos repoblados (seis ríos y diecisiete lagunas), con 61,000 alevinos de trucha procedente del Centro Piscícola "El Ingenio" en las provincias de Huancayo, Jauja y Yauli.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ No se cuenta con personal de apoyo para el desarrollo de las actividades programadas.
- ✓ No se cuenta con vehículo adecuado, equipamiento y materiales necesarios para ejecutar mayor número de siembras a beneficio de mayor número de comunidades campesinas
- ✓ Falta de apoyo de la región Junín para adquisición de ovas embrionadas y logro de alevinos para realizar programas de repoblamiento en toda la región Junín.

Cuadro N° 125: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
5	Producción		Fortalecimiento de capacidades a los productores acuícolas y pesqueras por microcuencas.		Capacitación a acuicultores de las categorías AREL Y AMYPE de sierra y selva, en temas de gestión de la producción, con el objetivo de lograr producciones de calidad y hacerla sostenible en el tiempo, con la aplicación de buenas prácticas de manejo acuícola y con la posibilidad de generar valor agregado con productos aceptados en el mercado nacional e internacional.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Multi provincial (Huancayo, Yauli y Satipo)		546 productores acuícolas, estudiantes personas interesadas en el tema.	9,870.00	9,870.00	100%	100%
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.  Capacitación: Normativas Sanitarias – Financiamiento acuicola Distrito Huayhuay Yauli – Fecha 10/05/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
➤ Participación de 546 asistentes (acuicultores y personas interesadas) en 07 eventos realizados en las provincias de Huancayo (Ingenio, Chilca, El Tambo), Yauli (Huayhuay) y Satipo (Pangoa).						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
➤ No se cuenta con personal de apoyo para el desarrollo de las actividades programadas.						
➤ No se cuenta con apoyo económico para realizar mayor número de asistencia técnica a los productores acuícolas para el desarrollo de la acuicultura en la región Junín.						

EJE INFRAESTRUCTURA – OER 5: DESARROLLO REGIONAL EQUILIBRADO E INFRAESTRUCTURA

1.11 GERENCIA REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA (GRI)

a. Sub Gerencia de Estudios

Cuadro N° 126: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2499912	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN"		La inversión comprende la construcción de ambientes para la educación secundaria, el cual contempla 55 aulas, biblioteca + aulas de reforzamiento, 4 laboratorios, sala de usos múltiples, 5 talleres de arte, 15 talleres de educación para el trabajo, equipamiento y mobiliario.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín		2,318 estudiantes	841,100.00	841,100.00	100.00%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO



INGRESO PRINCIPAL I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO



ELEVACIÓN LATERAL DEL BLOQUE ADMINISTRATIVO

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se cuenta con EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO del proyecto de inversión, el cual fue APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 646-2023-G.R.-JUNÍN/GRI con fecha 07 de noviembre del 2023, representando el 100.00% de ejecución física y financiera respecto al componente de “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO”.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuadro N° 127: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
2	Educación	2499920	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”	Construcción de ambientes para educación secundaria tales como 50 aulas, 5 áreas de innovación pedagógica, 4 laboratorios, talleres, sala de usos múltiples, losa deportiva, gimnasio, piscina semiolímpica, entre otros.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)

Provincia de Huancayo, departamento de Junín	2,030 estudiantes	737,500.00	737,500.00	100.00%	100.00
---	----------------------	------------	------------	---------	--------

PANEL FOTOGRÁFICO



VISTA PEATONAL DEL INGRESO PRINCIPAL A LA I.E. POLITECNICO TUPAC AMARU



VISTA INTERIOR DE AULA PEDAGÓGICA



VISTA INTERIOR DE PISCINA SEMIOLÍMPICA

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se cuenta con EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO del proyecto de inversión, el cual fue APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 254-2023-G.R.-JUNÍN/GRI con fecha 16 de junio del 2023, representando el 100.00% de ejecución física y financiera respecto al componente de "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO".

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)


-

Cuadro N° 128: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2430718	"MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA - JUNIN TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"		La inversión corresponde a la construcción de ambientes para educación inicial, primaria, secundaria y CEBA de la I.E. San Ramón, el cual contempla ambientes como sala de usos múltiples, aulas pedagógicas, área de ingreso, administración, dirección general, biblioteca, talleres, laboratorios, equipamiento y mobiliario.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)

Distrito de Tarma, provincia de Tarma, departamento de Junín	1,531 estudiantes	73,314.00	73,313.80	100.00	100.00
--	----------------------	-----------	-----------	--------	--------

PANEL FOTOGRÁFICO

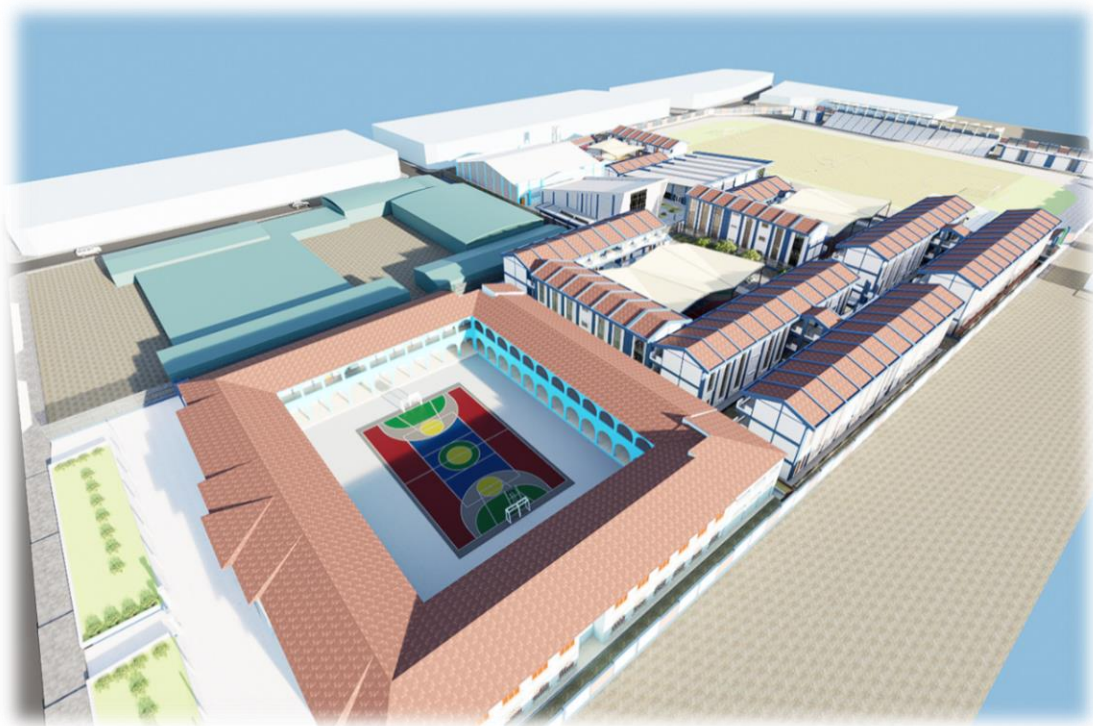

VISTA AÉREA DE LA I.E. SAN RAMÓN DE TARMA



VISTA AÉREA POSTERIOR DE LA I.E. SAN RAMÓN DE TARMA

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se cuenta con EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO del proyecto de inversión, el cual fue APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 411-2023-G.R.-JUNÍN/GRI con fecha 10 de agosto del 2023, representando el 100.00% de ejecución física y financiera respecto al componente de "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO".

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

-

Cuadro N° 129: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	TRANSPORTE	2329618	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PACÁN - EMP. PE-3S A JAUJA - REGIÓN JUNÍN – III ETAPA		La inversión corresponde al mejoramiento de la carretera de 34.042 km y variante en Maco de 3.307 km a nivel de asfalto en caliente con e=0.10 m, con un ancho de calzada de 6.60 m, con Velocidad de diseño de 50 km/Hr, Sobre ancho máximo 1.40 m, Ancho de derecho de vía 20.00 m, Ancho de berma (m) de 1.20 m, Radio mínimo en curvas horizontales (m) 70.00 m, Pendiente máxima (%) de 7.00%, Bombeo de 2.50%, Puente Ricran de 15.00 m, Puente Mellizos de 12.00 m, Alcantarilla TMC 36" 134 Und, Alcantarilla TMC 60" 03 Und, Alcantarillas MCA 1.50 x 1.50m 02 Und, Alcantarillas TMC en Variante 10 und, Alcantarillas MCA en Variante 01 und, Cunetas Tipo trapezoidal y triangular, señalización y seguridad vial, plan de manejo ambiental.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincias de Jauja y Tarma, Departamento de Junín		21,157 personas	532,000.00	524,800.0	98.60%	100.00%
PANEL FOTOGRÁFICO						



Levantamiento topográfico con estación total en el tramo Palca - Tarma.



Levantamiento topográfico con estación total en el tramo Tapo - Tarma.



Estudio de Geofísica en los diferentes tramos de la vía proyectada.



Refracción Sísmica y MASW LS-15/MW-15 ubicado en el tramo que recorre los distritos de Ricran, Tapo y Palca



Exploración de canteras para afirmado con equipo



Exploración de canteras para afirmado con equipo

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se cuenta con EXPEDIENTE TÉCNICO REFORMULADO DE SALDO – III ETAPA del proyecto de inversión, el cual fue APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 776-2023-G.R.-JUNÍN/GRI con fecha 27 de diciembre del 2023, representando el 100.00% de ejecución física y 98.60% financiera respecto al componente de “ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO”.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Durante la reformulación del expediente técnico se presentaron dificultades como la orografía compleja de las localidades, la poca disponibilidad de la población de apoyar con la libre disponibilidad de terrenos y factores climáticos.

Cuadro N° 130: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	SALUD	2509069	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILCA, DISTRITO DE CHICA – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN	EL OBJETIVO PRINCIPAL ES MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACIÓN Y ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CHILCA Y DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCIÓN DE CALIDAD Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD, A TRAVÉS DE ATENCION AMBULATORIA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEN LA ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, Y PEDIATRIA.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo		179,100.00 habitantes	0.00	0.00	0.00%	100.00%

PANEL FOTOGRÁFICO





PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se cuenta con EXPEDIENTE TÉCNICO ACTUALIZADO del proyecto de inversión, el cual fue APROBADO mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 687-2023-G.R.-JUNÍN/GRI con fecha 21 de diciembre del 2023, representando el 100.00% de ejecución física y 0.00% financiera respecto al componente de "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO".

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuadro N° 131: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	TRANSPORTE	2619944	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO: EMP.PE-24 A (PARATUSHIALI), CARPIO, RIO VENADO, HUAHUARI, IPOKI, EMP.PE-5S (BOCA CHENI) – DISTRITO DE SATIPO, RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN”	La inversión comprende el mejoramiento de vía de 48.14 Km, Sub base Granular e=0.30 m, Base Granular e=0.20 m, Carpeta asfáltica e=0.05 m, Obras de Arte y Drenaje, Alcantarillas TMC: 94und, Alcantarillas Tipo Marco: 02und, Badenes: 63und, Muros de Contención: 40und, Cunetas Rectangulares, Pontones: 17und, Puentes: 01und, Implementación de 341 señales Verticales, Capacitación y sensibilización a la población, Mitigación de Impacto Ambiental y Plan de Monitoreo Ambiental.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Departamento de Junín		390,807.00	0.00	0.00	0.00 %	100.00 %
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						



Visita a campo.



Estado actual de la via.



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se APROBO el EXPEDIENTE TÉCNICO del proyecto de inversión mediante RESOLUCIÓN GERENCIAL REGIONAL DE INFRAESTRUCTURA N° 759-2023-G.R.-JUNÍN/GRI con fecha 20 de diciembre del 2023, representando el 100.00% de ejecución física y 0.00% financiera respecto al componente de "ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO".

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Proyectos en ejecución – convocatoria

Cuadro N° 132: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2499912	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN"		La inversión comprende la construcción de ambientes para la educación secundaria, el cual contempla 55 aulas, biblioteca + aulas de reforzamiento, 4 laboratorios, sala de usos múltiples, 5 talleres de arte, 15 talleres de educación para el trabajo, equipamiento y mobiliario.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)

Distrito de El Tambo, provincia de Huancayo, departamento de Junín	2,318 estudiantes	0.00	0.00	0.00%	0.00%
--	----------------------	------	------	-------	-------

PANEL FOTOGRÁFICO



INGRESO PRINCIPAL I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO

SE@CE

OSCE

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Descripción del Objeto: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Ficha de Selección

Regresar

Convocatoria

Información General

Numero de Convocatoria: LP-06-13-2023-GRJ/CS-1

N° Convocatoria: 1

Tipo Compra o Selección: Por la Entidad

Normativa Aplicables: Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Versión SEACE: 3

Identificador Convocatoria: 944808

Información general de la Entidad

Entidad Convocante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Dirección Legal: JILORETO 368 PISO CENTRO CHICO (JUNIN-HUANCAYO-HUANCAYO)

Página Web: WWW.REGIONJUNIN.GOB.PE

Teléfono de la Entidad: 044-232230

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación: Obra

Descripción del Objeto: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DE

Valor Estimado / Valor Referencial: 149,628,219.99 Soles

Alcance del Derecho de Participación: GRATUITO

Alcance del costo de Reproducción de las Bases: 5.00

Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases

Banco	Cuenta
Caja de la Entidad	

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	21/09/2023	21/09/2023
Registro de participantes(Electrónica)	22/09/2023 00:01	10/12/2023 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electrónica)	22/09/2023 00:01	05/10/2023 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electrónica)	23/11/2023	23/11/2023
Integración de las Bases SEACE	23/11/2023	23/11/2023
Presentación de ofertas(Electrónica)	11/12/2023 00:01	22/12/2023 23:59
Evaluación y calificación de ofertas SEACE	27/12/2023	27/12/2023
Organismo de la Buena Pro SEACE	28/12/2023 08:30	28/12/2023

Entidad Contratante

N° RUC: 20486021692

Entidad Contratante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Acuerdos Comerciales

El procedimiento se encuentra bajo la cobertura de 0 de los siguientes acuerdos comerciales:

Nro.	Descripción del Acuerdo Comercial
1	Tratado de Libre Comercio Perú-Corea
2	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Singapur
3	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Japón
4	Tratado Integral y Preferencial de Asociación Transpacífico-CPTPP

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se ha realizado el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA-SM-13-2023-GRJ/CS-1 para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, con valor referencial de S/ 149,628,219.99.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Cuadro N° 133: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2499920	“MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITÉCNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN”		Construcción de ambientes para educación secundaria tales como 50 aulas, 5 áreas de innovación pedagógica, 4 laboratorios, talleres, sala de usos múltiples, losa deportiva, gimnasio, piscina semiolímpica, entre otros.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, departamento de Junín		2,030 estudiantes	0.00	0.00	0.00%	0.00

PANEL FOTOGRÁFICO



VISTA PEATONAL DEL INGRESO PRINCIPAL A LA I.E. POLITECNICO TUPAC AMARU

AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA COMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Descripción del Objeto:
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL IVTES, SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO TURAN AMARU, DISTRITO DE CHILCA-PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN".

Fecha de Selección

Registrar

Comunicatoria

Información General

Nomenclatura:	UP-SM-19-2023-GRJ-CS-1
N° Comunicatoria:	1
Tipo Compra o Selección:	Por la Entidad
Normativa Aplicable:	Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado
Versión SEACE:	3
Identificador Comunicatoria:	990874

Información general de la Entidad

Entidad Contratante:	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL
Dirección Legal:	JULIOMEDTOS-308 PISO CENTRO CIVICO (JUNIN-HUANCAJO-HUANCAJO)
Página Web:	WWW.REGIONJUNIN.GOB.PE
Teléfono de la Entidad:	064-232230

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación:	OBR
Descripción del Objeto:	CONTRATACION DE EJECUCION DE LA OBRA: "MEJORAM
Valor Estimado / Valor Referencial:	139,454,544.07 Soles
Monto del Derecho de Participación:	GRATUITO
Monto del costo de Reproducción de las Bases:	10.00
Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases:	Caja de la Entidad
Fecha y Hora Publicación:	27/12/2023 20:34

Consigna

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Comunicatoria	27/12/2023	27/12/2023
Registro de participantes(Electronicos)	28/12/2023 00:01	04/01/2024 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronicas)	28/12/2023 00:01	12/01/2024 23:59
Anulación de consultas y observaciones(Electronicas)	23/01/2024	23/01/2024
Integración de las Bases A TRAVES DE LA PAGINA VIRTUAL DEL SEACE	23/02/2024	23/02/2024
Presentación de ofertas(Electronicas)	06/03/2024 00:01	06/03/2024 23:59
Evaluación y calificación de ofertas EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GALJ	06/03/2024	06/03/2024
Clasamiento de la Base por A TRAVES DE LA PAGINA VIRTUAL DEL SEACE	06/03/2024 12:30	06/03/2024

Entidad Contratante

N° Busc	Entidad Contratante
Z04N0219R2	GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN SEDE CENTRAL

Acuerdos Comerciales


El procedimiento se encuentra bajo la cobertura del o de los siguientes acuerdos comerciales:

Nro.	Descripción del Acuerdo Comercial
1	Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos
2	Tratado de Libre Comercio Perú-Corea
3	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Singapur
4	Acuerdo de Libre Comercio Perú-GTA
5	Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón
6	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Panamá
7	Acuerdo de Libre Comercio Perú - Unión Europea
8	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica
9	Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú - Colombia y Chile

Cuadro N° 134: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

Nº	Sector de intervención (A)	Nº CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Educación	2430718	“MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA - JUNIN TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN”	La inversión corresponde a la construcción de ambientes para educación inicial, primaria, secundaria y CEBA de la I.E. San Ramón, el cual contempla ambientes como sala de usos múltiples, aulas pedagógicas, área de ingreso, administración, dirección general, biblioteca, talleres, laboratorios, equipamiento y mobiliario.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Distrito de Tarma, provincia de Tarma, departamento de Junín		1,531 estudiantes	0.00	0.00	0.00	0.00

PANEL FOTOGRÁFICO

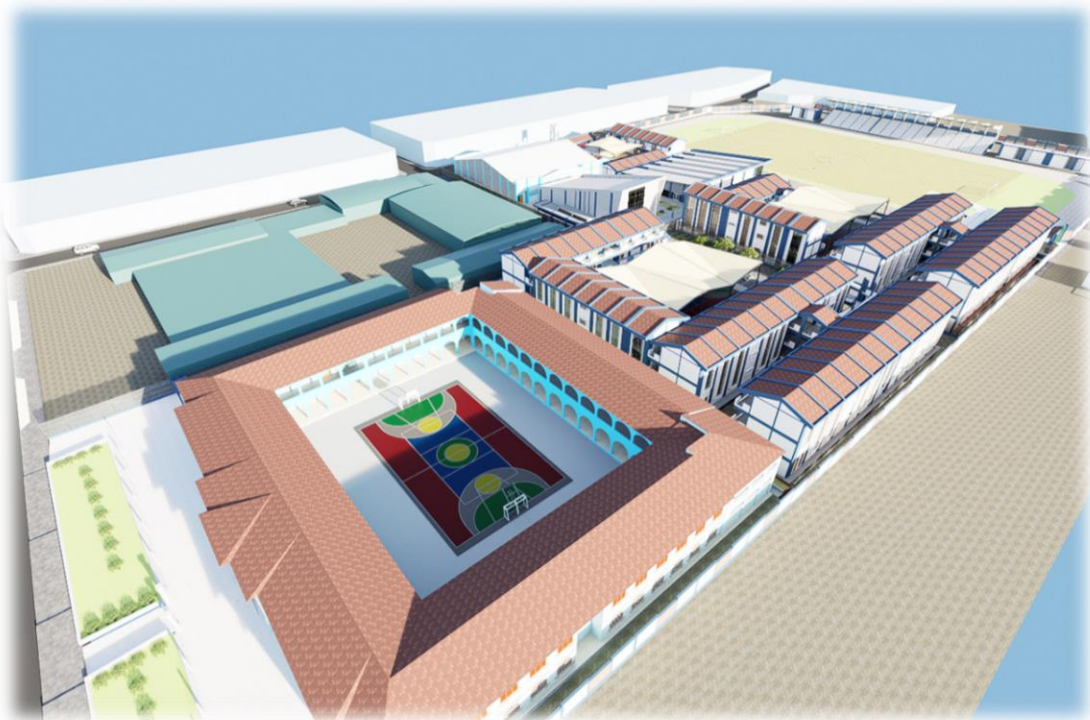

VISTA AÉREA DE LA I.E. SAN RAMÓN DE TARMA

SE@CE  AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA COMMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN RAMÓN DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA - Tarma - Tarma - JUNÍN Tarma del Distrito de Tarma - PROVINCIA DE Tarma - DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Ficha de Selección

[Regresar](#)

Convocatoria

Información General

Homologación: LP-SM-5-2023-GRJ-CS-1

N° Convocatoria: 1

Tipo Compra o Selección: Por la Entidad

Normativa Aplicable: Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Versión SEACE: 3

Identificador Convocatoria: 986518

Información general de la Entidad

Entidad Convocante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SEDE CENTRAL

Dirección Legal: JR. LONETO380-3ER PISO CENTRO CIVICO (JUNÍN-HUANCAYO-HUANCAYO)

Página Web: WWW.REGIONJUNIN.GOB.PE

Teléfono de la Entidad: 064-212220

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación: Obra

Descripción del Objeto: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRAS: MEJORAMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA I.E. SAN RAMÓN DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BÁSICA ALTERNATIVA - Tarma - Tarma - JUNÍN Tarma del Distrito de Tarma - PROVINCIA DE Tarma - DEPARTAMENTO DE JUNÍN

Valor Estimado / Valor Referencial: 93,370,395.69 Soles

Monto del Derecho de Participación: GRATUITO

Monto del costo de Reproducción de las Bases: 5.00

Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases

Banco	Cuenta
Caja de la Entidad	

Fecha y hora de Publicación del reclutamiento: 02/02/2024 16:01

Revisado Desde: Admisión de propuesta técnica

Programa

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	11/08/2023	11/08/2023
Registro de participantes(Electrónica)	12/08/2023 00:01	01/11/2023 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electrónica)	12/08/2023 00:01	25/08/2023 23:59
Aclaración de consultas y observaciones(Electrónica)	21/09/2023	21/09/2023
Integración de las Bases A TRAVÉS DEL SEACE	21/09/2023	21/09/2023
Presentación de ofertas(Electrónica)	02/11/2023 00:01	02/11/2023 23:59
Evaluación y calificación de ofertas A TRAVÉS DEL SEACE	02/02/2024	02/02/2024
Orogamiento de la Buena Pro A TRAVÉS DEL SEACE	02/02/2024 11:00	02/02/2024

Entidad Contratante

N° Ruc	Entidad Contratante
20486021692	GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SEDE CENTRAL

Acuerdos Comerciales

El procedimiento se encuentra bajo la cobertura del o de los siguientes acuerdos comerciales:

Nro.	Descripción del Acuerdo Comercial
1	Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos
2	Tratado de Libre Comercio Perú-Corea
3	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Singapur
4	Acuerdo de Libre Comercio Perú-EFTA
5	Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón
6	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Panamá
7	Acuerdo de Libre Comercio Perú - Unión Europea
8	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se ha realizado el proceso de LICITACIÓN PÚBLICA LICITACIÓN PÚBLICA-SM-5-2023-GRJ/CS-1 para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, con valor referencial de S/ 93,370,395.69.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

-

Cuadro N° 135: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	SALUD	2509069	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIO DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CHILCA, DISTRITO DE CHICA – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN	EL OBJETIVO PRINCIPAL ES MEJORAR EL ACCESO DE LA POBLACION Y ADECUADOS SERVICIOS DE SALUD DEL DISTRITO DE CHILCA Y DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO, A FIN DE BRINDAR UNA ATENCION DE CALIDAD Y EFICIENTE DE LOS SERVICIOS DE SALUD. MEJORAR LA ACCESIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE SALUD. LA CATEGORIA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CORRESPONDE AL NIVEL II-1. CUENTA CON LA CAPACIDAD RESOLUTIVA PARA SATISFACER LAS NECESIDADES DE SALUD DE LA POBLACION, A TRAVEZ DE ATENCION AMBULATORIA, EMERGENCIA Y HOSPITALIZACION DEN LA ESPECIALIDADES DE MEDICINA INTERNA, CIRUGIA, GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA, Y PEDIATRIA.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo		179,100.00 habitantes	0.00	0.00	0.00%	0.00%

VISTAS 3D






AÑO DEL BICENTENARIO, DE LA CONSOLIDACIÓN DE NUESTRA INDEPENDENCIA, Y DE LA CONMEMORACIÓN DE LAS HEROICAS BATALLAS DE JUNÍN Y AYACUCHO

Descripción del Objeto
CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD CIVICA, DISTRITO DE CINCA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN", CON CUI 259069

Ficha de Selección

Registrar

Convocatoria

Información General

Nomenclatura: LP-SM-18-2023-GRJ/CS-1

N° Convocatoria: 1

Tipo Compra o Selección: Por la Entidad

Normativa Aplicables: Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Versión SEACE: 3

Identificador Convocatoria: 980253

Información general de la Entidad

Entidad Convocante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SEDE CENTRAL

Dirección Legal: J.L. LORETO 363-3ER PISO CENTRO CIVICO (JUNÍN HUANCAYO-HUANCAYO)

Página Web: WWW.REGIONJUNIN.GOB.PE

Teléfono de la Entidad: 064-232230

Información general del procedimiento

Objeto de Contratación: Obra

Descripción del Objeto: CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: "MEJOR...

Valor Estimado / Valor Referencial: 232,590,729.82 Soles

Monto del Derecho de Participación: GRATUITO

Monto del costo de Reproducción de las Bases: 7.00

Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases:

Banco

Cuenta

Caja de la Entidad

Fecha y Hora Publicación: 21/12/2023 21:40

Cronograma

Etapas	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	21/12/2023	21/12/2023
Registro de participantes(Electronicas)	22/12/2023 00:01	30/01/2024 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronicas)	22/12/2023 00:01	11/01/2024 23:59
Absolución de consultas y observaciones(Electronicas)	12/01/2024	12/01/2024
Integración de las Bases A TRAVES DEL SEACE	12/01/2024	12/01/2024
Presentación de ofertas(Electronicas)	21/01/2024 00:01	21/01/2024 23:59
Evaluación y calificación de ofertas A TRAVES DEL SEACE	01/02/2024	01/02/2024
Orogamiento de la Buena Pro A TRAVES DEL SEACE	02/02/2024 08:30	02/02/2024

Entidad Contratante

N° Ruc

Entidad Contratante

20486021692

GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SEDE CENTRAL

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se ha realizado el proceso de LICITACIÓN PUBLICA LP-SM-18-2023-GRJ/CS-1 para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, con valor referencial de S/ 232,590,729.82.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

PROYECTOS CON EXPEDIENTE TÉCNICO EN LICITACION

Cuadro N° 136: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	TRANSPORTE	2619944	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRAMO: EMP.PE-24 A (PARATUSHALI), CARPIO, RIO VENADO, HUAHUARI, IPOKI, EMP.PE-5S (BOCA CHENI) – DISTRITO DE SATIPO, RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN"	La inversión comprende el mejoramiento de vía de 48.14 Km, Sub base Granular e=0.30 m, Base Granular e=0.20 m, Carpeta asfáltica e=0.05 m, Obras de Arte y Drenaje, Alcantarillas TMC: 94und, Alcantarillas Tipo Marco: 02und, Badenes: 63und, Muros de Contención: 40und, Cunetas Rectangulares, Pontones: 17und, Puentes: 01und, Implementación de 341 señales Verticales, Capacitación y sensibilización a la población, Mitigación de Impacto Ambiental y Plan de Monitoreo Ambiental.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)

177

			devengado 2023 S/ (H)		
Provincia de Satipo, Departamento de Junín	390,807	0.00	0.00	0.00 %	0.00 %

CONTRATACIÓN DE EJECUCIÓN DE OBRA: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL INTERURBANA EN LA CARRETERA TRONCAL ENR PE 24-A (PARATONALU, CAPRO, RIO YAUJO, HUANCAR, POKI, ENR PE 155BOCA CHENI) DISTRITOS DE SATIPO, RIO NEGRO DE LA PROVINCIA DE SATIPO DEL DEPARTAMENTO DE JUNÍN.

Ficha de Selección

Convocatoria

Información General:

N° Convocatoria: LP-SM-21-2023-GRJ-CS-1

Tipo Compra o Selección: Por la Entidad

Normativa Aplicable: Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado

Versión SEACE: 3

Identificador Convocatoria: 902239

Información general de la Entidad:

Entidad Convocante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SEDE CENTRAL

Dirección Legal: JR.LORETO063-3ER PISO CENTRO CIVICO (JUNIN-HUANCAR-HUANCAR)

Página Web: WWW.REGIONJUNIN.GOB.PE

Teléfono de la Entidad: 064-232230

Información general del procedimiento:

Objeto de Contratación: Obra

Descripción del Objeto: CONTRATACION DE EJECUCION DE OBRA: MEJORAMIE...p

Valor Estimado / Valor Referencial: 189,901,592.04 Soles

Monto del Derecho de Participación: GRATUITO

Monto del costo de Reproducción de las Bases: 9.50

Lugar y cuenta de pago del costo de Reproducción de las Bases:

Salvo	Cuenta
Caja de la Entidad	

Fecha y Hora Publicación: 28/12/2023 19:08

Cronograma

Etapa	Fecha Inicio	Fecha Fin
Convocatoria	28/12/2023	28/12/2023
Registro de participantes(Electronic)	29/12/2023 00:01	21/02/2024 23:59
Formulación de consultas y observaciones(Electronic)	29/12/2023 00:01	16/01/2024 23:59
Abolición de consultas y observaciones(Electronic)	12/02/2024	12/02/2024
Integración de las Bases A TRAVES DE LA PAGINA VIRTUAL DEL SEACE	12/02/2024	12/02/2024
Presentación de ofertas(Electronic)	22/02/2024 00:01	22/02/2024 23:59
Evaluación y calificación de ofertas EN LA OFICINA DE ABASTECIMIENTO DEL GRU	23/02/2024	23/02/2024
Abastecimiento de la Buena Pro A TRAVES DE LA PAGINA VIRTUAL DEL SEACE	23/02/2024 12:30	23/02/2024

Entidad Contratante

N° RUC: 2048621692

Entidad Contratante: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN SEDE CENTRAL

Acuerdos Comerciales

El procedimiento se encuentra bajo la cobertura de los siguientes acuerdos comerciales:

N°	Descripción del Acuerdo Comercial
1	Acuerdo de Promoción Comercial Perú-Estados Unidos
2	Tratado de Libre Comercio Perú-Corea
3	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Singapur
4	Acuerdo de Libre Comercio Perú-EFTA
5	Acuerdo de Asociación Económica Perú-Japón
6	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Panamá
7	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Unión Europea
8	Acuerdo de Libre Comercio Perú-Costa Rica
9	Acuerdo de Alianza del Pacífico Perú-Colombia y Chile
10	Acuerdo de Estímulos del Pacífico Perú-Indonésia

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se ha realizado el proceso de LICITACIÓN PUBLICA LP-SM-21-2023-GRJ/CS-1 para la CONTRATACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LA OBRA, con valor referencial de S/ 189,901,592.04.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

a. Sub Gerencia de Obras

Cuadro N° 137: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
2	Educación	2250248	INSTALACIÓN DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. N 30161 DEL CENTRO POBLADO DE CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA CHUPACA - JUNÍN	3 AULAS (182M2), 6 SSHH (70.56M2), 4 DEPÓSITOS DE MATERIALES (24.79M2), (22.52M2), PORTADA DE INGRESO (52.54M2),

Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín	684 Habitantes	2,169,313.00	2,152,823.00	99.24	79.66
					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
Construcción de 3 aulas, 6 sshh, portada de ingreso, 01 patio, área de juegos cerco perimétrico y equipamiento y mobiliario en un 50%.					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
Demora en la adquisición de bienes y contratación de servicios.					

Cuadro N° 138: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
3	Educación	2317690	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE E INSTALACION DE SANEAMIENTO BASICO EN EL CENTRO POBLADO DE CARHUAPACCHA, DISTRITO DE CHUPURO - HUANCAYO – JUNIN	- Instalación de redes de alcantarillado en 248.32 metros lineales de tubos de PVC ISO 4935 de 160 MM (6"). - Instalación de redes alcantarillado en 2,462.11 metros lineales de tubos de PVC ISO 4935 de 200 MM (8").

				- Construcción de 40 unidades básicas de saneamiento (UBS). - Construcción de buzones de concreto armado.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín	274 HABITANTES	1,042,884	1,042,872.95	100.00	68.30
					
JUN-2023					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)					
274 personas con acceso al servicio de alcantarillado y unidades básicas de saneamiento, en la Comunidad de Carhuapaccha, distrito de Chupuro.					
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)					
Cambio de trazo de la red de alcantarillado debido a que en el expediente técnico no se tuvo en consideración la existencia de un reservorio y vivienda consolidada.					

Cuadro N° 139: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
----	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--

4	Transporte	2324781	MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS ALTERNAS A LA CARRETERA MARGINAL EN LOS TRAMOS: DESDE LA CALLE EVITAMIENTO HASTA EL PUENTE PICHANAQUI Y DESDE EL JR. LA PAZ HASTA EL GRIFO PICHANAQUI, DISTRITOS DE PERENE Y PICHANAQUI, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN		LA II ETAPA COMPRENDE EL TRAMO KM 2+020 AL 2+390 Y EL TRAMO KM 3+230 AL 3+680 DE PAVIMENTO RIGIDO.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín		1,792 habitantes	2,998,237	2,998,234.29	99.3	96.25

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



JUN-2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Adecuada infraestructura para la transitabilidad de 1,792 habitantes.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Ausencia de materiales o herramientas por demora en las adquisiciones de bienes y servicios

Cuadro N° 140: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
----	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--

5	TRANSPORTE	2475720	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DE LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AV. AMISTAD HASTA KM 0+560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA – DEPARTAMENTO JUNIN		CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA A NIVEL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DESDE EL KM. 0+000 HASTA KM. 1+787, EN UNA LONGITUD APROXIMADA DE 1.787 KMS.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín		3,950 habitantes	3,922,855	3,670,977.61	93.58	96.63
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
3,950 habitantes con acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Paralización de la obra por la ausencia de personal de obra.						

Cuadro N° 141: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
6	Transporte	2476726	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL DEL CIRCUITO TURÍSTICO HUAYTAPALLANA TRAMO: EMP.JU1047 - EMP.JU1072, EN LOS DISTRITOS DE EL TAMBO Y SAN AGUSTIN DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO 18,318.57 m2 Y CONSTRUCCION DE VEREDAS 4,921.30 m2		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		292,546 habitantes	1,177,105	1,177,102.61	98.39	1.99



JUL-2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

282,546 habitantes con acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Desabastecimiento de materiales.

Cuadro N° 142: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
7	SANEAMIENTO	2488029	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA AV. AMISTAD ENTRE EL EMP. PE 3SB Y LA AV. SAN ISIDRO Y AV. SAN ISIDRO ENTRE AMISTAD HASTA KM 0+560, DISTRITO DE TRES DE DICIEMBRE - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN		3,854.34 ML. DE CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE Y 3,871.04 ML. DE CONSTRUCCION DE RED DE ALCANTARILLADO	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín		283 habitantes	2,623,282	2,591,780.50	98.80	92.65
<u>CAMARA DE BOMBEO</u>  SET-2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
283 habitantes con acceso al servicio de agua potable y servicio de alcantarillado						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Desabastecimiento de materiales						

Cuadro N° 143: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
8	Transporte	2527166	REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV. VIENRICH TRAMO: AV. FCO DE PAULA OTERO - JR. LEONCIO PRADO Y JR. LEONCIO PRADO TRAMO: AV. VIENRICH - AV. PACHECO EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNIN		CALZADA VEHICULAR DE PAVIMENTO FLEXIBLE E= 15 cm EN 8078.30 m2	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Tarma, Departamento de Junín		89,590 habitantes	1,261,005	1,260,903	100.00	73.66



MAY-2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

89,590 habitantes con acceso a los servicios de movilidad urbana a través de vías urbanas

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

En el año 2023 se tuvo 03 ampliaciones de plazo y 01 adicional de obra.

Cuadro N° 144: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
16	Orden Público y Seguridad	2593229	ADQUISICION DE CAMIONETA, MOTOCICLETA Y EQUIPOS COMPLEMENTARIOS; EN UN COMISARIAS PNP TIPO A, COMISARIAS PNP TIPO C, COMISARIAS PNP TIPO D, COMISARIAS PNP TIPO B A NIVEL DEPARTAMENTAL (JUNIN)		ADQUISICIÓN DE 25 CAMIONETAS, 16 MOTOCICLETAS, 41 RADIOS DE COMUNICACIÓN Y 91 EQUIPOS POLICIALES PARA CAMIONETAS.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		35 comisarias básicas	4,819,017	4,782,477	99.24	100.00
						
NOV-2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
35 comisarias basicas que operan en condiciones adecuadas						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Demora en la adquisición de vehiculos y equipos						


b. Sub Gerencia de Supervisión y Liquidaciones

Cuadro N° 145: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	TRANSPORTE	2277818	"CREACIÓN DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN"		EL PROYECTO CONTEMPLA LAS SIGUIENTES METAS FÍSICAS: SUPERESTRUCTURA, SUBESTRUCTURA Y CIMENTACIÓN, VÍAS DE ACCESO, DEFENSA RIBEREÑA Y OBRAS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto €		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de El Tambo y Pilcomayo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		209,068	17,695,950	17,003,193	96.09 %	68.98%



Habilitación de acero para losa de concreto.

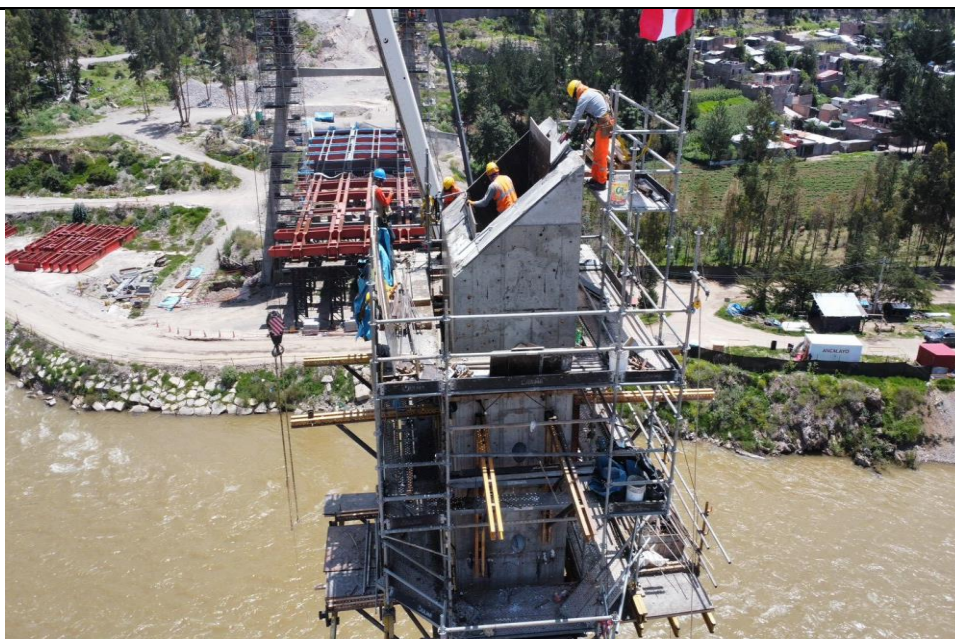

Trabajos de desencofrado en la torre de la margen derecha.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se viene realizando avances en torres en ambas márgenes, además se habilitó acero de refuerzo para losa de concreto, también se viene realizando trabajos de encofrado en losa de tablero de la margen derecha.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Demora en aprobación de adicionales que limitan los avances en obra, además de factor climático que retrasan los vaciados de las losas por la presencia de lluvias en la zona.

Cuadro N° 150: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Transportes	2300078	“CREACIÓN DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRIÓN Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO Y HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, REGIÓN JUNÍN”		Construcción de un puente tipo atirantado de 724.8 metros de luz, cuenta con 11 vanos, la superestructura es de elementos metálicos, con una losa de concreto de resistencia $f_c=280$ Kg/cm ² , en una sección de 15.8 en los vanos estándar y 18.50 en los vanos atirantados, cuenta con 02 calzadas, ciclovía y veredas.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo y Chupaca, en la región de Junín		350,000.00 pobladores	34,788,963.00	34,649,313.89	99.60	83.31%



Montaje de los cables del atirantado, con utilización de grúas.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se ha realizado la culminación del montaje de la estructura metálica en los 11 vanos del puente, así como la culminación de la colocación de las placas colaborantes en los 11 vanos, la colocación de acero de refuerzo y concreto en 8 de los 11 vanos, quedando pendiente los trabajos en los 3 tramos que comprende el sector del atirantado.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Las precipitaciones pluviales que ocurrieron en el último periodo del año.

Cuadro N° 151: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	TRANSPORTE	2251269	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN		A la fecha se viene desarrollando, corte de material en terreno suelto y en roca fija, conformación de DMEs, obras de arte	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
PROVINCIA DE HUANCAYO, PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA DEPARTAMENTO DE JUNIN		12,719.00 habitantes	93,274,215	93,262,420	100.00	15.21
PANEL FOTOGRÁFICO						
 Perforación en roca fija, lugar. Carretera PALIAN PARIAHUANCA km 4+600  Encofrado y desencofrado de muro de contención lugar. Carretera PALIAN PARIAHUANCA km 2+350						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se ha logrado consolidar y delimitar las propiedades de los terceros Se ha Mejorado la transitabilidad peatonal y vehicular						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Factor climatológico						

Cuadro N° 152: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Transporte	2151786	"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO – VISTA ALEGRE – CHICCHE – CHONGOS ALTO – HUASICANCHA – PROVINCIA DE HUANCAYO – DEPARTAMENTO DE JUNIN – SALDO II ETAPA." con CÓDIGO ÚNICO 2151786"	Se viene ejecutando las señalizaciones, así como la colocación del pavimento asfáltico y las adicionales de obra el cual se tiene previsto a culminarse el 12 de febrero		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín- Provincia de Huancayo- Vista Alegre-Chongos alto-Huasicancha		5,510.00	38,137,678	38,135,447.48	99.99	81.88



REPLANTEO TOPOGRAFICO DE CUNETAS



CONSTRUCCION DE CUNETAS REVESTIDAS DE CONCRETO TIPO I

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- desarrollo eficiente y seguro de la infraestructura vía
- desarrollo de un plan integral que considere factores como el tráfico, el entorno ambiental, la topografía y las necesidades de la comunidad.
- aceptación y apoyo de la comunidad local a través de la comunicación transparente, la consideración de sus necesidades y la minimización de molestias
- Mejorar la funcionalidad del sistema de transporte, conectando de manera eficiente áreas previamente aisladas o mejorando la conectividad existente.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- La dificultad más relevante, fue el expediente técnico, en visto que, por la mala elaboración y evaluación, provocó consultas, adicionales y solicitudes de ampliaciones de plazo.
- Uno de las dificultades también se dio por la reptación del suelo, que provoco asentamiento del suelo, específicamente en el km. 36+700, considerando que para realizar un estudio de la reptación del suelo es un estudio especializado, ya que esta reptación es provocada por lagunas que se encuentran a 15 km. Aprox.
- Considerando que las maquinarias que se utilizaron para la ejecución de la obra, no estuvieron en buenas condiciones ya que constantemente tendían a malograrse.

Cuadro N° 153: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2330254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGIÓN JUNÍN		BUSCA FORTALECER LA EDUCACIÓN PRIMARIA Y SECUNDARIA CON INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA, MOBILIARIO, CAPACITACIÓN DOCENTE Y MOVILIDAD ESCOLAR. BENEFICIA A 4,714 PERSONAS EN EL DISTRITO DE PERENE	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín		4,714 estudiantes	6,497,287.00	6,272,894.00	96.55	18.26%
 Encofrado y desencofrado de placas						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se han realizado los correspondientes trámites para llevar a cabo la licitación tanto de la ejecución como de la supervisión de esta importante obra, que sin duda redundará en beneficio de la comunidad estudiantil de Perené, Chanchamayo.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Se presentaron algunas incompatibilidades con el expediente técnico las cuales fueron absueltas posteriormente por la oficina de estudios						

Cuadro N° 154: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	EDUCACIÓN	2488764	"RECUPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA UGEL RIO TAMBO, UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN N 312, DISTRITO DE RÍO TAMBO – PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNÍN"		EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD DOTAR UNA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE LA UGEL DEL DISTRITO DE RIO TAMBO PROVINCIA DE SATIPO Y DEPARTAMENTO JUNÍN LA CUAL PRETENDE BRINDAR MEJORES SERVICIOS A LA COMUNIDAD EDUCATIVA POR LO QUE SE REALIZARA LA CONSTRUCCIÓN DE UNA NUEVA INFRAESTRUCTURA DE LA UNIDAD EJECUTORA DE EDUCACIÓN N°312 DE LA UGEL RIO TAMBO.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Distrito de Rio Tambo, Departamento de Junín		10,794 alumnos	6,553,163	4,507,913.06	97.5	66.39



IMAGEN N°01: Construcción de nueva infraestructura de la UGEL RIO TAMBO, en el centro poblado de Nuevo Puerto Prado, Distrito de Rio Tambo, Provincia de Satipo, Departamento de Junín.

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Se viene realizando la construcción de la nueva infraestructura de la UGEL RIO TAMBO sin ninguna dificultad, estando actualmente en el último nivel, realizándose paralelamente trabajos de acabados, cerco perimétrico, Infraestructura de Auditorio, obras civiles exteriores, etc.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Factores e inclemencias climáticas que dificultaron en gran parte el avance de la obra, debido a los diferentes efectos ocurridos por las altas precipitaciones pluviales.
- Necesidad de incorporación de partidas y actividades adicionales para llegar al objetivo de la obra, así como la deducción de componentes que bajo evaluaciones técnicas no son requeridas a fin de mejorar el funcionamiento de la nueva infraestructura de la Ugel Rio Tambo..

Cuadro N° 155: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	Educación	2594091	"CONSTRUCCIÓN DE COBERTURA, CERCO PERIMÉTRICO Y ESPACIO DE RECREACIÓN PASIVA; REPARACIÓN DE AMBIENTE COMPLEMENTARIO; ADEMÁS DE OTROS ACTIVOS EN EL (LA) I.E. PILOTO SANTA ISABEL DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"	EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD MEJORAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN, REALIZÁNDOSE PARA ELLO LA CONSTRUCCIÓN DE COBERTURAS PARA LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS, MEJORAMIENTO A NIVEL DE PINTADO Y ACONDICIONAMIENTO DE PABELLONES A FIN DE CONTAR CON UNA UNIDAD PRODUCTORA QUE BRINDE EL SERVICIO DE EDUCACIÓN CON CAPACIDAD INSTALADA ADECUADA.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia y distrito de Huancayo, Departamento de Junín		9,000,000 Estudiantes	2,814,462	2,814,461	100.00	93.40

PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.



IMAGEN N°01: Trabajos de mantenimiento y puesta en funcionamiento de válvulas de la piscina de la I.E Santa Isabel.



Imagen N°02: Suministro e instalación de mamparas en los diferentes accesos a los pabellones educativos de la I.E Santa Isabel



Imagen N° 03: Cobertura de lasas deportivas de la I.E. Santa Isabel

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Mejoramiento de espacios deportivos, dotando de coberturas que permitan cubrir de los rayos solares a la población estudiantil Durante las actividades deportivas.
- Mejoramiento integral de los ambientes la infraestructura de la I.E. PILOTO SANTA ISABEL.
- Mejoramiento de los espacios de servicios múltiples destinados a laboratorio, piscina, áreas verdes, etc.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Atención oportuna a las necesidades de la I. E. SANTA ISABEL, toda vez que durante el proceso de ejecución de la obra se vienen generando solicitudes de nuevas actividades, las cuales binen siendo absueltas y atendidas oportunamente.

Cuadro N° 156: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2494144	"MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN"		Obra destinada a cerrar brechas de educación en la Región Junín	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución Física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junín		1,656 estudiantes	41,490,243	41,478,748	100 %	24.94 %
 Verificación de espesor de capas no magnéticas como pinturas						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró el avance continuo a pesar del impedimento climatológico y de las diversas consultas realizadas, las cuales en su mayoría se estuvo absolviendo por la Entidad. Se solucionaron temas de coordenadas correctas conforme a la SUNARP.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Deficiencias en el expediente Técnico No se cuenta con puntos de abastecimiento de agua ni puntos de desagüe conectados a una red principal. Demora en la aprobación de Expediente Técnico de Media tensión.						

Cuadro N° 157: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2242276	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCION DE PALIAN DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN		EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR Y AMPLIAR EL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA I.E. LA ASUNCION DE PALIAN, HUANCAYO	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		3,752 estudiantes	3,183,929.00	3,182,239.00	100.00%	21.16%
 Encofrado de vigas piso 2 colegio La asunción						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se han realizado los correspondientes trámites para llevar a cabo la licitación tanto de la ejecución como de la supervisión de esta importante obra, que sin duda redundará en beneficio de la comunidad estudiantil de Huancayo, Perú.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
El proceso de selección de la supervisión de obra demoró debido a que los postores presentaron algunas observaciones a las bases integradas del proceso.						

Cuadro N° 158: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2112355	"MEJORAMIENTO INTEGRAL DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DEL CENTRO DE EDUCACION DE TECNICO PRODUCTIVO CETPRO – HUANCAYO, JUNIN		La solución adoptada para el conjunto arquitectónico está determinada por la topografía del terreno y una arquitectura racionalista. Se plantea tres bloques enlazados de forma consecutiva, de formas geométricas simples y con criterios ortogonales.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo, Departamento de Junín		1318 estudiantes	7,471,890	7,471,888.13	100.00	65.08
PANEL FOTOGRÁFICO  IMAGEN N° 05: VERTIDO DE CONCRETO PARA CONTRAPISO EN EL MODULO 4-5ºPISO						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- La obra se encuentra con un avance físico de 65.08 %. - Culminación al 100% el componente ESTRUCTURAS antes de lo programado.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Deficiencias en el Expediente Técnico, en consecuencia, a ello existen adicionales de obra.						

Cuadro N° 159: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2134888	"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN SECUNDARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA LOS ANDES DEL ANEXO DE SHICUY DISTRITO DE SAN JUAN DE JARPA, PROVINCIA DE CHUPACA DEPARTAMENTO DE JUNÍN"		-suficiente y adecuada infraestructura pedagógica, ambientes administrativos, complementarios. -adecuado espacio para la práctica recreativa. - adecuada infraestructura para la seguridad exterior interior.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín		1032 estudiantes	7,710,225.00	7,710,223.75	100.00	64.07
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
						
09-12-2023 se puede verificar los trabajos en la especialidad de arquitectura en los 3 módulos.			20-12-2023, Se puede verificar los trabajos de la cobertura sobre estructura metálica de la losa deportiva.			
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
La inversión en su componente de infraestructura, se encuentra en ejecución física acumulado del 64.07% según la valorización n° 10b correspondiente al mes de diciembre (21 al 31), encontrándose retrasada en un 3.1% respecto al avance programado acumulado de 67.17%, también cuenta con el adicional de obra n° 1 a la fecha se encuentra culminado al 100%, el motivo de las frecuentes lluvias que afectaron el avance de la obra donde se viene ejecutando: trazo y replanteo, seguridad y salud, losa deportiva, estructuras de concreto armado en columnas y vigas y armado de arco metálico parabólico de 20.50 mts y el patio multiusos armado de arco metálico parabólico de 8.91 mts.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Al mes de diciembre se encuentra retrasada en un 3.1%, el motivo fueron las frecuentes lluvias que afectaron el avance de la obra.						

Cuadro N° 160: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2458276	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N° 30068 VIRGEN DE FÁTIMA - NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO DEL DISTRITO DE CHUPACA - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNÍN		ADECUADA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA I.E. N°30068 "VIRGEN DE FÁTIMA" – NIVEL INICIAL Y PRIMARIO DEL BARRIO CARMEN ALTO, DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín		572 estudiantes	3,787,607.00	3,697,044.1	97.60	21.03

PANEL FOTOGRÁFICO

FOTOGRAFÍA N° 01: Se aprecia la personal laborando en segundo nivel de la infraestructura habilitando acero, Chupaca

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

Se logró el vaciado del techo del primer nivel, el cual la obra se encuentra avanzado.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

Deficiencia en el expediente técnico.
Demora en la intervención del cerco perimétrico debido que las viviendas aledañas la cimentación son superficiales.

Cuadro N° 161: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2200807	"MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO – HUANCAYO – JUNIN"		EL PROYECTO CUENTA CON LOS SIGUIENTES COMPONENTES EN EJECUCION: PEDAGOGICA (03 DE MODULOS DE AULAS Y 01 MODULO TALLERES), MODULO ADMINISTRATIVO, RECREATIVA (LOSAS MULTIFUNCIONALES Y ESTADIO DEPORTIVO), COMPLEMENTARIOS (PISCINA, AUDITORIO Y CAFETERIA)	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución Física 2023 (J)
Distrito de El Tambo - Provincia de Huancayo - Departamento de Junín		2,800 estudiantes	S/. 18,935,968.00	S/. 18,935,964.57	100.00 %	72.79 %
PANEL FOTOGRÁFICO  FOTO PANORAMICA DE COMPONENTE AULAS, TALLERES, Y LOSAS MULTIFUNCIONALES – OCTUBRE 2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Gestión de presupuesto para continuidad del proyecto, corrección de deficiencias técnicas ejecutadas en la gestión pasada.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Incumplimientos contractuales por parte del contratista.						

Cuadro N° 162: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD	2337618	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN		EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO PEDRO SANCHEZ MEZA EN CHUPACA, JUNÍN. SE ENFOCA EN ATENDER LA LIMITADA ACCESIBILIDAD A SERVICIOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD EN LA REGIÓN, BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN DE 63,429 PERSONAS. LA PROPUESTA CONSISTE EN LA DEMOLICIÓN TOTAL Y CONSTRUCCIÓN DE UN NUEVO ESTABLECIMIENTO, ADQUISICIÓN DE EQUIPAMIENTO, DESARROLLO DE PLANES DE MANTENIMIENTO Y CAPACITACIÓN, ASÍ COMO LA IMPLEMENTACIÓN DE MEDIDAS DE REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín		63,429 habitantes	20,323,932.00	19,967,111.00	98.20%	38.14%
 7/10/23, 8:54 a.m. HOSPITAL DE CHUPACA						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se ha realizado la habilitación presupuestal para dar continuidad a la ejecución de las obras Se han realizado los trámites con el fin de establecer la forma de pago del equipamiento médico mediante una adenda, debido a que era un inconveniente para ejecutar dicha partida que equivale aproximadamente a 42 millones de soles						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Se presentaron desafíos debido a las controversias surgidas por el adicional N° 07 y el deductivo vinculante N° 06 en la obra, relacionados con la reformulación del sistema de baja tensión y redimensionamiento del sistema de aire acondicionado. Actualmente, se ha alcanzado un consenso entre el contratista, la supervisión y la entidad, superando las dificultades. Se espera reiniciar la obra en breve, destacando el acuerdo logrado para avanzar en el proyecto.						

Cuadro N° 163: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2323267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN		LA OBRA TIENE AVANCE ACUMULADO DEL 48.69% SEGÚN LA VALORIZACIÓN N°05 CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE ENCONTRÁNDOSE ADELANTADO EN UN 0.11% RESPECTO AL AVANCE PROGRAMA ACUMULADO DE 48.58% DONDE SE VIENE EJECUTANDO: COLOCACIÓN DE CORREAS EN EL MÓDULO DE RECURSOS ACADÉMICOS, ARMADO DE ACERO PARA ESCALERAS Y COLOCACIÓN DE TUBO DE ACERO NEGRO EN EL CERCO PERIMÉTRICO, COLOCACIÓN DE CONCRETO EN ZAPATAS PARA CERCO PERIMÉTRICO DE LADO FRONTAL, ASENTADO DE LADRILLOS EN DIVISIONES INTERNAS, ENCONFRADO DE TRIBUNAS DE LOSA DEPORTIVA Y COLOCACIÓN DE CONCRETO PARA LOSA DEPORTIVA, COLOCACIÓN DE CORREAS METÁLICAS EN EL MÓDULO DE RECURSOS ACADÉMICOS, COLOCADO DE ACERO EN VIGAS EN EL MÓDULO SS.HH Y DEMÁS TRABAJOS QUE CONFORMAN EL EXPEDIENTE TÉCNICO DE LA OBRA	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Departamento de Junín		200 estudiantes	7,470,646	7,470,545	100.00	48.69
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se tiene un avance de 48.69% de avance físico ligeramente adelantado de 0.11%						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Consecuencia de las lluvias intensas no permite acceso terrestre y pluvial a la Comunidad Nativa de Potsoteni para el traslado de materiales y personal siendo un peligro para la obra.						

Cuadro N° 164: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Educación	2273073	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SECUNDARIA EN LA I.E. JOSE CARLOS MARIATEGUI, DISTRITO DE LA OROYA, PROVINCIA DE YAULI - JUNIN"		Dotar a la población estudiantil beneficiaria de una infraestructura educativa adecuada que influye y estimule en su aprendizaje y desarrollo integral, por lo cual se ha dispuesto la intervención del proyecto	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
YAULI- LA OROYA		8,808 estudiantes	13,941,280	13,859,417	99.40%	56.1%

PANEL FOTOGRÁFICO



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Culminación del casco estructural de todos los módulos, y gran parte de muros térmicos.
- Se lograron subsanar las consultas más resaltantes emitidas por la empresa
- A la fecha se está logrando ejecutar una moderna infraestructura para el beneficio de la población estudiantil.
- Cuenta con un avance físico de 56.1% y un avance financiero de 52%, y en la ejecución de la obra.
- Se tiene un CONSORCIO SUPERVISOR EDUCATIVO, quien verifica y vela la correcta ejecución de la obra a fin de no generar mayores gastos a la entidad.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Deficiencias en la elaboración del Expediente Técnico que genera ampliaciones de plazo, adicionales de obra, deductivos de obra.
- La demora en la Aprobación de las consultas por parte del proyectista.
- Demora en la presentación de adicionales a la entidad.
- Se continua con los tramites de Media Tensión (ELECTROCENTRO).

Cuadro N° 165: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	SECTOR DE INTERVENCIÓN (A)	N° CUI (SÓLO PROYECTOS) (B)	NOMBRE DEL ACTIVIDAD / PROYECTO (C)		BREVE DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD/PROYECTO (D)	
1	EDUCACION	2432713	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE EDUCACION SUPERIOR EN EL INSTITUTO PEDAGOGICO PEDRO MONGE CORDOVA – DISTRITO DE JAUJA – PROVINCIA DE JAUJA – DEPARTAMENTO DE JUNIN		CONSTRUCCIÓN DE NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA AMBIENTES ADMINISTRATIVOS, PEDAGÓGICOS COMPLEMENTARIOS, SERVICIOS GENERALES, Y SEGURIDAD, REHABILITACIÓN DE AULAS E IMPLEMENTACIÓN CON MOBILIARIO Y EQUIPOS EN CONCORDANCIA CON LA RESOLUCIÓN VICEMINISTERIAL N° 100-2020-MINEDU “CRITERIOS DE DISEÑO PARA INSTITUTOS Y ESCUELAS DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGÓGICA”.	
ÁMBITO TERRITORIAL DE INTERVENCIÓN DE LA ACTIVIDAD O PROYECTO (E)		NÚMERO Y TIPO DE BENEFICIARIOS (F)	PIM 2023 S/ (G)	EJECUCIÓN FINANCIERA A NIVEL DEVENGADO 2023 S/ (H)	% EJECUCIÓN FINANCIERA 2023 (I)	% EJECUCIÓN FÍSICA 2023 (J)
PROVINCIA DE JAUJA DEPARTAMENTO DE JUNÍN		500 HABITANTES	6,267,832	6,265,403	100%	96.7%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
SE LOGRÓ CULMINAR E INAUGURAR LA OBRA, HACIENDO LA TRATATIVA PARA EL 2024 LA TRANSFERENCIA A LA ENTIDAD USUARIA Y CIERRE DEL PROYECTO EN EL INVIERTE PE (BANCO DE PROYECTOS)						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
LA DEFICIENTE CONCEPCIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO, QUE GENERÓ 4 ADICIONALES DEDUCTIVOS VINCULANTES, MOTIVÁNDOSE A AMPLIACIONES DE PLAZO.						

Cuadro N° 166: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD	2359534	"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO – REGION JUNIN" con CUI: N° 2359534.		El presente proyecto consiste en la construcción de 3,973.90 metros cuadrado, el cual es la construcción de las siguientes áreas: 1.- Unidades productoras de servicios de salud; 2.- Unidades productoras de servicios, 2.1.- Administración, 2.2.- servicios generales, 2.3.- servicios complementarios:	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo – Departamento de Junín.		100,781.00	16,182,801	15,768,477	97.4%	16.26%
PANEL FOTOGRÁFICO  Encofrado para vaciado de techo, se verifica los trabajos de albañilería y encofrado de vigas. Centro de Salud de Puerto Ocopa de fecha diciembre del 2023.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
1.- Realizar los vaciados de las plateas de cimentación, puesto que las precipitaciones pluviales estuvieron con mucha intensidad no permitiendo continuar con los trabajos. 2.- Ejecutar la obra de acuerdo al cronograma de ejecución de obra.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
1.- Expediente técnico deficiente, es carente los planos de detalles constructivos, puesto que generan retrasos en la ejecución de la obra, debido a las consultas que se generan. 2.- Condiciones climatológicas, las precipitaciones pluviales no permiten el continuo avance de obra, generando retrasos en la ejecución de la obra.						

Cuadro N° 167: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Salud	2324642	"MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA – PROVINCIA DE YAULI – DEPARTAMENTO DE JUNÍN		Obra destinada a cerrar brechas de salud en la Región Junín	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Yauli – La Oroya		30,533 beneficiarios	18,802,328	18,802,328	100%	100%

PANEL FOTOGRÁFICO



Obra culminada en proceso de Liquidación de Obra, 27 de diciembre del 2023, lugar Yauli – La Oroya

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Se logró culminar la obra
- Se logró conformar el comité de recepción
- Se logró redactar el acta de observaciones de obras
- Se logró recepcionar la Obra

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Las principales dificultades deficiencias en el expediente técnico, el cual general aprobación de adicionales de obra.

Cuadro N° 168: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD	2346287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD CENTRO POBLADO DE HUANCAYO - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN		LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN, LAS PARTIDAS DEL COMPONENTE ESTRUCTURAS TIENE UN AVANCE DE 92.21%, SE VIENE VALORIZANDO TAMBIEN EQUIPAMIENTO MEDICO Y MOBILIARIO	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia - Huancayo Departamento - Junín		87,891 habitantes	81,608,620.00	81,608,608.00	100%	53.40%
 FOTOGRAFIA N°01: instalación de ventanas V-01 y V-02 de aluminio de cristal templado de 6mm- bloque 01						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
La obra tiene un avance físico adelantado en 11.75% respecto a lo programado correspondiente al mes de diciembre. Se tiene programado la culminación de la obra en el 2024.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Falta de habilitación presupuestal a partir del mes de octubre, por lo que, se solicitó al MINSA el presupuesto necesario para los pagos de las valorizaciones pendientes hasta el mes de diciembre.						

Cuadro N° 169: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD	2164051	SALDO DE OBRA DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN		EL PROYECTO CONCIBE LA EJECUCIÓN DEL SALDO DE OBRA DE UN HOSPITAL DEL TERCER NIVEL DE ATENCIÓN, EL CUAL DEBERÁ ESTAR PROVISTO CON LA INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO ADECUADOS PARA DOTAR DE SERVICIOS DE SALUD ÓPTIMOS A LA POBLACIÓN	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
DISTRITO DE HUANCAYO, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN		1,311,584 Habitantes	52,544,298	52,544,297	100.00	21.58
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se concretó después de mucho tiempo, el inicio de ejecución de la obra, dada su relevancia y estado de abandono en el que se encontró, - La aplicación continua de soluciones técnicas y trabajo colaborativo entre los stakeholders permite superar constantemente la problemática derivada de un expediente técnico deficiente y una ejecución inicial defectuosa. - Se elaboró un Proyecto complementario para almacenamiento del equipamiento médico y otros, dicha inversión se encuentra en proceso de selección a la fecha.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Vicios ocultos derivados de una ejecución inicial defectuosa - Equipamiento médico sin espacios para almacenamiento, así como pérdida de vigencia tecnológica - El Expediente técnico de saldo de obra contiene deficiencias e incompatibilidades						

Cuadro N° 170: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD	2279396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN		el proyecto de saldo de obra está conformado por 3 bloques principales, 3 bloques de interconexión, 13 bloques de menor envergadura, 3 bloques de seguridad y todo el cerco perimétrico, así como áreas de estacionamiento, veredas exteriores, rampas y áreas verdes.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo, Departamento de Junin		32,477	34,531,942.00	33,641,243.00	82.2 %	98.1%
 21 dic. 2023 4:26:55 p. m. on de perimetrales y baldosas en 1.º c.rr piso 1 bloque B						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Llegada de grupos electrógenos a obra, planta de oxígeno, chillers, asimismo se viene realizando todo lo necesario para el equipamiento biomédico que demanda el Proyecto, para ello se está realizando la culminación de ambientes al 100% para colocarlos en su disposición final.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Demora en aprobación de adicionales que limitan los avances en obra						

Cuadro N° 171: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SALUD	2337618	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN		EL PROYECTO TIENE COMO OBJETIVO MEJORAR Y AMPLIAR LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL ESTABLECIMIENTO PEDRO SANCHEZ MEZA EN CHUPACA, JUNIN.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chupaca, Departamento de Junín		63,429 habitantes	20,323,932.00	19,967,111.00	98.2%	38.14%
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se ha realizado la habilitación presupuestal para dar continuidad a la ejecución de las obras Se han realizado los trámites con el fin de establecer la forma de pago del equipamiento médico mediante una adenda, debido a que era un inconveniente para ejecutar dicha partida que equivale aproximadamente a 42 millones de soles						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Se presentaron desafíos debido a las controversias surgidas por el adicional N° 07 y el deductivo vinculante N° 06 en la obra, relacionados con la reformulación del sistema de baja tensión y redimensionamiento del sistema de aire acondicionado. Actualmente, se ha alcanzado un consenso entre el contratista, la supervisión y la entidad, superando las dificultades. Se espera reiniciar la obra en breve, destacando el acuerdo logrado para avanzar en el proyecto.						

Cuadro N° 172: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	SANEAMIENTO	2017383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO – SEGUNDO SALDO		AMPLIACION Y REHABILITACION DE REDES COLECTORAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS; NUEVAS CONEXIONES Y RECONEXIONES DOMICILIARIAS; CONSTRUCCION DEL EMISOR Y DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE PRIMARIO (CONSISTENTE EN CAMARA DE REJAS, MEDIDOR DE CAUDAL, ALIVIADERO Y 4 LAGUNAS FACULTATIVAS EN SERIE).	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Departamento de Junín		22,544 personas	8,392,874	8,378,890	99.8	77.73
 Vaceado de concreto para reposición de pavimento rígido eb jr. Colonos fundadores (SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SATIPO) – FECHA: 15/11/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- En cuanto a los avances que se tienen en la obra se detalla lo siguiente: La obra principal tiene un avance físico ejecutado acumulado de 77.73 %, a pesar de las complicaciones climatológica se obtuvo buen avance. - La correcta Instalación y montaje de equipamiento hidráulico, en desarenador – PTAR. - Vaceado de losa de fondo en desarenador – PTAR.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

- Deficiencias en el expediente técnico, el cual viene generando adicionales de obra, falta de disponibilidad presupuestal.

Cuadro N° 173: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Electrificación	2094610	"CONSTRUCCIÓN DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNÍN"		EL PROYECTO TIENE COMO FINALIDAD MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LAS 8 COMUNIDADES NATIVAS DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO DOTANDO DE LOS SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA. CON EL CUAL SE PRETENDE SATISFACER LAS NECESIDADES DE DEMANDA REQUERIDA POR LAS 8 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RÍO TAMBO, BRINDANDO A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA EL ACCESO A LA ENERGÍA ELÉCTRICA EN FORMA PERMANENTE Y CONFIABLE.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Distrito de Río Tambo, Departamento de Junín		3164 habitantes	2,595,260	2,595,258.11	100.00	98.90
						
IMAGEN N°01: Construcción de Bocatoma para la Central Hidroeléctrica de Betania						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se realizó la construcción de una Central Hidroeléctrica en la comunidad de Betania, el cual se encuentra diseñado y proyectado a satisfacer con la generación de energía eléctrica para las 8 Comunidades de la Cuenca del Río Tambo. - Se realizó el tendido de Líneas primarias, Redes Primarias y secundarias, Acometidas domiciliarias cortas y largas, casa de Máquinas y demás componentes relacionados al proyecto. - Se logró la generación de energía eléctrica en la Central Hidroeléctrica, dotando del acceso a la energía eléctrica a la población en general de las 8 Comunidades Nativas de la Cuenca del Río Tambo.						

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
- Dificultad en el acceso al lugar donde se desarrolló la obra, debido a la falta de carreteras de acceso, siendo la principal vía de acceso mediante transporte pluvial. - Factores e inclemencias climáticas que dificultaron en gran parte el avance de la obra, debido a los diferentes efectos ocurridos por las altas precipitaciones pluviales. - Necesidad de incorporación de partidas y actividades adicionales para llegar al objetivo de la obra.	

c. Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones

Cuadro N° 174: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Transporte		MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA VIA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA(JU-108, JU-109, JU-110, JU-112, JU-114, JU-115, JU-116)		Es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo del camino y que se realizan diariamente en los diferentes tramos de la vía.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Huancayo y Chupaca		166,120 pobladores	5,155,760	2,800,278	54.31	56.76

BACHEO Y LIMPIEZA DE CUNETAS



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

El mantenimiento rutinario se encuentra ejecutado y el contratista ya ha solicitado la conformación del comité de recepción.


PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

La actividad no llegó al presupuesto destinado por demora en los Procesos de Selección por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Cuadro N° 175: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Transporte		MANTENIMIENTO PERIODICO DE LA VIA DEPARTAMENTAL NO PAVIMENTADA (JU-101, JU-102, JU-108, JU-111, JU-113, JU-118, JU-119, JU-120, JU-121, JU-122)		Tiene el propósito de evitar la aparición o el agravamiento de defectos mayores, de preservar las características superficiales, de conservar la integridad estructural de la vía y de corregir algunos defectos puntuales mayores.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Yauli La Oroya, Huancayo, Concepción y Tarma		287,216 pobladores	21,193,370	15,311,955	72.25	90.3

MANTENIMIENTO CON MAQUINARIAS PESADAS



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

El mantenimiento periódico se encuentra ejecutado, recepcionado y a la espera de su liquidación.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

La actividad no llegó al presupuesto destinado por demora en los Procesos de Selección por parte del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado.

Cuadro N° 176: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Comunicaciones	Actividad	AOI00082100034 / Mantenimiento de equipos del Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal.		Realizar mantenimiento preventivo, correctivo y/o reactivación de los sistemas de Radio y Televisión y sistemas de comunicación HF del "Conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC".	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
9 provincias de la región Junín.		106,500 habitantes beneficiados en 213 localidades beneficiadas	1'919,520.00	1'440,852.67	75.06 %	97.53 %
						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS						
- En el año 2023 se logró 97.53 % de mantenimientos preventivos y correctivos ejecutadas a las estaciones retransmisoras del conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC. - Se logró la operatividad de 170 estaciones retransmisoras CPACC. - Se realizó la reactivación de 03 estaciones retransmisoras CPACC en las provincias de Junín, Tarma y Satipo.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS						
Las inclemencias del tiempo y las carreteras en mal estado que dificultan el traslado del personal técnico para realizar los mantenimientos preventivos y correctivos ejecutadas a las estaciones retransmisoras del conglomerado de Proyectos de Apoyo a la Comunicación Comunal – CPACC.						

Cuadro N° 177: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	Comunicaciones	Actividad	AOI00082100035 / Promoción y Regulación de sistemas de comunicaciones.	Monitoreo de operación y cese de estaciones de radiodifusión autorizados, verificación del correcto uso de la banda aeronáutica y de la cobertura radioeléctrica de las estaciones,

				verificación y mediciones de los límites máximos permisibles de RNI.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
9 provincias de la región Junín.	provincias: Yauli, Tarma, Jauja, Concepción, Junín, Chupaca, Satipo, Chanchamayo y Huancayo.	823,077.00	727,805.66	88.42 %	100 %



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS

- En el año 2023 se logró realizar 1,285 monitoreos de las estaciones autorizadas en las bandas OC, OM, FM, VHF, UH de la canalización de las 09 provincias de la región Junín.
- Se realizaron 403 mediciones de Radiaciones No Ionizantes.
- Se realizó 11 verificaciones de la banda aeronáutica Se tiene 3 puntos para verificación del correcto uso de la banda aeronáutica, ubicadas en la provincia de Jauja (Aeropuerto Francisco Carle), Satipo (Aeropuerto Mayor PNP Nancy Flores Paucar) y Chanchamayo (Base Aérea San Ramón).
- Se realizó 04 eventos de difundir y promocionar información respecto a los procedimientos regulados por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, sensibilizar a la población en el tema de Radiaciones No Ionizantes lo cual permita la expansión de la instalación de infraestructura de Telecomunicaciones.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS

Carencia de profesional técnico con experiencia en el uso de equipos de medición de campo electromagnético.

1.12 SUB GERENCIA DE DESARROLLO SATIPO

Cuadro N° 178: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
----	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--

1	Educación	2323267	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (IE. PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO - JUNIN		INSPECCIÓN Y MONITOREO A LA OBRA "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA EN LA INSTITUCIONES EDUCATIVAS (PUEBLO LIBRE Y LA IE. POTSOTENI, DISTRITO DE MAZAMARI - SATIPO – JUNÍN"		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)			Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Departamento de Junín			1955 habitantes	7,470,646.00	7,470,646.00	100.00	48.69



Inspección Y Monitoreo de los trabajos realizados durante el 27 de octubre del 2023



Inspección Y Monitoreo de los trabajos realizados durante el 27 de octubre del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)	
	Teniendo un avance acumulado del 48.69% según la valorización N°05 correspondiente al mes de diciembre encontrándose adelantado en un 0.11% respecto al avance programado acumulado de 48.58%.
	Se ejecutó: colocación de correas en el módulo de recursos académicos, armado de acero para escaleras y colocación de tubo de acero negro en el cerco perimétrico, colocación de concreto en zapatas para cerco perimétrico de lado frontal, asentado de ladrillos en divisiones internas, encofrado de tribunas de losa deportiva y colocación de concreto para losa deportiva, colocación de correas metálicas en el módulo de recursos académicos, colocado de acero en vigas en el módulo SS.HH y demás trabajos que conforman el expediente técnico de la obra.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)	
	A La Fecha La Obra Cuenta Con Un Acta De Suspensión De Plazo De Ejecución De Obra N° 01 A Partir Del 20 De diciembre Del 2023 Por Causas No Atribuibles Al Contratista (Precipitaciones Pluviales).

Cuadro N° 179: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
1	SALUD - SALUD INDIVIDUAL - ATENCIÓN	2359534	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC.	INSPECCIÓN Y MONITOREO A LA OBRA "MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL

	MÉDICA BÁSICA		NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCIÓN 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGIÓN JUNIN		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Departamento de Junín		100,781 habitantes	16,182,801.00	15,788,803.00	97.60%	16.30%



Inspección Y Monitoreo de los trabajos realizados durante el 24 de octubre del 2023



Inspección Y Monitoreo de los trabajos realizados durante el 24 de octubre del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- Teniendo un "avance físico acumulado" del 16.26% según la valorización N° 06 correspondiente al mes de diciembre del 1 al 20 del 2023, además según el cronograma programado al mes de diciembre se tiene el avance de 16.63% por lo tanto, la obra tiene un retraso de 0.37 %.
- las partidas que actualmente vienen ejecutando son: armado de fierro para las columnas y vigas para cimentación, armado de fierro para los estribos de las vigas perimetrales de los bloques, construcción del cerco perimétrico con cimentación profunda, construcción de muro perimetral. Relleno y compactado de base con material de préstamo. Vaciado de solados para cimentaciones, la misma que forman parte de la ruta crítica.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- Al 01 De Enero Del 2024, La Inversión En Su Componente Obra Se Encuentra Suspendida Desde El 21 De Diciembre Del 2023, Debido A Las Condiciones Climatológicas - Fuertes Precipitaciones Pluviales.

Cuadro N° 180: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)
----	----------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	--

1	EDUCACIÓN - EDUCACIÓN BÁSICA - EDUCACIÓN INICIAL	2249786	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 30008 - PAMPA MANDARINA, DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA SATIPO - JUNIN		INSPECCIÓN Y MONITOREO A LA OBRA MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADA N 30008 - PAMPA MANDARINA, DISTRITO PAMPA HERMOSA, PROVINCIA SATIPO - JUNIN	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Satipo, Departamento de Junín		1,679 habitantes	5,516,327.00	5,514,517.00	100%	26.68%



Inspección Y Monitoreo de los trabajos realizados durante el 20 de diciembre del 2023



Inspección Y Monitoreo de los trabajos realizados durante el 20 de diciembre del 2023

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

- con un porcentaje de avance físico acumulado de 26.68%, estando adelantado en 6.35%, respecto a lo programado, que es de 20.33%, debido al arduo trabajo y proyectándose a la suspensión de plazo, por motivo de lluvias torrenciales constantes, causal por el cual se trató de avanzar lo más que se pueda. las partidas que se ejecutaron para la última valorización fueron las siguientes: obras provisionales, trabajos preliminares, seguridad y salud, y plan de contingencia. así mismo; se espera que el reinicio de obra se de lo más antes posible, para continuar con la ejecución de obra y llegar a las metas.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- a la fecha la obra se encuentra suspendida desde el 21 de diciembre del 2023.

1.13 SUB GERENCIA DE DESARROLLO CHANCHAMAYO

Cuadro N° 181: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
	Multisectorial		"PROMOCIÓN DE LAS ACTIVIDADES ECONÓMICAS PRODUCTIVAS Y EL INCREMENTO DEL VALOR AGREGADO DE NUESTRO ÁMBITO"		Es la promoción de actividades económicas que conlleva a la participación de Agroproductores, Agroindustriales y otros en Ferias; y asimismo el fortalecimiento de capacidades en materia de agricultura a nivel educativo, capacitación del sector turístico, restaurant, hotel, agencia de viaje; capacitación del sector de producción MYPE a estudiantes con conocimiento microempresario.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo		585 personas asistidas	S/ 25,030.86	S/ 23,920.00	95.56%	100%
 CAPACITACION EN LOS TEMAS DE FORMALIZACION, MARKETING DE VENTAS EN CHANCHAMAYO. 20 DE NOVIEMBRE - 2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Agroproductores promoviendo sus productos agrícolas en Ferias y Eventos Agropecuarios y estudiantes con conocimiento de temas agrícolas, capacitación del sector turístico, restaurant, hotel, agencia de viaje; capacitación del sector de producción MYPE a estudiantes con conocimiento microempresario.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada Asignación Presupuestal y movilidad para realizar gestiones de la actividad operativa.						

Cuadro N° 182: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
	Ambiente		“PROMOCIÓN DE UNA GESTIÓN AMBIENTAL DE CALIDAD E INTEGRAL CON INSTITUCIONES EDUCATIVAS”		Acciones de sensibilización a estudiantes del nivel inicial y primario, sobre la importancia de la preservación y conservación del medio ambiente; considerando las variables determinadas en una Educación en Ecoeficiencia, como biodiversidad, residuos sólidos y otros.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo		1396 estudiantes del Nivel Inicial y Primario	S/ 38,156.10	S/ 36,499.48	95.65%	100 %
 SENSIBILIZACION: PROTECCIÓN DE LA VIDA SILVESTRE - I.E. N° 31264 HUACARA (26-10-2023)						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Docentes y alumnos encaminan valores y actitudes amigables a la preservación y conservación del medio ambiente.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada Asignación Presupuestal						

Cuadro N° 183: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
	Multisectorial		“PROMOCIÓN DE ACCIONES PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES EN INSTITUCIONES EDUCATIVAS DE NUESTRO AMBITO”	Acciones de sensibilización de la población estudiantil en temas de gestión del riesgo de desastres con fines de prevenir daños durante y después de eventos naturales que conlleve a la seguridad de la comunidad estudiantil.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)	Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)	
Provincia de Chanchamayo	1402 estudiantes del nivel inicial y primario.	S/ 40,750.18	S/ 38,507.00	94.50%	100%	



SENSIBILIZACION Y PREPARACION ANTE EVENTOS NATURALES - I.E. N° 31264 HUACARA (30-05-2023)

PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)
Población estudiantil manifiestan condiciones de reacción inmediata ante eventos naturales evitando daños personales.
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)
Limitada Asignación Presupuestal

Cuadro N° 184: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Institucional		DIFUSION Y CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES NORMATIVAS Y ADMINISTRATIVAS EMANADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL		Es la difusión de directivas emanadas por el Gobierno Regional Junín a los diferentes sectores del mismo GRJ asentados en la Provincia de Chanchamayo.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de CHANCHAMAYO, Departamento de JUNIN		64 Trabajadores	S/ 23,656.00	S/ 22,545.00	95.30%	100%
EVENTO CAPACITACION PRESENCIAL SOBRE TEMA “ACTOS DE CORRUPCION Y PROCEDIMIENTO SANCIONADOR Lugar: LA MERCED Fecha: 12 DICIEMBRE 2023. 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Implementación y cumplimiento por parte de los funcionarios y servidores públicos de las directivas emanadas, con fines de mejorar la eficiencia y eficacia en la atención a los usuarios.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Falta de interés de los directivos de los sectores en conocer la aplicación de las normas en la gestión administrativa a fin de evitar responsabilidades posteriores.						

Cuadro N° 185: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Multisectorial		"REALIZACIÓN DE ACCIONES ADMINISTRATIVAS, PATRIMONIALES, FINANCIERAS Y DE RECURSOS HUMANOS CONFORME AL MARCO NORMATIVO"		Adecuada administración de los recursos financieros, materiales, patrimoniales y de recursos humanos según normas vigentes.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Chanchamayo - Multidistrital		Población total de la provincia de Chanchamayo.	S/ 111,945.38	S/ 110,495.92	98.70%	100%
 ATENCIÓN ADECUADA Y EFICIENTE AL POBLADOR DE CHANCHAMAYO						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Adecuada y eficiente atención al usuario y/o poblador de la Provincia de Chanchamayo con la oportuna disponibilidad de bienes y servicios.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Atención tardía en pago de los servicios básicos ejecutado por la Sede Central.						

Cuadro N° 186: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Institucional		"EVALUACIÓN DEL AVANCE DEL DESEMPEÑO DE LA UNIDAD ORGANICA SEGÚN LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS"		Modificación, reprogramación y seguimiento continuo de las actividades operativas a través del aplicativo CEPLAN y formatos establecidos, detallándose los avances logrados.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Chanchamayo - Multidistrital		Población total de la provincia de Chanchamayo.	S/ 51,436.18	S/ 49,237.18	95.72%	100%
 REUNIÓN DE TRABAJO PARA LA EVALUACIÓN DEL POI 2023 - EXPOSICIÓN DE TAREAS DESARROLLADAS -30/11/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Información oportuna y fehaciente de los cambios y avances de las AO, en cumplimiento al cronograma establecido por la Sede Central – CEPLAN, todo ello sustentados mediante documentos (Actas) que confirman lo realizado.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Falta de información técnica oportuna.						

Cuadro N° 187: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
	Multisectorial		"PROMOCIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ADECUADA EJECUCIÓN DE INFRAESTRUCTURA BASICA Y ESPECIALIZADA – PROYECTOS DE INVERSION CONFORME A LAS FACULTADES DELEGADAS"	Apoyo a los proyectos en ejecución a través del seguimiento y monitoreo de los mismos, mediante el cual verificamos el proceso de ejecución del proyecto.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Chanchamayo		Población total de la Provincia de Chanchamayo	S/ 44,718.72	S/ 43,889.24	98.15%	100%
 SEGUIMIENTO Y MONITOREO OBRA: “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA E IMPLEMENTACION INTEGRAL DE LA I.E.S.T.P. LA MERCED - CHANCHAMAYO - JUNIN” –						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró que las obras tengan continuidad considerando que en el mismo se identificó problemas recurrentes dando soluciones a los mismos, en coordinación con los responsables técnicos de cada uno de los proyectos.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

1.14 SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI

Cuadro N° 188: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	SUB GERENCIA DE DESARROLLO YAULI		- PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DEL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO EN LAS ACTIVIDADES SOCIOECONOMICAS DE SU ÁMBITO.		La actividad presente consiste en realizar trabajos, actividades en conjunto, es decir, articulación entre las municipalidades, comunidades y direcciones de la región y la población en general.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Yauli Departamento de Junín		5,000 POBLADORES	22,182.52	22.125.93	100%	99.74%
 Presentación de actividades de feria alto andina 2023 La Oroya Feria del Empleo y formalización empresarial Fecha:20 de junio del 2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró la unión de la población, la comunidades campesinas, municipalidades distritales y provincial, con las empresas privadas como aliados estratégicos con la meta de exponer los diferentes productos, alimentos, y animales. Se logró la participación de 1000 ciudadanos de toda la provincia de Yauli la Oroya, con la participación de las empresas privadas y la dirección regional de trabajo y promoción del empleo Junín, con la meta de entregar más de 300 vacantes laborales.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
La principal dificultad fue la falta de una mayor información a toda la provincia. La provincia no cuenta con un lugar más adecuado para este tipo de eventos, tenemos que ubicarnos al frontis de la Carretera Principal que ciertamente nos lleva a mayores costos para contar con personal que este vigilando y el control vehicular sea de menor velocidad y de forma ordenada.						

1.15 SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN

Cuadro N° 189: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNÍN		PROMOVER LA PARTICIPACION DEL SECTOR PRIVADO Y SECTORES PUBLICOS EN LAS ACTIVIDADES SOCIO ECONOMICOS DE SU AMBITO.	ACCIONES EN FUNCIÓN DEL CALENDARIO CÍVICO; ACCIONES CÍVICAS DE APOYO A ZONAS DE EXTREMA POBREZA.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín Provincia de Junín, Distritos Junín, Carhuamayo, Ondores y Ulcumayo		TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA PROVINCIA DE JUNÍN	40,646.00	39,516.13	99.08	100
ACOMPANAMIENTO EN LA ENTREGA FINAL DE ACOMPACOERTIZOS DE AGRORURAL D.U. N°030-2023-PCMJ - 22/11/2023						
 						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
LA PARTICIPACIÓN DE LA SGDJ FUE CONSTANTE EN TODAS LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LOS DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS Y ENTIDADES PÚBLICAS, GENERANDO ESPACIOS DE PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN TAL ES EL CASO EL APOYO A LAS ORGANIZACIONES CIVILES PARA LA ARTICULACIÓN COMERCIAL, MEJORA DE SUS CAPACIDADES ECONÓMICAS POR MEDIO DE INSTALACIÓN DE PASTOS CULTIVADOS, COBERTIZOS, APOYO EN LA REALIZACIÓN DE EVENTOS DE DIFUSIÓN DE LAS ACTIVIDADES QUE BUSCAN LA PROMOCIÓN DEL APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS NATURALES Y CAPACIDADES TÉCNICAS POR MEDIO DE EVENTOS DE CAPACITACIÓN, BRINDÁNDOLES ASÍ MISMO EL SOPORTE TÉCNICO POR MEDIO DE LA REALIZACIÓN DE LOS TALLERES PARA LA ELABORACIÓN DE PLANES DE NEGOCIO PARA EL PROCOMPITE ENTRE OTROS.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						

- ✓ NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION A LOS GANADEROS Y AGRICULTORES.
- ✓ NO SE CONTO CON EL SERVICIO DE INTERNET, QUE LIMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES,
- ✓ NO SE TIENE IMPLEMENTADO EL ALMACÉN DE DEFENSA CIVIL PARA CASOS DE EMERGENCIA.
- ✓ NO SE CUENTA CON LOS PERSONALES ASIGNADOS A ESTA OFICINA DONDE NOS DIFICULTA NUESTRO TRABAJO.
- ✓ NO SE CUENTA CON UNA MOVILIDAD OPTIMA PARA PODER LLEGAR A LOS SITIOS MAS RECONDITOS DE NUESTRA PROVINCIA DE JUNIN.
- ✓ DIFICULTAD EN CONVOCAR A LAS ORGANIZACIONES DE LOS CENTROS POBLADOS QUE ESTÁN SITUADOS EN CEJA DE SELVA (LLAUPI, YUNGUL, PAMPA SECA Y RAYMONDY) POR LA DISTANCIA.
- ✓ LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE LA SGDJ, SE ENCUENTRA EN SESIÓN DE USO POR SER DEL MTC, Y MEDIANTE UN CONVENIO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO Y PAGO DE FLUIDO ELECTRICO Y AGUA.
- ✓ ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL GORE.

Cuadro N° 190: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
1	SUB GERENCIA DE DESARROLLO JUNIN		COORDINAR Y ORIENTAR ACCIONES DE RIESGO POR EMERGENCIA CON LAS PLATAFORMAS DE DEFENSA CIVIL DE LA PROVINCIA DE JUNIN Y MONITOREO EN EL PLAN DE GESTION DEL LAGO CHINCHAYCOCHA	CAPACITACIÓN Y ACCIONES DE SENSIBILIZACIÓN; TRABAJOS Y CAPACITACIONES CON LAS COMUNIDADES AL CONTORNO DEL LAGO CHINCHAYCOCHA EN CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MANEJO CHINCHAYCOCHA		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Región Junín Provincia de Junín, Distritos Junín, Carhuamayo, Ondores y Ulcumayo		TODA LA POBLACIÓN EN GENERAL DE LA PROVINCIA DE JUNÍN	53,373.00	52,858.06	99%	100%

SIMULACRO NACIONAL MULTIPLELIGRO - 06/11/2023



ENTREGA DE LOS KITS DE HERRAMIENTAS PARA LA ATENCIÓN DE SUS VÍAS POR EMERGENCIA - 30/11/2023



LIMPIEZA ANUAL DE RÍOS Y CANALES – 11 COMUNIDADES

- Empresa Statkraft



TALLERES Y CAPACITACIONES A LAS DIFERENTES COMUNIDADES



ENTREGA DE MATERIALES- SUB PROGRAMA GANADERO

• Empresa Electroperú



PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)

COMO CONSECUENCIA DE LAS LABORES IMPULSADAS POR LA SGDJ SE HA LOGRADO ALCANZAR EL OBJETIVO DE TENER UNA POBLACION PREPARADA, CAPACITADA PARA UNA RESPUESTA RAPIDA Y EFECTIVA SOBRE QUE HACER FRENTE A LOS DE DESASTRES NATURALES GENERADOS POR LAS LLUVIAS CONSTANTES EN LA ZONA, PRINCIPALMENTE SU MITIGACION DOTANDOLES DE HERRAMIENTAS PARA LA LIMPIEZA Y REAPERTURA DE SUS VIAS (CARRETERAS), HABIENDO REALIZADO TAMBIEN LA TAREA DE CONCIENTIZACION EN LA IMPORTANCIA DE PARTICIPAR DE LOS SIMULACROS PROGRAMADOS A NACIONAL POR EL SISTEMA NACIONAL DE DEFENSA CIVIL, CONSIENTISAR A TODA LA POBLACIÓN SOBRE EL MEDIO AMBIENTE Y EL CUIDADO DE NUESTRO LAGO CHINCHAYCOCHA QUE INVOLUCRA A LAS 11 COMUNIDADES QUE ESTAN INMERSO AL LAGO.

PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)

- ✓ NO SE CUENTA CON PRESUPUESTO PARA REALIZAR CURSOS DE CAPACITACION A LOS GANADEROS Y AGRICULTORES.
- ✓ NO SE CONTO CON EL SERVICIO DE INTERNET, QUE LIMITA EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES,
- ✓ NO SE TIENE IMPLEMENTADO EL ALMACÉN DE DEFENSA CIVIL PARA CASOS DE EMERGENCIA.
- ✓ NO SE CUENTA CON LOS PERSONALES ASIGNADOS A ESTA OFICINA DONDE NOS DIFICULTA NUESTRO TRABAJO.
- ✓ NO SE CUENTA CON UNA MOVILIDAD OPTIMA PARA PODER LLEGAR A LOS SITIOS MAS RECONDITOS DE NUESTRA PROVINCIA DE JUNIN.
- ✓ DIFICULTAD EN CONVOCAR A LAS ORGANIZACIONES DE LOS CENTROS POBLADOS QUE ESTÁN SITUADOS EN CEJA DE SELVA (LLAUPI, YUNGUL, PAMPA SECA Y RAYMONDY) POR LA DISTANCIA.
- ✓ LA INFRAESTRUCTURA DE LA OFICINA DE LA SGDJ, SE ENCUENTRA EN SESIÓN DE USO POR SER DEL MTC, Y MEDIANTE UN CONVENIO SE REALIZA EL MEJORAMIENTO Y PAGO DE FLUIDO ELECTRICO Y AGUA.
- ✓ ENTREGA TARDIA DE DOCUMENTOS POR PARTE DEL GORE.

1.16 SUB GERENCIA DE DESARROLLO TARMA

Cuadro N° 191: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Transporte	2527166	AOI00081800590: SEGUIMIENTO, MONITOREO E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA		Seguimiento e inspección del proyecto: REPARACION DE CALZADA; EN EL(LA) AV. VIENRICH TRAMO: AV. FCO DE PAULA OTERO - JR. LEONCIO PRADO Y JR. LEONCIO PRADO TRAMO: AV. VIENRICH - AV. PACHECO EN EL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA TARMA, DEPARTAMENTO JUNÍN.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Tarma, Departamento de Junín		89, 590.00	16,103.41	16,103.41	100.00%	100.00%
  Inspección del proyecto en la Av. Vienrich-Tarma Inauguración del proyecto en la Av. Vienrich-Tarma						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Proyecto concluido. Mejoramiento a nivel de asfaltado en caliente en la Av. Vienrich y el Jr. Leoncio Prado de la provincia de Tarma. Mejoramiento del movimiento económico y de transpirabilidad vehicular y peatonal en la provincia de Tarma.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
No se cuenta con una movilidad apropiada, solo se cuenta con una camioneta que ya, cumplió con su ciclo de vida y casi siempre necesita de mantenimiento y reparación. No se cuenta con presupuesto para difundir en los medios radiales, redes sociales y televisiva sobre el inicio, avance y culminación del proyecto de inversión. Los trabajadores nombrados en la Sub Gerencia de Desarrollo Tarma a la fecha laboran en el Gobierno Regional Junín Sede de hace varios años.						

Cuadro N° 192: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
2	Transporte	2606832	AOI00081800590: SEGUIMIENTO, MONITOREO E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA		Seguimiento e Inspección del proyecto: “REHABILITACIÓN DE CALZADA, EN EL (LA) VÍAS LOCALES DEL DISTRITO DE TARMA, PROVINCIA DE TARMA, DEPARTAMENTO DE JUNÍN”	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Tarma, Departamento de Junín		89, 590.00	14,052.17	14,052.17	100.00%	100.00%
  Inspección del proyecto en el Jr. Callao-Tarma Fecha: 28/11/2023 Inspección del proyecto en el Jr. Callao-Tarma Fecha: 21/12/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Avance del proyecto de inversión.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
No se cuenta con una movilidad apropiada, solo se cuenta con una camioneta que ya, cumplió con su ciclo de vida y casi siempre necesita de mantenimiento y reparación. No se cuenta con presupuesto para difundir en los medios radiales, redes sociales y televisiva sobre el inicio, avance y culminación del proyecto de inversión. Los trabajadores nombrados en la Sub Gerencia de Desarrollo Tarma a la fecha laboran en el Gobierno Regional Junín Sede de hace varios años.						

Cuadro N° 193: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
3	Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia	2484002	AOI00081800590: SEGUIMIENTO, MONITOREO E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA		Seguimiento y supervisión del proyecto: "MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CARRETERA VIA VECINAL JU 636, TRAMO: EMPALME 22B – UNATT HUANCUCRO, DISTRITO DE ACOBAMBA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de Acobamba, Provincia de Tarma, Departamento de Junín		89, 590.00	12,851.17	12,851.17	100.00%	100.00%
 Inspección del proyecto en la UNAAT-Acobamba Fecha: 07/12/2023  Inspección del proyecto en la UNAAT-Acobamba Fecha: 12/12/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Avance del proyecto de inversión.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
No se cuenta con una movilidad apropiada, solo se cuenta con una camioneta que ya, cumplió con su ciclo de vida y casi siempre necesita de mantenimiento y reparación. No se cuenta con presupuesto para difundir en los medios radiales, redes sociales y televisiva sobre el inicio, avance y culminación del proyecto de inversión. Los trabajadores nombrados en la Sub Gerencia de Desarrollo Tarma a la fecha laboran en el Gobierno Regional Junín Sede de hace varios años.						

Cuadro N° 194: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)		
4	Educación	2430718	AOI00081800590: SEGUIMIENTO, MONITOREO E INSPECCIÓN DE PROYECTOS Y OBRAS DE INVERSIÓN PÚBLICA	Seguimiento del proyecto: "MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA - JUNIN TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN"		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Provincia de Tarma, Departamento de Junín		89, 590.00	12,851.17	12,851.17	100.00%	100.00%
 Seguimiento del expediente técnico en el GORE-JUNÍN Fecha: 15/02/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Avance del proyecto de inversión.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
No se cuenta con una movilidad apropiada, solo se cuenta con una camioneta que ya, cumplió con su ciclo de vida y casi siempre necesita de mantenimiento y reparación. No se cuenta con presupuesto para difundir en los medios radiales, redes sociales y televisiva sobre el inicio, avance y culminación del proyecto de inversión. Los trabajadores nombrados en la Sub Gerencia de Desarrollo Tarma a la fecha laboran en el Gobierno Regional Junín Sede de hace varios años.						

EJE AMBIENTAL - OER 6: RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE SOSTENIBLE



1.17 GERENCIA REGIONAL DE RECURSOS NATURALES Y GESTIÓN AMBIENTAL

a. Sub Gerencia de Recursos Naturales y Gestión Ambiental


Cuadro N° 195: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N.º	Sector de intervención (A)	N.º CUI (Solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad / proyecto (D)	
1	Ambiente	-	Fortalecimiento de las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos degradados		Plantación de 11 hectáreas en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/.	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de Chongos Bajo		Ecosistema	320.00	320.00	100	100
 Fotografías: Reforestación en el distrito de Chongos Bajo, 15/12/2023 de la Actividad Fortalecimiento de las acciones de recuperación de los ecosistemas y los servicios ecosistémicos degradados.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Con fecha 15 de diciembre del 2023, se realizó la reforestación de 11 hectáreas con especies forestales nativas en el distrito de Chongos Bajo, provincia de Chupaca, en el marco de la Cruzada Verde.						
PRINCIPIALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada asignación presupuestal.						

Cuadro N° 196: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N.º	Sector de intervención (A)	N.º CUI (Solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad / Proyecto	Breve descripción de la actividad / proyecto (D)		
1	Ambiente	-	Gestión para la difusión del instrumento ambiental de zonificación ecológica y económica	Realizar la difusión de la Zonificación Ecológica y Económica, dirigido a los distintos actores del departamento de Junín.		
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/.	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		90 personas capacitadas	320.00	S/. 320.00	100	100
  Gestión para la difusión del instrumento ambiental de zonificación ecológica y económica, realizados en septiembre del 2023.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Se realizó la difusión de la Zonificación Ecológica y Económica a través de un enlace drive y código QR remitido a las gerencias regionales, direcciones regionales y municipalidades provinciales del departamento de Junín. - De igual forma, se compartió la información de ZEE y OT de acuerdo a la solicitud de las diferentes personas naturales y/o jurídicas						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada asignación presupuestal.						

Cuadro N° 196: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

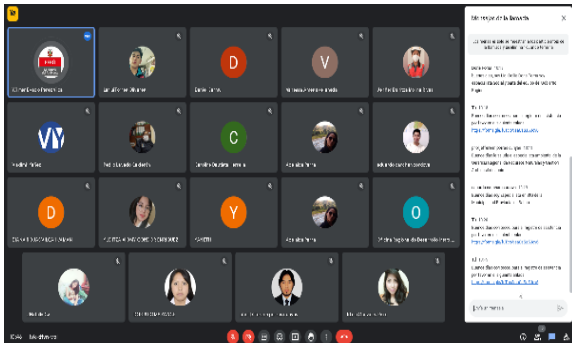N.º	Sector de intervención (A)	N.º CUI (Solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad / proyecto (D)	
1	Ambiente	-	Asistencia técnica y evaluación de la zonificación ecológica y económica		Realizar asistencias técnicas sobre la Zonificación Ecológica y Económica dirigido a las municipales provinciales y distritales del departamento de Junín.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/.	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Departamento de Junín		40 personas capacitadas	320.00	S/. 320.00	100	100
 Asistencia técnica y evaluación de la zonificación ecológica y económica, realizados en el mes de noviembre						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se realizaron tres asistencias técnicas y difusiones de la Zonificación Ecológica y Económica dirigido a las municipales provinciales y distritales del departamento de Junín con el acompañamiento del Ministerio del Ambiente, cumpliendo con la meta señalada en el POI y la asistencia de los actores de las 9 provincias del departamento de Junín.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada asignación presupuestal.						


Cuadro N° 197: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N.º CUI (Solo proyectos) (B)	Nombre de la Actividad / Proyecto		Breve descripción de la actividad / proyecto (D)	
1	Ambiente	-	Creación de AREAS DE CONSERVACION REGIONAL (ACR)		Mediante firma de Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional entre el Gobierno Regional de Junín y la Asociación PROPURUS se plantea la creación del Área de Conservación Regional Chuyas – Pariahuanca y nuevas áreas de interés regional.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios	PIM 2023 S/.	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/. (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% ejecución física 2023 (J)
Distrito de Pariahuanca y Santo Domingo de Acobamba Provincia de Concepción y Satipo		-	0.00	0.00	00.00 (Se realiza por Convenio)	00.00
 27 oct 2023 11:46:03 18L 527612 8683906 Camino Para Anexo de Otorongo Huancayo Junín Visita a los distritos de Santo Domingo de Acobamba y Pariahuanca en agosto y setiembre del 2023 en el marco de la actividad de Creación de una ACR.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Actualmente se tiene dos Propuestas de ACR: San Cristóbal De Pucutá y Chuyas – Pariahuanca – Santo Domingo De Acobamba. - Propuesta de ACR San Cristóbal De Pucutá: Se aprobó la primera etapa del proceso. - Propuesta de ACR Chuyas – Pariahuanca – Santo Domingo De Acobamba: Inicio de la primera etapa del proceso.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADASS (L)						

Cuadro N° 198: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	N° CUI (sólo proyectos) (B)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)		Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Ambiente	-	ELABORACIÓN DEL PLAN DE PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES ANTE INCENDIOS FORESTALES DE LA REGIÓN JUNÍN 2024-2030		El Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres ante Incendios Forestales de la Región Junín 2024-2030, es una herramienta de carácter preventivo para prevenir y reducir los incendios forestales .	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Nueve provincias de la Región		Poblacion en General 300,000 habitantes	00.00	00.00	00.00	100.00
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.						
				Transferencia de competencias de Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental (FISTA Y DIA) Lugar: GORE JUNÍN sede central, 18 de		
	diciembre 2023					
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
-Se aprobó el plan de Plan de Prevención y Reducción de Riesgo de Desastres ante Incendios Forestales de la Región Junín 2024-2030. -Se elaboró la propuesta de Resolución Ejecutiva correspondiente y actualmente se encuentra en el área presupuestal. -Se realizó la delegación de competencias ambientales del MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES al GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN para la Evaluación de Instrumentos de Gestión Ambiental, FITSA Y DIA						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Baja asignacion presupuestal						

Cuadro N° 199: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de Intervención (A)	Nombre de la Actividad (C)			Breve descripción de la Actividad (D)	
1	Ambiente	SISTEMA DE INFORMACION REGIONAL AMBIENTAL SIAR JUNIN			es una herramienta de apoyo y soporte que facilita la sistematización, acceso, uso, intercambio y distribución de la información ambiental.	
Ámbito Territorial de Intervención de la Actividad (E)		Número y tipo de beneficiarios(F)	PIM 2023 S/. (G)	Ejecución Financiera a nivel de Devengado (H)	% de Ejecución Financiera 2023 (I)	% de Ejecución Física 2023 (J)
Las Nueve provincias de la Región Junín		600,000 personas, ciudadanía en general Mujeres, otros.	320	320	100	100
PANEL FOTOGRAFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de la actividad/, lugar y fecha)						
 El SIAR JUNIN, se encuentra operativo desde el 22 de diciembre del 2023, y existe información acerca de la temática ambiental, investigaciones, indicadores, estadísticas.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Sistema de Información Regional -SIAR JUNIN en funcionamiento						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Lenta migración del SIAR JUNIN al SINIA , que duró aproximadamente ocho meses.						

Cuadro N° 200: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de Intervención (A)	Nombre de la Actividad (C)				Breve descripción de la Actividad (D)	
1	Ambiente	PLAN DE EVALUACION Y FISCALIZACION AMBIENTAL PLANEFA 2024				Ejecución de acciones de evaluación, supervisión y Fiscalización Ambiental para verificar los compromisos ambientales a Empresas que desarrollan Actividades. Económicas,	
Ámbito Territorial de Intervención de la Actividad (E)		Número y tipo de beneficiarios(F)	PIM 2023 S/. (G)	Ejecución Financiera a nivel de Devengado (H)	% de Ejecución Financiera 2023 (I)	% de Ejecución Física 2023 (J)	
Las Nueve provincias de la Región Junín		Población Regional en general: Niños, Mujeres, Varones.	820	820	100	100	
PANEL FOTOGRAFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de la actividad/, lugar y fecha)							
							
Equipo Técnico que elaboró el PLANEFA 2024, durante los tres talleres en los meses de enero y febrero del 2023							
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)							
- Ejecución de 03 talleres para la formulación del PLANEFA 2024 - Elaboración del Plan Anual de Evaluación y Fiscalización Ambiental PLANEFA 2024 - Resolución Ejecutiva Regional N° 124-2023-GR-JUNIN/GR - Informes de Inspección a 03 administrados en acuícolas artesanales y de menor escala y Hospitales para cumplimiento de sus obligaciones ambientales.							
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)							
- Inadecuada coordinación para la programación de las inspecciones con las Direcciones Regionales. - Limitado apoyo presupuestal y logístico.							

Cuadro N° 201: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de Intervención (A)	Nombre de la Actividad (C)			Breve descripción de la Actividad (D)	
1	Ambiente	FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE RECUPERACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS Y LOS SERVICIOS ECOSISTÉMICOS DEGRADADOS			El Sistema Regional de Conservación de Junín, “busca articular las diferentes modalidades de conservación de la diversidad biológica existentes en Junín, y asegurar la sostenibilidad de éstas en el tiempo”	
Ámbito Territorial de Intervención de la Actividad (E)		Número y tipo de beneficiarios(F)	PIM 2023 S/. (G)	Ejecución Financiera a nivel de Devengado (H)	% de Ejecución Financiera 2023 (I)	% de Ejecución Física 2023 (J)
Las Nueve provincias de la Región Junín		Población Regional en general: Niños, Mujeres, Varones.	320	320	100	100
 El SIREC JUNIN implementa las diferentes modalidades de conservación de la Diversidad Biológica						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
ORDENANZA REGIONAL N° 371-GRJ/CR, que aprueba la creación del Sistema Regional de Conservación del departamento de Junín (SIREC-Junín)						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
No se asignó Presupuesto para su implementación						

Cuadro N° 202: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de Intervención (A)	Nombre de la Actividad (C)	Breve descripción de la Actividad (D)			
1	Vivienda , Construcción y Saneamiento	OTORGAMIENTO DE CERTIFICACIÓN AMBIENTAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN EN SANEAMIENTO Y CONSTRUCCIÓN, DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL - DIA	Emisión de La Certificación Ambiental de Categoría I: Declaración de Impacto Ambiental – DIA, y FTA, de Proy. De Inversión del sector saneamiento que cuenten con clasificación anticipada, que se encuentren dentro del alcance territorial del GORE y que sean de titularidad de entidades y/o administrados de ámbito regional o local.			
Ámbito Territorial de Intervención de la Actividad (E)		Número y tipo de beneficiarios(F)	PIM 2023 S/. (G)	Ejecución Financiera a nivel de Devengado (H)	% de Ejecución Financiera 2023 (I)	% de Ejecución Física 2023 (J)
Multiprovincial, en las Nueve provincias de la Región Junín		Administrados y Población en General niños, mujeres, varones.	4,845	4845	100	100
 Supervisión Ambiental con Participantes locales en la reunión de trabajo en el local comunal de Portillo Alto. Distrito de Rio Negro Prov. De Satipo. 30/11/2023						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
04 FTA atendidas, 04 Supervisiones Ambientales ejecutadas						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
- Limitado apoyo presupuestal y Logístico - Desconocimiento de normas nacionales y regionales por autoridades regionales en Instrumentos de Gestión Ambiental en el sector saneamiento.						

Cuadro N° 203: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)			Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Ambiente	Promoción de la ejecución de buenas prácticas ambientales, en coordinación con las instituciones que Implementan la Estrategia Regional de Educación Ambiental			Las buenas prácticas ambientales son un conjunto de acciones y actividades que contribuyen a la reducción en el uso racional de los recursos naturales y con ello la disminución del impacto negativo de las actividades cotidianas en el medio ambiente.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincias de Junín, Chupaca y Huancayo		2,500 ciudadanos	7,874	7,874	100	100
 Campaña de Limpieza en el ACR Huaytapallana, en el mes de mayo						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
- Mediante Ordenanza Regional N° 373-2023-GRJ/CR se aprueba la Estrategia Regional de Educación Ambiental (EREA) Junín 2023-2027, instrumento orientador de la educación ambiental del departamento de Junín. - Ejecución de tres jornadas de limpieza en el Lago de Chinchaycocha de Junín, Humedal de Pucush Uclo, Chupaca y ACR Huaytapallana, con el objetivo de generar conciencia e involucrar a la ciudadanía sobre la recuperación y conservación de los ecosistemas y cuidado del medio ambiente.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada asignación presupuestal						

Cuadro N° 204: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)	Breve descripción de la actividad/proyecto (D)			
1	Ambiente	.-. Promoviendo la cultura, la educación y el conocimiento ambiental de los ciudadanos, instituciones públicas y sociedad civil	Promover una cultura, una educación y un conocimiento ambiental en los ciudadanos, es fortalecer la aplicación del enfoque ambiental, mediante actividades de acuerdo al calendario ambiental en fechas conmemorativas priorizadas, que orientan y motivan a la ciudadanía para que actúe responsablemente en favor de la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales.			
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Provincia de Huancayo		1,000 ciudadanos	10,118.00	10,118.00	100	100
PANEL FOTOGRÁFICO (Cada fotografía adjuntada deberá especificar: Nombre de la Actividad/Proyecto que representa, Lugar y Fecha.   Pasacalle por el Día de la Tierra, realizado en el mes de abril. Conferencia por el Día Mundial del Medio Ambiente						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
se logró ejecutar ocho eventos de sensibilización y concientización sobre la conservación y uso sostenible de los recursos naturales, como seminarios, charlas, conferencias y webinar sobre el agua, del planeta, de la Tierra, Eco amigables, por el Medio ambiente, bolsas de plástico, semana de Educación Ambiental y Día Áreas Naturales Protegidas.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada asignación presupuestal						

Cuadro N° 205: Principales actividades y proyectos ejecutados en el 2023

N°	Sector de intervención (A)	Nombre del Actividad / Proyecto (C)			Breve descripción de la actividad/proyecto (D)	
1	Ambiente	GESTION INTEGRAL DE LA COMISIÓN AMBIENTAL REGIONAL JUNIN			Las Comisiones Ambientales Regionales y Municipales son las instancias de gestión ambiental encargadas de coordinar y concertar la Política Ambiental de sus jurisdicciones. Tienen la finalidad de promover el diálogo y el acuerdo entre los sectores público y privado y la sociedad civil.	
Ámbito Territorial de intervención de la actividad o proyecto (E)		Número y tipo de beneficiarios (F)	PIM 2023 S/ (G)	Ejecución Financiera a nivel devengado 2023 S/ (H)	% Ejecución financiera 2023 (I)	% Ejecución física 2023 (J)
Nueve provincias de la Región		9 Entidades públicas y privadas que Implementan Instrumentos Ambientales	4960.00	4960.00	100	100
 Reunión Multisectorial de la CAR JUNIN, realizado en la provincia de Chupaca en el mes de agosto.						
PRINCIPALES LOGROS ALCANZADOS (K)						
Se logró fortalecer a las entidades con la instalación de las CAMs y la gestión de sus Instrumentos Ambientales: Concepción, Chupaca, La Región Junín, MP Tarma, MD. Distrital de el Tambo, UNDACC, EPS Sierra Central, Perene y San Juan de Iscos.						
PRINCIPALES DIFICULTADES PRESENTADAS (L)						
Limitada asignacion presupuestal						

I. PRINCIPALES PROYECTOS EJECUTADOS CON EJECUCIÓN MULTIANUAL

(Sub Gerencia de Programación Multianual de Inversiones)

Sector Transporte

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	TRANSPORTE	2329618	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-103 TRAMO: EMP. PE-22 A PALCA - TAPO - ANTACUCHO - RICRAN - ABRA CAYAN - YAULI - PACAN - EMP. PE-3S A JAUJA - REGION JUNIN	21,157	Mutiprovincial	346,672,101.85	106,403,911.15	240,268,190.70	0.31	42.57
2	TRANSPORTE	2251269	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU - 108 TRAMO: PALIAN - VILCACOTO - ACOPALCA - ABRA HUAYTAPALLANA - PARIAHUANCA, PROVINCIA DE HUANCAYO, DEPARTAMENTO JUNIN.	12,719	Mutiprovincial	341,276,076.78	110,177,807.20	231,098,269.58	0.32	12.76
3	TRANSPORTE	2546074	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD VIAL DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL RUTA JU-110 (TRAMO: VISTA ALEGRE - EMPALME CON EL DEPARTAMENTO DE HUANCAVELICA), DISTRITO DE CHUPURO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,672	Mutiprovincial	298,855,728.65	10,100.00	298,845,628.65	0.00	0.00
4	TRANSPORTE	2300078	CREACION DEL PUENTE COMUNEROS ENTRE LA AV. DANIEL ALCIDES CARRION Y CA. MAX HONGLER EN LOS DISTRITOS DE HUANCAYO - HUAMANCACA CHICO, PROVINCIA DE HUANCAYO Y CHUPACA, REGION JUNIN.	328,235	Mutiprovincial	172,345,534.26	159,720,459.98	12,625,074.28	0.93	75.53

5	TRANSPORTE	2151786	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA CHUPURO - VISTA ALEGRE - CHICCHE - CHONGOS ALTO - HUASICANCHA, PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	5,510	Multidistrital	166,669,093.73	141,041,548.17	25,627,545.56	0.85	71.44
6	TRANSPORTE	2277818	CREACION DEL PUENTE CANTUTA, DISTRITO DE EL TAMBO, PILCOMAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - JUNIN	209,068	Multidistrital	133,340,769.54	97,340,264.70	36,000,504.84	0.73	59.64
7	TRANSPORTE	2342631	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA DEPARTAMENTAL JU-100 JUNIN - SASICUCHO - INGAYA - ONDORES- SAN PEDRO DE PARI - L.D. PASCO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	14,659	Distrital	118,541,094.88	28,820,217.55	89,720,877.33	0.24	7.78
8	TRANSPORTE	2277906	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PUENTE NORUEGA, DISTRITO DE PERENE - SANTA ANA, PROVINCIA DE CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	89,282	Distrital	80,737,934.86	33,007,933.75	47,730,001.11	0.41	37.16
9	TRANSPORTE	2111279	MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA A NIVEL DE ASFALTADO TRAMO: ACOBAMBA - PALCAMAYO - SAN PEDRO DE CAJAS - CONDORIN - PROVINCIA DE TARMA - JUNIN	23,000	Provincial	76,249,089.86	70,115,583.72	6,133,506.14	0.92	80.05

Sector Salud

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	SALUD	2164051	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL EL CARMEN HUANCAYO, REGION JUNIN	1,311,584	Distrital	316,507,186.52	225,570,250.85	90,936,935.67	0.71	62.30
2	SALUD	2409967	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DOMINGO OLAVEGOYA, DISTRITO DE JAUJA - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	225,887	Distrital	293,313,278.11	2,010,300.00	291,302,978.11	0.01	0.00
3	SALUD	2159229	MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD RESOLUTIVA DEL HOSPITAL DANIEL ALCIDES CARRION HUANCAYO	1,311,584	Distrital	206,866,922.79	195,791,193.15	11,075,729.64	0.95	99.71
4	SALUD	2279396	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO PICHANAKI, DISTRITO PICHANAKI, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	32,477	Distrital	196,607,527.79	158,707,743.07	37,899,784.72	0.81	51.47
5	SALUD	2346287	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD LA LIBERTAD CENTRO POBLADO DE HUANCAYO - DISTRITO DE HUANCAYO - PROVINCIA DE HUANCAYO - REGION JUNIN	87,891	Distrital	149,957,566.92	120,707,314.82	29,250,252.10	0.80	47.94
6	SALUD	2337618	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD PEDRO SANCHEZ MEZA DISTRITO DE CHUPACA, PROVINCIA DE CHUPACA, DEPARTAMENTO DE JUNIN	63,429	Distrital	145,931,643.43	65,770,885.15	80,160,758.28	0.45	38.05
7	SALUD	2515925	CREACION DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN DE OFTALMOLOGIA, DISTRITO DE HUAYUCACHI - PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	7,560	Distrital	123,325,444.37	721,000.00	122,604,444.37	0.01	0.00

8	SALUD	2281442	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO MANUEL HIGA ARAKAKI, DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE SATIPO, DEPARTAMENTO DE JUNIN	234,135	Distrital	120,869,914.13	45,307,105.21	75,562,808.92	0.37	22.38
9	SALUD	2564829	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL HOSPITAL DE APOYO JUNIN DISTRITO DE SATIPO, PROVINCIA DE JUNIN - DEPARTAMENTO DE JUNIN	252,969	Provincial	119,285,657.51	-	119,285,657.51	0.00	0.00
10	SALUD	2281445	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, JUNIN	52,551	Distrital	111,003,967.07	106,038,390.84	4,965,576.23	0.96	60.01
11	SALUD	2045824	CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DE HOSPITAL II-1 LA MERCED - CHANCHAMAYO	789,478	Distrital	101,204,725.35	100,538,901.03	665,824.32	0.99	100.00
12	SALUD	2336443	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, DISTRITO DE SANTO DOMINGO DE ACOBAMBA, PROVINCIA DE HUANCAYO, JUNIN	11,638	Distrital	58,979,119.26	937,812.17	58,041,307.09	0.02	0.00
13	SALUD	2324642	MEJORAMIENTO, SERVICIO DE SALUD EN EL CENTRO DE SALUD LA OROYA I-4, DISTRITO DE LA OROYA - PROVINCIA DE YAULI - DEPARTAMENTO DE JUNIN	30,540	Distrital	44,260,313.12	43,235,742.77	1,024,570.35	0.98	96.65
14	SALUD	2359534	MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE PRIMER NIVEL DE ATENCION 1-3 DE LA CC. NN. PUERTO OCOPA, CENTRO POBLADO DE PUERTO OCOPA DEL DISTRITO DE RIO TAMBO, PROVINCIA DE SATIPO - REGION JUNIN	100,781	Distrital	38,823,515.23	16,178,803.24	22,644,711.99	0.42	7.99

Sector Educación

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	EDUCACION	2494144	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL INTERCULTURAL DE LA SELVA CENTRAL JUAN SANTOS ATAHUALPA - DISTRITO DE PICHANAQUI - PROVINCIA DE CHANCHAMAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,656	Distrital	199,794,568.34	67,604,028.29	132,190,540.05	0.34	18.05
2	EDUCACION	2499912	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO REGIONAL DEL CENTRO, DISTRITO DE EL TAMBO - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,344	Distrital	157,266,653.07	2,928,100.00	154,338,553.07	0.02	0.00
3	EDUCACION	2499920	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL SECUNDARIA DE LA I.E. POLITECNICO TUPAC AMARU, DISTRITO DE CHILCA - PROVINCIA DE HUANCAYO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,030	Distrital	142,546,881.09	2,489,500.00	140,057,381.09	0.02	0.00
4	EDUCACION	2493150	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL COLEGIO DE ALTO RENDIMIENTO (COAR - JUNIN), DISTRITO DE AHUAC - PROVINCIA DE CHUPACA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	300	Distrital	128,890,005.95	253,511.93	128,636,494.02	0.00	0.00
5	EDUCACION	2193303	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA EMBLEMATICA SANTA ISABEL, DISTRITO HUANCAYO, PROVINCIA HUANCAYO - DEPARTAMENTO JUNIN	72,631	Distrital	108,221,165.04	108,221,165.04	-	1.00	100.00
6	EDUCACION	2200807	MEJORAMIENTO DE LA I.E. MARISCAL CASTILLA, DISTRITO DE EL TAMBO - HUANCAYO - JUNIN	28,480	Distrital	104,247,487.07	79,765,715.81	24,481,771.26	0.77	75.03

7	EDUCACION	2430718	MEJORAMIENTO DE LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LA IE SAN RAMON DE NIVELES INICIAL, PRIMARIA, SECUNDARIA Y BASICA ALTERNATIVA - TARMA - TARMA - JUNIN - TARMA DEL DISTRITO DE TARMA - PROVINCIA DE TARMA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,764	Provincial	100,326,801.13	1,488,313.80	98,838,487.33	0.01	0.00
8	EDUCACION	2215545	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA I.E.I N 30637 ANDRES AVELINO CACERES DORREGARAY EN LA CIUDAD DE PANGOA, DISTRITO DE PANGOA - SATIPO - JUNIN	13,397	Distrital	48,629,547.85	836,300.00	47,793,247.85	0.02	0.00
9	EDUCACION	2572984	MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y PRODUCTIVAS MEDIANTE LA ALFABETIZACION INTERCULTURAL Y BILINGUE APRENDIENDO Y PRODUCIENDO PARA JOVENES Y ADULTOS ILETRADOS 9 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	26,539	Multiprovincial	30,404,326.00	7,456,830.91	22,947,495.09	0.25	0.00
10	EDUCACION	2330254	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL NIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIO EN LA INSTITUCION EDUCATIVA SAN FERNANDO EN EL CENTRO POBLADO SAN FERNANDO DE KIVINAKI, DISTRITO DE PERENE, PROVINCIA CHANCHAMAYO, REGION JUNIN	4,714	Distrital	30,294,489.53	7,331,526.12	22,962,963.41	0.24	12.34
11	EDUCACION	2247344	MEJORAMIENTO, AMPLIACION DE LOS SERVICIOS EDUCATIVOS DE LA INSTITUCION EDUCATIVA INTEGRADO INDUSTRIAL PERENE EN LA LOCALIDAD DE VILLA PERENE, DISTRITO DE PERENE - CHANCHAMAYO - JUNIN	1,407	Distrital	30,052,427.54	25,088,057.88	4,964,369.66	0.83	61.54
12	EDUCACION	2561597	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DEL INSTITUTO DE EDUCACION SUPERIOR TECNOLOGICO PUBLICO MARCO, EN EL DISTRITO DE MARCO - PROVINCIA DE JAUJA - DEPARTAMENTO DE JUNIN	363	Distrital	28,464,651.09	-	28,464,651.09	0.00	0.00

Sector Agropecuaria

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	AGROPECUARIA	2608236	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO EN PRODUCTORES AGROPECUARIOS, AGROINDUSTRIALES, ARTESANOS, AGROECOLOGICOS, TURISMO Y CULTURA EN LAS 9 PROVINCIAS REGION JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	300	Multiprovincial	7,591,350.00	78,000.00	7,513,350.00	0.01	0.00
2	AGROPECUARIA	2557595	MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO AL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS PRODUCTORES DE FLORES DE CORTE EN LAS PROVINCIAS DE HUANCAYO, TARMA Y CONCEPCION DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	1,800	Multiprovincial	5,970,786.89	24,000.00	5,946,786.89	0.00	0.00

Sector Energía

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	ENERGÍA	2094610	2094610: CONSTRUCCION DEL PEQUEÑO SISTEMA ELECTRICO DE BETANIA - ELECTRIFICACION DE 08 LOCALIDADES DE LA CUENCA DEL RIO TAMBO	3,164	Distrital	25,575,145.28	24,546,970.16	1,028,175.12	0.96	98.87

Sector Ambiente

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	AMBIENTE	2618939	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN 6 UNIDADES PRODUCTORAS 6 DISTRITOS DE 6 PROVINCIAS DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,027	Multiprovincial	22,413,455.96	45,000.00	22,368,455.96	0.00	0.00
2	AMBIENTE	2612969	RECUPERACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS EN GOBIERNO REGIONAL JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	2,023	Distrital	14,912,001.61	45,000.00	14,867,001.61	0.00	0.00

Sector Saneamiento

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	SANEAMIENTO	2017383	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SATIPO	22,544	Provincial	119,328,834.40	85,356,009.78	33,972,824.62	0.72	58.87
2	SANEAMIENTO	2046317	MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE LA OROYA	27,816	Provincial	85,863,810.71	34,533,083.04	51,330,727.67	0.40	39.86
3	SANEAMIENTO	2017371	AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA CIUDAD DE SAN RAMON	15,369	Provincial	47,732,439.43	34,279,899.17	13,452,540.26	0.72	78.04
4	SANEAMIENTO	2497157	AMPLIACION DE LA RED DE DISTRIBUCION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE TRAMO: PTAP - HOSPITAL SAN MARTIN DE PANGOA Y ALCANTARILLADO SANITARIO TRAMO: HOSPITAL - PUTCAMAYO EN EL CENTRO POBLADO DE VILLA MARIA DEL DISTRITO DE PANGOA - PROVINCIA DE SATIPO - DEPARTAMENTO DE JUNIN	215	Distrital	10,750,412.42	9,779,271.13	971,141.29	0.91	71.38

Sector Planeamiento, Gestión y Reserva de Contingencia

C	Sector de intervención (A)	N° CUI (B)	Nombre del Proyecto (C)	N° Beneficiarios (D)	Ámbito Territorial de intervención del proyecto (E)	Costo Total del Proyecto (F)	Ejecución acumulada a nivel devengado al 2023 (*) (G)	Saldo pendiente por ejecutar al 2023 (H)	% acumulado ejecución financiera al 2023 (I)	% acumulado ejecución física al 2023 (J)
						S/	S/	S/		
1	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2573220	2573220: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS OPERATIVOS O MISIONALES INSTITUCIONALES EN GORE JUNIN DISTRITO DE HUANCAYO DE LA PROVINCIA DE HUANCAYO DEL DEPARTAMENTO DE JUNIN	7	Departamental	115,348,108.36	49,566,958.25	65,781,150.11	0.43	0.00
2	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2078129	2078129: CONSTRUCCION Y EQUIPAMIENTO DEL INSTITUTO DEL CAFE EN EL AMBITO DE LAS PROVINCIAS DE CHANCHAMAYO Y SATIPO DE LA REGION JUNIN	38,404	Provincial	38,804,877.44	34,145,883.72	4,658,993.72	0.88	82.20
3	PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE CONTINGENCIA	2264599	2264599: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE APOYO AGRARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS CADENAS PRODUCTIVAS DE CAFE, CACAO, CITRICOS, QUINUA, CUYES Y VACUNOS DE LECHE EN EL DEPARTAMENTO DE JUNIN	6,900	Departamental	20,347,222.14	7,727,597.87	12,619,624.27	0.38	28.85

Comentario:

La ejecución de presupuesto en gastos de capital (Inversiones) durante el año fiscal 2023, se ejecutó de acuerdo a los criterios de priorización aprobado por el gobierno regional de Junín, así mismo para el año 2023 tuvo un PIM de S/. 819,856,278.00, de los cuales fue distribuido y ejecutado de la siguiente manera:

- Sector Transporte: Total de PIM 2023 de S/. 323,392,907.00, ejecutando en un 99.9%.
- Sector Salud: Total de PIM 2023 de S/. 255,002,054.00, ejecutando en un 99.5%.
- Sector Educación: Total de PIM 2023 de S/. 158,069,293.00, ejecutando en un 99.3%.
- Sector Saneamiento: Total de PIM 2023 de S/. 17,482,940.00, ejecutando en un 99.8%.
- Sector Agropecuaria: Total de PIM 2023 de S/. 13,428,279.00, ejecutando en un 99.5%.

Análisis Vertical y Análisis Horizontal del Estado de Situación Financiera EF-1

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre de 2023 y Diciembre 2022

(EN SOLES)

ACTIVO		2023	%	2022	%	VARIACION	%
ACTIVO CORRIENTE							
Efectivo y Equivalente al Efectivo	Nota 3	90,620,728.55	1.62	152,601,993.73	3.17	-61,981,265.18	-40.62
Inversiones Intangibles	Nota 4		0.00		0.00	0.00	
Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 5	757,153.07	0.014	115,173.05	0.002	641,980.02	557.40
Otras Cuentas por Cobrar (Neto)	Nota 6	9,028,544.28	0.16	14,436,106.19	0.30	-5,407,561.91	-37.46
Inventarios (Neto)	Nota 7	177,850,920.32	3.18	178,023,935.29	3.69	-173,014.97	-0.10
Servicios y Otros Pagados por Anticipados	Nota 8	3,651,628.36	0.07	11,350,729.18	0.24	-7,699,100.82	-67.83
Otras Cuentas del Activo	Nota 9	197,249,752.08	3.53	87,601,625.93	1.82	109,648,126.15	125.17
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		479,158,726.66	8.57	444,129,563.37	9.21	35,029,163.29	7.89
ACTIVO NO CORRIENTE							
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	Nota 10		0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Ctas por Cobrar a largo Plazo	Nota 11	346.12	0.00	61,422.27	0.00	-61,076.15	0.00
Inversiones(neto)	Nota 12		0.00		0.00	0.00	0.00
Propiedades de Inversiones	Nota 13		0.00		0.00	0.00	100.00
Propiedades,Planta y Equipo (Neto)	Nota 14	4,553,239,785.20	81.48	3,904,269,631.32	80.99	648,970,153.88	16.62
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 15	555,592,014.86	9.94	472,359,660.74	9.80	83,232,354.12	17.62
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		5,108,832,146.18	91.43	4,376,690,714.33	90.79	732,141,431.85	16.73
TOTAL ACTIVO		5,587,990,872.84	100.00	4,820,820,277.70	100.00	767,170,595.14	15.91
PASIVO							
PASIVO CORRIENTE							
SobregirosBancarios	Nota 16		0.00		0.00	0.00	0.00
Cuentas por pagar a Proveedores	Nota 17	212,803,670.48	3.81	91,639,214.50	1.90	121,164,455.98	132.22
Impuestos Contribuciones	Nota 18	16,967,666.56	0.30	16,097,936.31	0.33	869,730.25	5.40
Remuneraciones y beneficios Sociales	Nota 19	26,023,080.61	0.47	25,437,258.31	0.53	585,822.30	2.30
Obligaciones Previsionales	Nota 20	123,639,807.26	2.21	122,530,225.53	2.54	1,109,581.73	0.91
Operaciones de Credito	Nota 21		0.00		0.00	0.00	0.00
Parte Cuenta Deudas a largo Plazo	Nota 22	3,129,209.42	0.06	54,961,512.27	1.14	-51,832,302.85	0.00
Otras Cuentas del Pasivo	Nota 23	26,121,054.72	0.47	23,965,037.43	1.27	2,156,017.29	0.00
Ingresos Diferidos	Nota 24	418,409.62	0.01	84,280.00	0.00	334,129.62	0.00
TOTAL PASIVO CORRIENTE		409,102,898.67	7.32	334,715,464.35	7.72	74,387,434.32	22.22
PASIVO NO CORRIENTE							
Deudas a largo Plazo	Nota 25	27,343,582.86	0.49	20,832,921.36	0.43	6,510,661.50	31.25
Cuentas Por pagar a Proveedores	Nota 26		0.00		0.00	0.00	0.00
Beneficios Sociales y Oblig. Prev.	Nota 27	463,889,382.67	8.30	263,036,907.50	11.84	200,852,475.17	0.00
Obligaciones Previsionales	Nota 28	688,442,059.98	12.32	768,588,247.44	34.60	-80,146,187.46	100.00
Provisiones	Nota 29		0.00		0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto)	Nota 30	843,488,020.96	15.09	834,418,545.01	17.31	9,069,475.95	1.09
Ingresos Diferidos	Nota 31		0.00		0.00	0.00	0.00
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		2,023,163,046.47	36.21	1,886,876,621.31	64.18	136,286,425.16	7.22
TOTAL PASIVO		2,432,265,945.14	43.53	2,221,592,085.66	71.90	210,673,859.48	9.48
PATRIMONIO							
Hacienda Nacional	Nota 32	6,246,671,893.69	111.79	5,605,652,295.45	116.28	641,019,598.24	11.44
Hacienda Nacional Adicional	Nota 33		0.00			0.00	0.00
Resultados no realizables	Nota 34	331,031,430.18	5.92	331,145,950.18	11.84	-114,520.00	-0.03
Resultdos Acumulados	Nota 36	-3,421,978,396.17	-61.24	-3,337,570,053.59	34.60	-84,408,342.58	2.53
TOTAL PATRIMONIO		3,155,724,927.70	56.47	2,599,228,192.04	162.72	556,496,735.66	21.41
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		5,587,990,872.84	100.00	4,820,820,277.70		767,170,595.14	


CPC. IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS
 SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

Análisis Vertical y Análisis Horizontal del Estado de Gestión EF-2

ESTADO DE GESTION

Al 31 de Diciembre de 2023 y Diciembre 2022
(EN SOLES)

	2023	%	2022	%	VARIACION	%
INGRESOS						
Ingresos Tributarios Netos		0.00		0.00		0.00
Ingresos No Tributarios	23,115,510.90	0.58	22,238,693.80	0.73	876,817.10	3.94
Aportes por regulacion					0.00	
Traspasos y Remesas Recibidas	3,015,965,047.04	75.31	2,508,260,141.56	82.58	507,704,905.48	20.24
Donaciones y Transferencias Recibidas	917,192,011.14	22.90	460,200,818.96	15.15	456,991,192.18	99.30
Ingresos Financieros	4,104,983.10	0.10	1,916,078.89	0.06	2,188,904.21	114.24
Otros Ingresos	44,432,056.40	1.11	44,902,886.30	1.48	-470,829.90	-1.05
TOTAL INGRESOS	4,004,809,608.58	100.00	3,037,518,619.51	100.00	967,290,989.07	31.84
COSTOS Y GASTOS						
Costo de Ventas	-1,799,404.02	-0.04	-2,716,462.94	-0.09	917,058.92	0.00
Gastos en Bienes y Servicios	-331,210,403.33	-8.27	-413,021,234.34	-13.60	81,810,831.01	-19.81
Gastos de Personal	-1,876,468,322.96	-46.86	-1,696,144,352.97	-55.84	-180,323,969.99	10.63
Gastos por Pens. Prest- y Asistencia Social	-51,467,043.31	-1.29	-95,095,581.42	-3.13	43,628,538.11	-45.88
Transferencias Subsidios y subvenciones	-1,104,459.77	-0.03	-1,577,937.80	-0.05	473,478.03	-30.01
Donaciones y Transferencias Otorgadas	-751,474,888.23	-18.76	-186,562,958.90	-6.14	-564,911,929.33	302.80
Traspasos y Remesas Otorgadas	-44,224,644.68	-1.10	-56,260,572.08	-1.85	12,035,927.40	-21.39
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio	-258,150,014.01	-6.45	-240,939,957.40	-7.93	-17,210,056.61	7.14
Gastos Financieros	-6,304,759.46	-0.16	-14,728,684.88	-0.48	8,423,925.42	-57.19
Otros Gastos	-15,549,218.45	-0.39	-18,585,847.21	-0.61	3,036,628.76	-16.34
TOTAL COSTO Y GASTOS	-3,337,753,158.22	-83.34	-2,725,633,589.94	-89.73	-612,119,568.28	22.46
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT(DIFICIT)	667,056,450.36	16.66	311,885,029.57	10.27	1,579,410,557.35	506.41


 CPC. IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS
 SUBDIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
 GOBIERNO REGIONAL JUNIN



Gobierno Regional Junín

COMENTARIOS DE LAS RAZONES DE ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL DEL EJERCICIO 2023

El Gobierno Regional de Junín, fue creada mediante Ley Nº 2786 Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, teniendo como objetivo fomentar el Desarrollo Regional Integral, promoviendo el empleo y la Inversión Pública y Privada garantizar el ejercicio pleno de los derechos y la igualdad de oportunidades de sus habitantes de acuerdo con los planes y programas Nacionales, regionales y locales de desarrollo, asimismo tiene como misión organizar y conducir la Gestión Publica Regional de acuerdo a sus competencias exclusivas compartidas y delegadas en el marco de las políticas nacionales y sectoriales para contribuir el desarrollo integral , para realizar su planeamiento a corto, mediano y largo plazo para ello existe un conjunto de principios que permite analizar e interpretar economía y financiamiento en el comportamiento de la entidad en el pasado y apreciar su situación financiera actual.

Análisis Vertical y horizontal del Estado de Situación Financiera y de Gestión

Análisis Vertical

Este tipo de análisis consiste en determinar la participación de cada una de las cuentas de los Estados Financieros con referencia sobre el total del Activos o Total Pasivo y Patrimonio.

Del análisis vertical del Estado de la Situación Financiera notamos lo siguiente:

- a) El rubro de Efectivo y Equivalente al Efectivo de año 2023 representa el -1.62% en comparación del año 2022 por haber disminuido la recaudación de recursos Directamente Recaudados y transferencia recibidas de Recursos determinados, Recursos Oficiales de Crédito.
- b) El rubro de otras cuentas por cobrar del año 2023 representa 0.16% en comparación del año 2022 por el cálculo de compensación de horas de trabajadas por el Estado de Emergencia sanitaria, no devueltas por el personal
- c) El rubro de Inventarios del año 2023 representa una disminución del 3.18% en comparación del año 2022 por la disminución de las transferencias de bienes corrientes al mes de Diciembre del Ministerio de Salud y Ministerio de Educación





Gobierno Regional Junín

- d) El rubro de Otras Cuentas del Activo del año 2023 representa una disminución del 3.53% en comparación del año 2022 por haber reducido los importes de los devengados de Recursos Ordinarios.
- e) El rubro de Propiedad Planta y Equipo (Neto) del año 2023 representa 81.48% en comparación del año 2022 por el Ejecución del presupuesto en construcciones en curso, compra de equipos médicos en las Diferentes Unidades Ejecutoras de Salud y Educación
- f) En el análisis del estado de Gestión se concluye que se realizó mayor gastos en el año 2023 de 83.34% en comparación del año 2022 de 89.73%

Análisis Horizontales

En este tipo de análisis lo que se busca es analizar la variación absoluta o relativa que ha sufrido las distintas partidas de los Estados Financieros en un periodo respecto a otro.

En el análisis horizontal nos damos cuenta que con respecto a los pasivos corriente se ha disminuido en el rubro de Obligaciones Previsionales del año 2023 de 12.32% en comparación del año 2022 de 34.60%

En el rubro de Deudas a Largo Plazo del año 2023 se ha disminuido en 0.49% en comparación del año 2022 en 0.43%

En el análisis del Estado de Gestión Horizontal hubo un mayor Gastos en Bienes y Servicios en 8.27%, en Gastos de Personal de un 46.86%, en Estimaciones y Provisiones del Ejercicio de 6.45% de las diferentes Unidades Ejecutoras, efectuándose mayores gastos en comparación del año anterior de 13.60% en Gastos de Bienes y Servicios, 55.84% en Gastos de Personal, 7.93% en Estimaciones y Provisiones del Ejercicios


CPC. IRIS VIRGINIA POVIS RAMOS
SUB DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA
GOBIERNO REGIONAL JUNÍN

III. ANÁLISIS DE LA PROGRAMACIÓN Y EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

Análisis de ingresos, gasto corriente e inversiones a nivel de Pliego: 450 Gobierno del Departamento de Junín, por partidas genéricas, por fuente de financiamiento, por unidades ejecutoras, y por funciones comentando aspectos relevantes de la ejecución respecto a la programación y niveles porcentuales de ejecución; asimismo, debe indicarse las limitaciones que se confrontaron.

Anexo N° 04 – A: Presupuesto público del pliego por genérica de gasto por toda fuente de financiamiento

A DATOS DE LA ENTIDAD

Nombres de Pliego

Gobierno Regional del Departamento de Junín

Departamento -Provincia-

Junín - Huancayo - Huancayo

Distrito

Fecha de corte

Del

1/01/2023 Al

31/12/2023

GENÉRICA DEL GASTO	PIA (1)	PIM (2)	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	GIRADO (5)	AVANCE % COMPROMISO (6)=(3)/(2)	AVANCE % DEVENGADO (7)=(4)/(2)	AVANCE % GIRADO (8)=(5)/(2)
Total general	2,430,677,696.00	3,153,113,436.00	3,119,161,435.47	3,109,446,376.97	3,109,016,873.32	98%	95%	95%
5. GASTO CORRIENTE								
1.PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES	1,295,423,304.00	1,498,269,477.00	1,497,167,665.91	1,496,756,542.43	1,496,650,562.39	100%	100%	100%
2.PENSIONES Y OTRAS PRESTACIONES SOCIALES	123,564,066.00	129,062,981.00	128,793,868.90	128,705,623.67	128,688,216.34	100%	100%	100%
3.BIENES Y SERVICIOS	388,247,868.00	520,951,161.00	496,341,370.73	494,069,851.52	493,906,290.93	95%	95%	95%
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	248,639.00	13,685,728.00	13,685,728.00	13,685,728.00	13,685,728.00	100%	100%	100%
5.OTROS GASTOS	1,323,026.00	115,627,076.00	115,441,834.28	114,675,894.89	114,568,621.25	100%	99%	99%
Total general	1,808,806,903.00	2,277,596,423.00	2,251,430,467.82	2,247,893,640.51	2,247,499,418.91	99%	99%	99%
6. GASTO DE CAPITAL								
4.DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0%	0%	0%
6.ADQUISICION DE ACTIVOS NO FINANCIEROS	600,832,801.00	818,558,487.00	814,866,483.65	809,254,175.61	809,218,893.56	100%	99%	99%
Total general	600,832,801.00	818,558,487.00	814,866,483.65	809,254,175.61	809,218,893.56	100%	99%	99%
7. SERVICIO DE LA DEUDA								
8.SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	21,037,992.00	56,958,526.00	52,864,484.00	52,298,560.85	52,298,560.85	93%	92%	92%
Total general	21,037,992.00	56,958,526.00	52,864,484.00	52,298,560.85	52,298,560.85	93%	92%	92%

Fuente: SG Presupuesto y tributación, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRJ/SG Presupuesto y tributación y Equipo Técnico.

Comentario:

Para el año 2023 se inició con un PIA de S/2,430,677,696.00, luego se registró PIM de S/3,153,113,436.00 de las cuales se tuvo avance del compromiso del 98%, avance del devengado del 95% y el avance de girado llegó al 95%, donde se evidencia alta ejecución presupuestal, que llegaron a registrar casi el 100%.

Sobre la Genérica Gasto Corriente se tuvo un avance presupuestal 99% y la sub genérica bienes y servicios tuvo un avance presupuestal del 95% y las sub genéricas personal y obligaciones sociales, donaciones y transferencias y otros gastos tuvieron un avance del 100%

La genérica Gastos de Capital finalizó con un avance presupuestal del 99% y Servicios de la deuda; con el 92% del presupuesto asignado.

Anexo N° 04 – B: Ingresos y gastos por fuente de financiamiento

A DATOS DE LA ENTIDAD

Nombres de Pliego

Gobierno Regional del Departamento de Junín

Departamento -Provincia-

Junín - Huancayo - Huancayo

Distrito

Fecha de corte

Del

1/01/2023 Al

31/12/2023

FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESOS			GASTOS		
	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE APERTURA (1)	PRESUPUESTO INSTITUCIONAL MODIFICADO (2)	EJECUCION
1. RECURSOS ORDINARIOS	0.00	0.00		1,946,710,810.00	2,541,893,256.00	2,516,646,882.00
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS	15,907,452.00	24,899,787.00	21,128,145.00	15,907,452.00	24,072,217.00	21,128,145.00
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO	0.00	3,894,857.00	3,341,232.00	0.00	3,894,857.00	3,341,232.00
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS	0.00	87,728,557.00	84,962,426.00	0.00	87,728,557.00	84,962,426.00
5. RECURSOS DETERMINADOS	472,286,661.00	527,723,670.00	501,619,251.00	472,286,661.00	527,723,670.00	501,619,251.00
Total	488,194,113.00	644,246,871.00	611,051,054.00	2,434,904,923.00	3,185,312,557.00	3,127,697,936.00

Fuente: SG Presupuesto y tributación, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRJ/SG Presupuesto y tributación y Equipo Técnico.

Comentario:

Sobre los ingresos se tuvo una ejecución total del S/611,051,054.00, además sobre las fuentes de financiamiento la 5. Recursos Determinados tuvo mayores ingresos en comparación de las demás fuentes de financiamiento.

Sobre los gastos se tuvo una ejecución presupuestal de S/3,127,697,936.00, siendo la fuente de financiamiento Recursos ordinarios que tuvo un mayor gasto, en segundo lugar, fue la fuente de financiamiento Recursos Determinados.

La ejecución total del gasto es de S/3,127,697,936, mayor a la ejecución de los ingresos, S/611,051,054.00.

El PIM de los ingresos se calculó ah S/644,246,871.00, mientras que el PIM de los gastos fue de S/3,185,312,557.00

ANEXO N° 04 – C: Presupuesto público del pliego por unidad ejecutora por toda fuente de financiamiento

A DATOS DE LA ENTIDAD

Nombres de Pliego

Gobierno Regional del Departamento de Junín

Departamento -Provincia-

Junín - Huancayo - Huancayo

Distrito

Fecha de corte

Del

1/01/2023 Al

31/12/2023

GENERICA DE GASTO	PIA (1)	PIM(1)	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	GIRADO (5)	AVANCE % COMPROMISO (6)=(3)/(2)	AVANCE % DEVENGADO (7)=(4)/(2)	AVANCE % GIRADO (8) = (5)/(2)
001. REGION JUNIN-SEDE CENTRAL	655524349	925635357	936533757	933192417.6	933146553	1.000000	1.000000	1.000000
002. REGION JUNIN - PRODUCCION	2028410	3049409	3036482.02	3036482.02	3033261.07	0.995760824	0.995760824	0.994704571
100. REGION JUNIN-AGRICULTURA	12950134	27628175	27415700.13	27416564.73	27406564.73	0.992309486	0.99234078	0.991978831
200. REGION JUNIN-TRANSPORTES	37793146	48678082	42754785.92	41759121.15	41757961.15	0.878316979	0.857862911	0.857839081
300. REGION JUNIN-EDUCACION	64819353	73719087	73094490.47	73084304.29	73084304.29	0.991527343	0.991389168	0.991389168
301. REGION JUNIN - EDUCACION TARMA	86184181	105999854	105984442.4	105984219.9	105975141.5	0.999854607	0.999852509	0.999766863
302. REGION JUNIN - EDUCACION SATIPO	109804383	134332677	134278048	133965969.3	133965048.8	0.999593331	0.997270153	0.9972633
303. GOB. REG. DE JUNIN- EDUCACION CHANCHAMAYO	79853531	103637589	103658904.8	103658904.7	103626210.6	1.000000	1.000000	0.99989021
304. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION HUANCAYO	347513583	433397482	433074509.6	432607781.9	432566288.9	0.999254789	0.998177885	0.998082146
305. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CONCEPCION	56156349	70738935	70567781.12	70566835.85	70486888.33	0.997580485	0.997567123	0.996436946
306. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION CHUPACA	53885667	69297719	69214754.06	68958789.29	68958789.29	0.998802775	0.995109078	0.995109078
307. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION JAUJA	94125837	118305350	118270408.1	118159712.6	118159090.6	0.999704646	0.99876897	0.998763713
308. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION YAULI- LA OROYA	41350110	51197466	51151016.39	51151016.38	51150535.17	0.999092736	0.999092736	0.999083337
309. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PROVINCIA DE JUNIN	29478222	35290965	35235702.55	35235694.12	35235105.12	0.998434091	0.998433852	0.998417162
310. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PICHANAKI	54531940	66728931	66692443.84	66692443.84	66691175.54	0.999453203	0.999453203	0.999434197
311. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION PANGOA	53017956	66884182	66819649.47	66819649.47	66819649.47	0.99903516	0.99903516	0.99903516
312. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO TAMBO	34141100	42768772	42744705.53	42724747.66	42724747.66	0.999437289	0.998970643	0.998970643
313. GOB. REG. DE JUNIN - EDUCACION RIO ENE MANTARO	0	256673	252801.3	252801.3	252801.3	0.984915827	0.984915827	0.984915827
400. REGION JUNIN- DIRECCION REGIONAL DE SALUD JUNIN	49418294	52823126	53778004.48	53773803.68	53772933.68	1.000000	1.000000	1.000000
401. REGION JUNIN-SALUD DANIEL ALCIDES CARRION	76123644	106068451	108576843	108576843	108557673.5	1.000000	1.000000	1.000000
402. REGION JUNIN-SALUD EL CARMEN	51294060	73376307	73190347.49	73190347.49	73190347.49	0.997465674	0.997465674	0.997465674
403. REGION JUNIN-SALUD JAUJA	58468642	72533770	72299383.09	72093868.99	72090061.63	0.996768582	0.993935225	0.993882734
404. REGION JUNIN-SALUD TARMA	50247605	64504047	64169966.92	64169966.92	64169966.92	0.994820789	0.994820789	0.994820789
405. REGION JUNIN-SALUD CHANCHAMAYO	29996949	40366099	40242917.62	40208598.13	40207172.57	0.996948395	0.996098189	0.996062874
406. REGION JUNIN-SALUD SATIPO	59976922	73991554	74788091.29	74738101.29	74569983.9	1.000000	1.000000	1.000000
407. REGION JUNIN- SALUD JUNIN	20937731	22689133	22610560.29	22610560.29	22609794.39	0.996536989	0.996536989	0.996503233
408. REGION JUNIN - RED DE SALUD DEL VALLE DEL MANTARO	83471768	109637623	108608593.9	108606047	108595883	0.99061427	0.99059104	0.990498334
409. GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD PICHANAKI	22198733	30234466	30849276.46	30849276.46	30849276.46	1.000000	1.000000	1.000000
410. GOB. REG. DE JUNIN - RED DE SALUD SAN MARTIN DE PANGOA	21949406	27031234	26609229.11	26595066.21	26593368.91	0.984388249	0.983864303	0.983801513
412. GOB. REG. DE JUNIN - SALUD CHUPACA	19644084	24263280	23990605.62	23981382.57	23947898.97	0.98876185	0.988381726	0.987001715
413. GOB. REG. DE JUNIN - HOSPITAL REGIONAL DOCENTE DE MEDICINA TROPICAL DOCTOR JULIO CESAR DEMARINI CARO	28933426	40699855	41095070.16	41041057.69	41041057.69	1.000000	1.000000	1.000000
414. GOB. REG. DE JUNIN - INSTITUTO REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLÁSICAS DEL CENTRO - IREN CENTRO	49085408	69546907	66776381.22	66772537.28	66727537.28	0.960163206	0.960107935	0.95946089
Total general	2434904923	3185312557	3188365653	3182474913	3181963073	1.000000	0.999109147	0.99894846

Fuente: SG Presupuesto y tributación, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRJ/SG Presupuesto y tributación y Equipo Técnico.

Comentario:

El PIM calculado para el año 2023 fue de S/3,185,312,557, mientras que su girado fue de S/3,181,963,073, aproximándose al 99% de ejecución presupuestal, se llegó a comprometer el 100%

ANEXO N° 04 – D: Presupuesto público del pliego por función por toda fuente de financiamiento

A DATOS DE LA ENTIDAD

Nombres de Pliego

Gobierno Regional del Departamento de Junín

Departamento -Provincia-

Junín - Huancayo - Huancayo

Distrito

Fecha de corte

Del

1/01/2023 Al

31/12/2023

Fuente: SG Presupuesto y tributación, archivos de informes y reportes 2023.

Elaborado: GRJ/SG Presupuesto y tributación y Equipo Técnico.

GENERIC DE GASTO	PIA (1)	PIM(1)	COMPROMISO (3)	DEVENGADO (4)	GIRADO (5)	AVANCE % COMPROMISO (6)=(3)/(2)	AVANCE % DEVENGADO (7)=(4)/(2)	AVANCE % GIRADO (8) = (5)/(2)
00.FUNCION GENERICA	0	0	55058664.49	54776896.99	54714090.56			
03.PLANEAMIENTO, GESTION Y RESERVA DE CONTINGENCIA	30553780	89367112	70323014.76	69372284.62	69353096.48	0.786900384	0.776261905	0.776047194
04.DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL	0	100076	100075.66	100075.66	100075.66	0.999996603	0.999996603	0.999996603
05.ORDEN PUBLICO Y SEGURIDAD	25950109	7002130	6993312.42	6907872.42	6907872.42	0.998740729	0.986538728	0.986538728
06.JUSTICIA	0	0	0	0	0			
07.TRABAJO	1807553	2892727	2672629.4	2664277.76	2664141.95	0.923913456	0.92102634	0.920979391
08.COMERCIO	283948	1045186	1037430	986210	986164.17	0.992579311	0.94357368	0.943529831
09.TURISMO	264172	1076088	1067537.73	1053327.73	1053056.86	0.992054302	0.978849063	0.978597345
10.AGROPECUARIA	6568533	21415552	21220879.89	20717879.89	20707803.89	0.990909779	0.967422175	0.966951676
11.PESCA	1731271	2702359	2687714.53	2687714.53	2685319.53	0.994580857	0.994580857	0.993694594
12.ENERGIA	175486	3208294	2945347.7	2942097.7	2941997.7	0.918041707	0.917028707	0.916997538
13.MINERIA	618191	1552653	1333487.11	1333487.11	1332152.06	0.858844256	0.858844256	0.857984405
14.INDUSTRIA	121359	72516	72235.21	72235.21	71409.26	0.996127889	0.996127889	0.984737989
15.TRANSPORTE	169292853	359768962	349512245.2	348615184.2	348600017.1	0.971490824	0.968997387	0.968955229
16.COMUNICACIONES	251965	3393849	2798310.3	2797390.84	2797336.84	0.824524102	0.824253183	0.824237272
17.AMBIENTE	462472	3875000	3865231.18	3852751.18	3852095.04	0.997479014	0.994258369	0.994089043
18.SANEAMIENTO 19.VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO	329000	19953172	19683958.51	19241108.5	19241108.5	0.986507735	0.964313268	0.964313268
20.SALUD	574075	2873796	2724037.64	2724037.64	2723905.82	0.947888312	0.947888312	0.947842443
21.CULTURA Y DEPORTE	858906423	1048469766	1034581297	1033796622	1033574928	0.986753582	0.986005182	0.985793736
22.EDUCACION	86800	4314169	4268478.69	4268478.69	4268384.79	0.989409244	0.989409244	0.989387479
23.PROTECCION SOCIAL	1196155182	1428657719	1426622669	1424770366	1424609848	0.998575551	0.997279017	0.997166661
24.PREVISION SOCIAL	1716109	2729785	2665883.6	2665387.6	2665367.72	0.97659105	0.976409351	0.976402068
25.DEUDA PUBLICA	118017650	123883120	123832652.6	123830666	123814339.9	0.999592621	0.999576585	0.999444798
Total general	21037992	56958526	52298560.85	52298560.85	52298560.85	0.918186697	0.918186697	0.918186697
	2434904923	3185312557	3188365653	3182474913	3181963073	1.000000	0.999109147	0.99894846

Comentario:

Se registró un PIA de S/2,434,904,923, seguidamente un PIM de S/3,185,312,557 de la cual obtuvo un porcentaje de avance del devengado y girado del 99,91% y 99,89% respectivamente

El avance del compromiso presupuestal se registró a un total promedio de 100%, el sector educación llegó a 99,8% teniendo un PIM de S/1,428,657,719.00



REFERENCIA BIBLIOGRÁFICA

1. Plan de Desarrollo Regional Concertado Junín al 2050 (con metas al 2021 y 2030).
2. Plan Estratégico Institucional (PEI) - Ampliado al 2026 del Gobierno Regional Junín, aprobado con Resolución Ejecutiva Regional N° 227 – 2023 – GR – JUNÍN / GR
